



INFORME FINAL EVALUACIÓN DE PROYECTO

**"MEJORA DE LA CALIDAD DE
VIDA DE LA MICRO CUENCA DE
OCOBAMBA BAJA"**

**JUNIO
2013**



ÍNDICE GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN.....	4
--------------	---

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

I.1. TÍTULO.....	09
I.2.FINANCIADOR.....	09
I.3. TIPO DE EVALUACIÓN.....	09
I.4. PRESUPUESTO APROBADO.....	09
I.5. BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	09
I.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	09
I.7. POLITICA GLOBAL.....	10
I.8. FECHA DE INICIO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	11

II. MARCO METODOLÓGICO

II.1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACION.....	11
II.2. METODOLOGIA ADOPTADA.....	11
II.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....	12
II.4. COMPONENTES DE LA EVALUACION.....	13
II.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS.....	15
1. Entrevistas.....	15
2. Encuestas.....	15
3. Grupos focales.....	15
II.6. ANÁLISIS DE INFORMACIONES Y DATOS.....	15
II.7.-FORMULACIÓN DE LOS JUICIOS.....	16

III. CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN

III.1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION EVALUADA.....	17
III.2. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA.....	17
1. Altitud.....	18
2. Limites.....	18
3. Accesos.....	20
III.3. POBLACIÓN.....	20
III.4. CLIMATOLOGÍA.....	22
1. Clima.....	22
2. Humedad.....	22
3. Precipitaciones.....	22
4. Nubosidad.....	23
5. Vientos.....	23
6. Presión Atmosférica.....	23
7. Pisos ecológicos.....	23
III.5. HIDROLOGÍA.....	24

III.6. EDUCACIÓN.....	24
1. Analfabetismo.....	25
III.7. VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS.....	26
III.8. SALUD.....	26
III.9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS.....	27
1. Actividad Agrícola.....	29
2. Actividad Pecuaria.....	29
3. Minería.....	29
4. Recursos Arqueológicos Turísticos y Forestales.....	30
III.10 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLITICA.....	30
1. Asamblea Comunal.....	30
2. Teniente Gobernador.....	31
3. Agente Municipal.....	31
4. Comités Funcionales.....	31

IV. INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACION

IV.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE PROYECTO.....	34
1. Definición del problema.....	34
2. Definición de Componentes.....	34
3. Indicadores.....	34
4. Medios de verificación.....	34
5. Reformulaciones.....	34
IV.2. IMPACTO (Efectos).....	35
IV.3. PERTINENCIA (Problemas y necesidades).....	40
IV.4. EFICACIA (Objetivos).....	46
IV.5. EFICIENCIA (optimización).....	60
IV.6 VIABILIDAD (Continuidad)	65

ANEXOS

Anexo1: Marco de Análisis	87
Anexo2: Ficha de acopio de datos.....	91
Anexo3: Informe de auditoría CARITAS Abancay.....	102
Anexo4: Lista de Personas encuestas.....	103

RESUMEN EJECUTIVO

TÍTULO	Mejora de la calidad de vida de la Microcuenca de Ocobamba Baja
PRESUPUESTO APROBADO	704.816,61 €
FECHAS DE EJECUCIÓN	Fecha de inicio: 8 de octubre 2008 Fecha de finalización: 30 de septiembre 2011
FINANCIADOR	Gobierno de Navarra. Número de expediente 359/2008
UBICACIÓN	PERU / ANDAHUAYLAS / CHINCHERO / OCOBAMBA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Las comunidades beneficiarias son indígenas de procedencia Chanca (cultura preincaica). Las instalaciones salubres son escasas, y el volumen de productividad muy bajo. Estos factores repercuten respectivamente en los índices sanitarios y de acceso a los alimentos básicos. Las necesidades no se reducen al ámbito de instalaciones o medios técnicos. La población carece de conocimientos que (adaptados a las especificidades del medio en el que viven) ayudarían a mejorar los estándares higiénicos, nutritivos, y de rendimiento productivo. Por otra parte faltan instrumentos para organizarse civilmente y mejorar los actuales cauces de participación. El proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de las comunidades de la Microcuenca de Ocobamba mediante las siguientes líneas de actuación: 1. Instalación de letrinas familiares 2. Mejora de la producción agraria. 3. Mejora de las condiciones medioambientales. 4. Empoderamiento de la población (tanto a nivel de gestión técnica de procesos productivos, medioambientales, y de instalaciones sanitarias; como para que participen más activamente en organizaciones civiles y adquieran mayor protagonismo en los procesos futuros de desarrollo comunal). 5.- Gestión idónea del Proyecto: Está relacionada a la adecuada gestión que se cumplió durante la ejecución del proyecto.
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN	Objetivo General: Disminución del nivel de pobreza de las comunidades de: Huancayo bajo, Soccus, Piscobamba baja, Carhuayaco bajo, Esmeralda, Sarahuarcay, Umaca, Primero de mayo, Ocobamba, Manzanapata -en Challhuani-; Microcuenca de Ocobamba Baja Objetivo Específico: Ha mejorado la calidad de vida de las comunidades de la Microcuenca de Ocobamba Baja.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
	1. Definición del Problema: El problema ha sido definido con la participación de varias entidades, como el Municipio de Ocobamba, con la oficina Municipal de Promoción Empresarial (OMPE), el PRONAMACHCS, CARITAS Abancay, el Ministerio de Salud, con el personal de la posta de Ocobamba, 2. Definición de componentes: Los componentes han sido elegidos adecuadamente por el equipo técnico multiinstitucional que trabajo en la formulación del proyecto. 3. Indicadores: El Proyecto cuenta con indicadores a nivel de propósito para las dimensiones de eficacia, eficiencia, no presentando indicador para viabilidad. 4. Medios de Verificación: Existen los apropiados. 5. Reformulaciones: Se reformulo el proyecto por decisiones técnicas en los siguientes rubros: • Construcción de canales de riego • Promoción de un Centro de formación continuad. • Formulación del plan de acción de lucha contra la violencia familiar y el alcoholismo • Estudio de la problemática social, cultural, económica y política de la mujer campesina.- Actividad reprogramada para el tercer año. • Aumento de la superficie arbolada.

CONCLUSIONES

IMPACTO	TEMA PRODUCTIVO 1. La ejecución del proyecto contribuyó a disminuir la pobreza en la zona de intervención y cumplió la proyección de converger con dos objetivos del milenio. El objetivo 1: Erradicar el hambre y la pobreza y el objetivo 6: Combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades. 2. Se ha dinamizado la actividad productiva agrícola, generando ingresos económicos por la venta de productos excedentes en el cultivo del frijol. 3. El impacto alcanzado por CARITAS es bueno y positivo porque se ha logrado contribuir a la disminución de la pobreza e incremento de calidad de vida, como manifiestan los pobladores y sus autoridades. TEMA AMBIENTAL 1. Se ha generado cambios a nivel de salubridad por las instalaciones sanitarias y el buen uso de los mismos. 2. La población reconoce que mejoro su calidad de vida por la intervención de CARITAS Abancay. Debido a que tienen una mejor condición de saneamiento básico por la instalación de Letrinas y las capacitaciones realizadas en temas como: abastecimiento de agua potable, reconocen como una acción útil la cloración del agua. TEMA ORGANIZACIONAL 1. Los pobladores que han participado activamente en la ejecución del proyecto manifiestan haber fortalecido la organización dentro de agrupaciones.
PERTINENCIA	1. El proyecto muestra un elevado grado de pertinencia en cuando a su contenido de intervención. Los conceptos trabajados, ocupan la agenda política a nivel internacional (Objetivos del Milenio), Nacional así como a nivel regional y local. 2. Los problemas identificados han sido realizados en base a las necesidades de los pobladores de la zona, que en todo momento participaron activamente en la ejecución del proyecto. 3. Las entrevistas con los diferentes representantes de las instituciones y con los participantes en las actividades han evidenciado que se han adoptado de buena manera lo planteado en el expediente técnico, con consecuencias de calidad que muestran los resultados de varias actividades. 4. Se realizó la identificación, formulación y ejecución del proyecto en concordancia con trabajos que realizan las diferentes instituciones en la zona, en los temas que abarca el proyecto. 5. El montaje institucional del Proyecto realizado por CARITAS Abancay ha demostrado un suficiente nivel de coordinación y aportes a la ejecución a lo largo de la implementación del proyecto. Por lo que se facilitó la integración entre los sectores pero no suficientemente como para decir que fue una articulación intersectorialidad. Las iniciativas intersectoriales han sido limitadas aunque, en los sectores donde se han manifestado, han producido resultados interesantes. 6. Se puede decir que los acercamientos institucionales producidos por las actividades intersectoriales liderada por CARITAS Abancay, son uno de los aciertos más importantes del proyecto ya que han mostrado las rutas para producir las "arquitecturas institucionales" hacia la promoción de la multidimensional de la cohesión social, en una visión conjunta de Desarrollo sin duplicidad de actividades que generalmente perjudican en los tiempos de los productores.

EFICACIA	1. El proyecto ha sido eficaz por cuanto se han alcanzado todos los resultados previstos de forma adecuada y en los plazos establecidos. No habido factores que hayan dificultado el cumplimiento. 2. El objetivo del proyecto (Propósito), se ha logrado de modo satisfactorio. 3. El resultado 1; se sobre paso lo proyectado en un 30,12%, en lo referente al fortalecimiento de capacidades fue bien asimilada por los asistentes, en un 80,28% más de lo previsto. Resultado 2; también se aprecia que se extendió el apoyo a otras comunidades en la introducción de nuevos cultivos. En el caso del fomento de cultivo del maíz morado la meta se alcanzó en el primer año, para el segundo año bajo el área de cultivo debido a factores climáticos y mercado. Esta evolución no se pudo medir el logro del indicador de la actividad aumento de la producción de maíz morado, debido a que, el proyecto se ha elaborado entre los años 2006 al 2007, tiempo este que el valor comercial del maíz morado en el mercado era bueno. Estos precios de mercado tuvieron fluctuaciones en los siguientes años y a la ejecución del proyecto bajo el precio por lo que los productores dejaron de cultivar en algunas zonas de intervención, pero se incrementó el cultivo de frijol. En la construcción de la infraestructura se alcanzó los objetivos trazados. A la fecha de la evaluación externa se encontró que el reservorio de Aguas Verdes presenta resquebrajamiento en su estructura pero que los pobladores viene utilizando en forma, incluso está afectada la población de Esmeralda. Los pobladores han sido reubicados en otros terrenos más seguros. Por lo que no se puede atribuir responsabilidades de este hecho a la ejecución del proyecto. Para la Gestión idónea del proceso productivo agropecuario, solo se llegó a cumplir con el 87,5% de lo planificado, pero para el segundo año se subsana. 4. Resultado 3, se alcanzó satisfactoriamente, incluso se superó lo programado para la actividad Programa de capacitación en medio ambiente, y gestión de viveros frutícolas y forestales en un 34,17% 5. Resultado 4, los resultados encontrados muestran que si se alcanzó lo programado. La fortaleza que se tuvo es la firma de convenios con diferentes instituciones para la realización de muchos talleres de capacitación. En todos los talleres de capacitación ejecutados se tuvo mayor asistencia de productores que lo previsto. No se tuvo asistencia de mujeres en proporciones equivalentes con los varones. 6. Resultado 5, se alcanzó en su totalidad.
EFICIENCIA	1. El proyecto fue eficiente se expresa esto, siguiendo a Reinaldo O. Da Silva, quien define a la eficiencia como "operar de modo que los recursos sean utilizados de forma más adecuada". En el proceso de evaluación se encontró que hubo más gasto económico del que la entidad financiera otorgo, lo que no implica que sea ineficiente la ejecución del proyecto, ya que este hecho se debió a que en la ejecución los pobladores que en un inicio no intervenían en el proyecto al ver los resultados solicitaba ser considerados como beneficiarios del proyecto. 2. Algunos procesos de compra se han realizado sin tomar en cuenta las normas de adquisición. Evaluando esta omisión se pudo observar que fue por evitar las paralizar las acciones del proyecto.
VIABILIDAD	1. La continuidad está garantizada debido a la metodología participativa utilizada por CARITAS Abancay en la ejecución del proyecto. 2. El 89% de las actividades realizadas en el desarrollo del proyecto son sostenibles.
SUGERENCIAS	
IMPACTO	1. Una forma clásica de definir el FIN en los proyectos es generalmente enfocado a la disminución de la pobreza. Se sugiere definir el marco teórico de pobreza, para trabajar en minimizar esta y para que las evaluaciones sean más mensurables. 2. Igualmente delimitar la teoría cuando se desea trabajar en la mejora de calidad de vida ya que este concepto es muy amplio y multivariado.

PERTINENCIA	1. En las futuras intervenciones continuar con la metodología de intervención utilizada, porque la participación de instituciones de una consolidada experiencia en la zona de intervención aportan bastante en la ejecución del proyecto que es necesario para avanzar en dirección a una mayor pertinencia no sólo conceptual sino también de las propias acciones impulsadas por los proyectos de CARITAS Abancay. 2. El enfoque participativo y de género utilizado desde el principio es conveniente, y le otorga un suficiente grado de flexibilidad en la ejecución del proyecto, además permitió una mayor confluencia entre las necesidades y los insumos del programa. Por lo que se sugiere seguir trabajando con estos enfoques. 3. Identificar en forma más precisa y con un análisis de necesidades los intereses estratégicos de varones y mujeres, ya que estos no son iguales, porque las mujeres priorizan necesidades diferente a los varones.
EFICACIA	1. Es bueno trabajar por la búsqueda de la libertad financiera en la poblaciones intervenidas, en este caso fue en base del cultivo del maíz morado y el frijol. Se sugiere apoyos a comunidades, realizar con más precisión los análisis de mercado, para que la producción agropecuaria sea sostenible y aceptada en el mercado. 2. La formación de promotores garantiza la eficacia del proyecto ya que son los que trabajan directamente con los pobladores en los objetivos. Por lo que se sugiere seguir trabajando en la formación de promotores locales. 3. Seguir buscando la firma de convenios con diferentes instituciones de la zona de intervención para que el Centro de "Formación Continuada", utilice eficientemente sus instalaciones. 4. Cuando se tenga que elegir especies para incrementar la producción frutícola, se debe de realizar mejor la identificación de esta, reiteramos que es necesario que las especies elegidas sean aceptadas por la población, así como el mercado. 5. Seguir acompañando a la ejecución de las actividades mensurables con un programa nutrido de capacitaciones. Debido a que esta acción garantiza satisfacer los objetivos del proyecto y su sostenibilidad.
EFICIENCIA	1. Se debe verificar la recepción de lo comprado, según las especificaciones establecidas en los requerimientos, mediante orden de compra, guía de remisión y/o ingresos almacén. 2. Aprobar los precios mediante evaluación de un mínimo de tres cotizaciones.
VIABILIDAD	1. Se sugiere continuar con la metodología aplicada en la ejecución del proyecto, especialmente con la priorización del enfoque participación y la gestión en la realización de alianzas estratégicas con las instituciones existentes en la zona de intervención, con la finalidad de involucrar a la población en su propio desarrollo, así como la de incentivar a las autoridades a que participen en este desarrollo. 2. Seguir con la realización de talleres de capacitación para cada ítem de resultado trabajado en el proyecto.
LECCIONES APRENDIDAS	
IMPACTO	1. Es buena idea cotejar objetivos del proyecto con otros de mayor envergadura como fue el caso de los objetivos del milenio, ya que este hecho mejora las alianzas estrategias con instituciones que trabajan estos temas. 2. Desarrollar el proyecto con un enfoque productivo, de salubridad y ambientales, fortaleció la participación de la mujer ya que un pensamiento natural femenino es garantizar la calidad de vida de las generaciones venideras.
PERTINENCIA	1. El identificar en forma participativa los objetivos del proyecto y platear resultados en base a una visión holística favorece a la consecución de metas. 2. Los acuerdos cooperativos horizontales conocidos como alianzas estratégicas generadas por CARITAS Abancay, es una fortaleza en la ejecución del proyecto, debido a que ofrecen múltiples ventajas como: Las sinergias al combinar los objetivos entre las instituciones que favorece el alcance de objetivos. Las acciones son más rápidas y se aprovechan mayores oportunidades de desarrollo.

EFICACIA	1. La definición de calidad de vida en el desarrollo del proyecto ha sido parte de un concepto integrador que comprende todas las áreas. Como una proyección a la mejora de las condiciones de saneamiento básico (Social), así como a la mejorar de la producción agraria con la identificación de productos con más valor en el mercado y de mayor demanda (Económico), sin olvidar la mejora y protección del medio ambiente (ambiental), todo esto fue planteado identificando indicadores sociales que se han referido a condiciones externas relacionadas con la buena organización de la población. Esta definición que oriento el desarrollo del proyecto tuvo como respuesta la identificación de un principio organizador que puede ser aplicable para la mejora de una sociedad, sometida a transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y económicas permanentes. 2. Es importante resaltar que en el desarrollo del proyecto se ha identificado y realizado diferentes capacitaciones casi en todos los resultado proyectados estas actividades han constituido las mejores inversiones en el recurso humano y se ha convertido en una de las principales fuentes de bienestar del poblador beneficiado. 3. Toda esta experiencia se convierte en un principio; "la capacitación es una poderosa herramienta en el proceso de construcción y profundización de un proyecto de intervención social, que funciona como puente de articulación entre la población y la institución con la finalidad de generar desarrollo". 4. Lo que realizo CARITAS Abancay durante el horizonte del proyecto es utilizar la capacitación como principio generador de capacidades humanas, empresariales, sociales y culturales. Este accionar de CARITAS fue proactiva, promotora de derechos e inteligente, en la práctica comunicacional para el desarrollo, que se debe inscribir con un modelo social, político y económico inclusivo y redistributivo, ligado a las mejores tradiciones históricas de la población de Ocobamba.
EFICIENCIA	1. Cuando los beneficiarios de un proyecto están satisfechos con los resultados, los productores que en un inicio no deseaban ser incluidos en la ejecución del trabajo solicitan participar en las actividades del proyecto. Por lo que se debe contar con planes de contingencia para mejorar los resultados del proyecto.
VIABILIDAD	1. El involucramiento de la población desde la identificación de las necesidades y en la misma ejecución del proyecto garantiza un alto grado de identificación de los mismos en el horizonte del proyecto y la posterior continuidad del mismo. 2. La participación de técnicos y personal que trabaja en la ejecución del proyecto que sean oriundo de la zona de intervención incrementa el grado de sostenibilidad, debido a que la comunidad por ser hijo de la misma lo respeta y obedece. Es mejor que participen profesionales que conozcan la idiosincrasia de los pobladores de la zona como es el caso del Licenciado en enfermería Jymmy Cáceres Gutiérrez Aybar que es del distrito de Ancohuayllo-Uripa). 3. La expansión de capacidades en temas que versa el proyecto es importante para generar una ambiente de seguridad en el accionar de los actores del proyecto que se traduce en una sostenibilidad garantizada.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

I.1.- TÍTULO:

Mejora de la calidad de vida de la Microcuenca de Ocobamba Baja.

I.2.- FINANCIADOR:

Gobierno de Navarra. Número de expediente 359/2008

I.3.- TIPO DE EVALUACIÓN:

Evaluación ex post Externa

I.4.- PRESUPUESTO APROBADO:

704.816,61 €

I.5.- BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las comunidades beneficiarias son indígenas de procedencia Chanca (cultura preincaica). Las instalaciones salubres son escasas, y el volumen de productividad muy bajo. Estos factores repercuten respectivamente en los índices sanitarios y de acceso a los alimentos básicos.

Las necesidades no se reducen al ámbito de instalaciones o medios técnicos. La población carece de conocimientos que (adaptados a las especificidades del medio en el que viven) ayudarían a mejorar los estándares higiénicos, nutritivos, y de rendimiento productivo. Por otra parte faltan instrumentos para organizarse civilmente y mejorar los actuales cauces de participación.

El proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de las comunidades de la Microcuenca de Ocobamba mediante las siguientes líneas de actuación:

1. Instalación de letrinas familiares
2. Mejora de la producción agraria.
3. Mejora de las condiciones medioambientales.
4. Empoderamiento de la población (tanto a nivel de gestión técnica de procesos productivos, medioambientales, y de instalaciones sanitarias; como para que participen más activamente en organizaciones civiles y adquieran mayor protagonismo en los procesos futuros de desarrollo comunal).

I.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General: Disminución del nivel de pobreza de las comunidades de: Huancayo bajo, Soccos, Piscobamba baja, Carhuayaco bajo, Esmeralda, Sarahuarcay, Umaca, Primero de mayo, Ocobamba, Manzanapata -en Challhuani-; Microcuenca de Ocobamba Baja.

Objetivo Específico: Ha mejorado la calidad de vida de las comunidades de la Microcuenca de Ocobamba Baja.

1.7. POLÍTICA GLOBAL

Los Proyectos de Desarrollo que Caritas Abancay viene ejecutando han generado cambios sustanciales según el reconocimiento de la población beneficiaria y los vecinos de los lugares adyacentes. Por ello, se desea tener una evaluación de las actividades desde una mirada externa que permita conocer el grado de avance y empoderamiento en las diferentes actividades, para poder consolidar y replicar las que sobre salgan y mejorar las que aún estén débiles.

Este proceso de evaluación ha sido participativo con la intervención de los actores claves: primarios y secundarios. Ha permitido tener un conocimiento sobre el grado de involucramiento de los productores que han participado en la ejecución y las estrategias utilizadas, para que se puedan replicar las idóneas en otras nuevas intervenciones y mejorar las que no cumplen con el objetivo planteado.

El proyecto al que se refieren los presentes términos de referencia (TDR) ha sido desarrollado por Caritas Abancay directamente responsable de su ejecución sobre el terreno.

El proyecto ha sido financiado por el Gobierno de Navarra en la convocatoria del año 2008 para programas plurianuales.

Una vez finalizado el periodo de ejecución se han concluido todas las actividades planificadas y se dispone de los indicadores que señalan la medida del cumplimiento del objetivo específico y los resultados previstos. Es por el que se diseña la evaluación ex post, con el fin de verificar, a partir de los criterios de eficacia, eficiencia, impacto, viabilidad y pertinencia, desde los enfoques de género y derechos, la profundidad y alcance de la intervención.

En este sentido, el interés prioritario fue impulsar un proceso evaluativo que, aparte de verificar el cumplimiento de objetivos y resultados, constituya a ser una herramienta de aprendizaje y un insumo clave para el diseño de futuras intervenciones.

Siguiendo el principio de "utilidad" de la evaluación, se recabo información por los técnicos de los equipos y gestores aquellos intereses y necesidades informativas que se consideraron más importantes en este proceso. Así, los objetivos de esta evaluación, consisten, en primer lugar en la medición del impacto que ha tenido el proyecto en el contexto en el que se ha ejecutado y, en segundo lugar, el análisis de los principales procesos para generar aprendizajes útiles

1.8. FECHA DE INICIO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Fecha de inicio: 8 de octubre 2008

Fecha de finalización: 30 de septiembre 2011

II. MARCO METODOLÓGICO

II. 1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN


En base a los términos de referencia de la evaluación y la propuesta metodológica presentada por Chacra Escuela, los objetivos de la evaluación son:

- Valorar, cualitativa y cuantitativamente, en qué medida el proyecto ha alcanzado los objetivos y resultados previstos, partiendo de los criterios clásicos: Eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto y viabilidad.
- Elaborar recomendaciones y propuestas de mejora para futuras intervenciones.
- Analizar la sostenibilidad de los procesos desencadenados con el proyecto.
- Promocionar la cultura de evaluación entre los actores involucrados en el proyecto a través de la participación en el proceso.

II.2. METODOLOGIA ADOPTADA

La metodología tuvo como objetivo la recolección de información y datos fiables que sirvieran como base para la formulación de juicios fundados y realistas para responder a las preguntas evaluativas.

En el siguiente grafico se puede apreciar las cuatro fases que se siguieron en el desarrollo del proyecto.

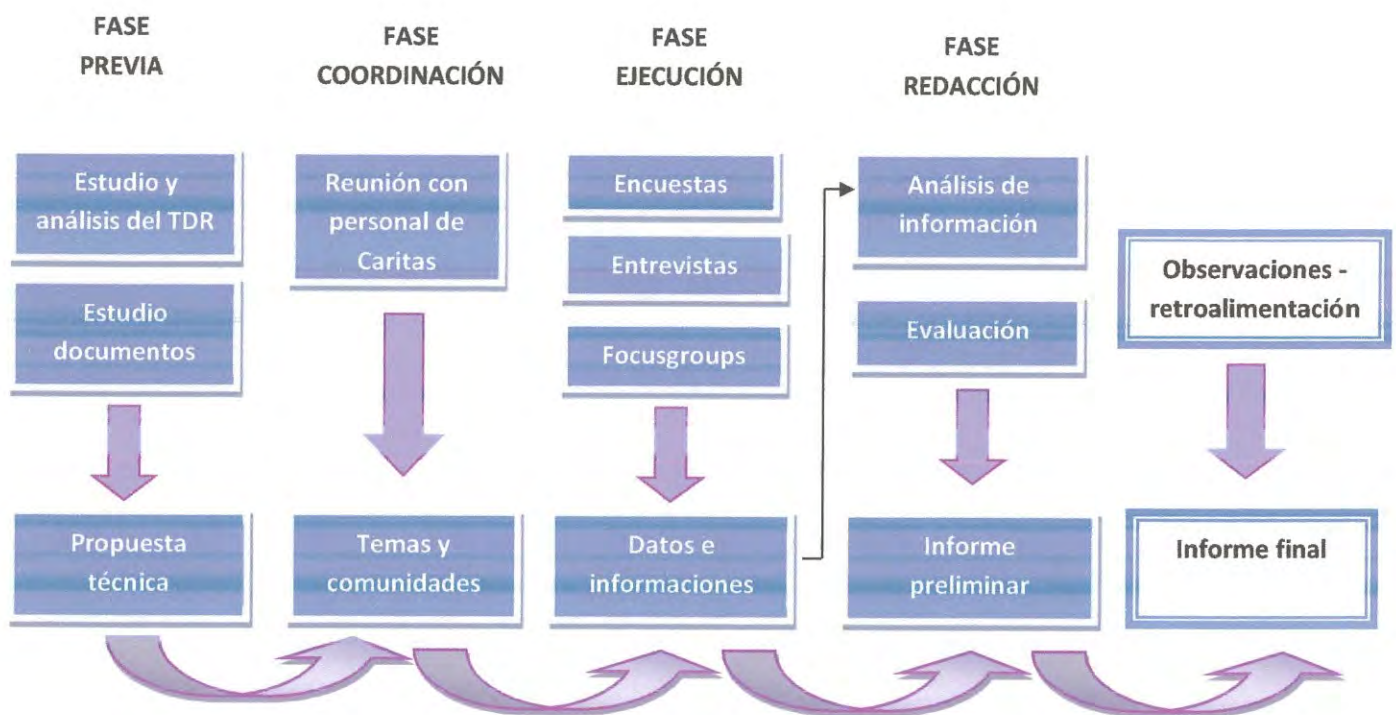

II. 3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta evaluación valora la intervención de Caritas Abancay en el proyecto "Mejora de la calidad de vida de la micro cuenca de Ocobamba baja" a través de los siguientes criterios.

C R I T E R I O S D E E V A L U A C I Ó N	• Impacto	Valoración socioeconómica global, incluyendo los efectos positivos y negativos, tanto de aquellos que son deseados y estaban previstos, como de los no previstos y no deseados.
	• Pertinencia	Grado en el cual el objetivo del proyecto es consistente con las prioridades de desarrollo de la población.
	• Eficacia	Grado en el cual se lograron las metas físicas y financieras de un proyecto. En general, la eficacia es la verificación del cumplimiento de los objetivos de una intervención. Mide el éxito en el logro del objetivo
	• Eficiencia	Análisis de los resultados con relación al costo, es decir, análisis de la transformación de los insumos en productos. Mide la productividad de la intervención en que medida los insumos se convierten en resultados.
	• Viabilidad	Continuidad en la generación de los beneficios del proyecto en la duración de su periodo

II.4. COMPONENTES DE LA EVALUACION

Se trabajó el presente informe con el siguiente modelo tridimensional:

	FIN (Objetivo de Desarrollo)	PROPOSITO (Objetivo del proyecto)	RESULTADOS	INDICADORES
Impacto	Efectos del proyecto en el largo plazo			
Pertinencia		Dirección y utilidad del proyecto		
Eficacia		Cumplimiento de objetivos del proyecto		
Eficiencia			Logro de resultados	
Viabilidad	La sostenibilidad del proyecto en el largo plazo			

Factores de Desarrollo

Jerarquía de objetivos

Cuadro 01:

NIVELES DE EVALUACIÓN

Lógica de intervención	Impacto	Pertinencia	Eficacia	Eficiencia	Viabilidad
FIN (Objetivo de Desarrollo)					
Disminución del nivel de pobreza de las comunidades de: Huancayo bajo, Soccos, Piscobamba baja, Carhuayaco bajo, Esmeralda, Sarahuarcay, Umaca, Primero de mayo, Ocobamba, Manzanapata -en Challhuani-; Microcuenca de Ocobamba Baja.					
PROPOSITO (Objetivo del Proyecto)					
Mejorar la calidad de vida de las comunidades de la Microcuenca de Ocobamba Baja.					
Resultados					
R1. Mejora de las condiciones de SANEAMIENTO básico de la población					
R2. Mejora de las condiciones de PRODUCCIÓN AGRARIA					
R3. Mejora MEDIOAMBIENTAL					
R.4. POBLACIÓN ORGANIZADA participa de los procesos de desarrollo y conoce sus derechos.					
R.5. Gestion idonea del proyecto					
Indicadores					
1.1. Implemento de las instalaciones sanitarias: Las familias de las comunidades de Huancallo bajo, Soccos, Carhuayaco Bajo, y Esmeralda cuentan con 332 letrinas de uso familiar.					
1.2. Programa de CAPACITACIÓN en educación sanitaria y fortalecimiento de las JASS (Junta de administración de los servicios de saneamiento). Se impartirán 3 módulos -de 3 eventos cada uno. A ellos asistirán 120 miembros (6 hombres y 6 mujeres -Integrantes de las directivas comunales, JASS, y líderes/esas identificados/as con el proyecto- de cada una de las 10 comunidades), que replicaran lo aprendido entre sus vecinos.					
2.1. Mejora de la producción agrícola: 108 familias de las comunidades de: Huancallo bajo, Soccos, Piscobamba baja, Carhuayaco Bajo, Esmeralda, Sarahuarcay, Umaca, Primero de mayo, y Manzanapata introducen la producción del MAIZ MORADO, obteniendo una producción anual de 54 toneladas (6 por comunidad) en un total de 36 hectáreas sembradas. Estas mismas familias aumentan la producción de FRIJOL en 36 hectáreas, produciendo anualmente 72 toneladas (8 por comunidad) destinadas a su consumo y comercialización.					
2.2 Mejora de la infraestructura productiva.					
2.3 Gestion idonea del proceso productivo agropecuario.					
3.1. Aumento de la superficie arbolada.					
3.2. Protección de fuentes de agua .					
3.3. Programa de capacitación en medio ambiente, y gestión de viveros frutícolas y forestales.					
4.1. Formación para la participación civil en procesos de desarrollo.					
4.2. Capacitación en materia de lucha contra el maltrato familiar y alcoholismo.					
5.1 Identificación del Programa.					
5.2. Gastos de Ejecución.					

Para cada pregunta evaluativa han sido formulados criterios de juicio como base para la respuesta a la pregunta. Cada criterio es medido por una serie de indicadores cuya finalidad es la medición del alcance de los objetivos esperados.

Las preguntas evaluativas son presentadas en el siguiente cuadro:

Cuadro 02:

RELACION DE PREGUNTAS EVALUATIVAS

Nro.	Preguntas evaluativas
1	IMPACTO (Efectos) Principal: ¿En qué medida la intervención de CARITAS Abancay ha generado cambios en la población beneficiaria de la micro cuenca de Ocobamba baja? Secundarias: • ¿Se llegó a cumplir el FIN (Objetivo de Desarrollo)? • ¿Se logró alcanzar el Objetivo del Proyecto (PROPOSITO) del proyecto?
2	PERTINENCIA (Problemas y Necesidades) Principal: ¿En qué medida el proyecto es pertinente en relación con el contexto del sector, las necesidades que se deben de satisfacer y los problemas que se deben solucionar? Secundarias: • ¿Cuán congruente es el proyecto con las prioridades establecidas por las políticas nacionales y sectoriales? • ¿Se ha tenido en cuenta, en la concepción del proyecto a otras instituciones locales que están trabajando en forma similar? • ¿Los pobladores de la zona de intervención han participado en la concepción del proyecto?
3	EFICACIA (Objetivos) Principal: ¿En qué medida se ha logrado alcanzar los objetivos del proyecto? Secundarias: • ¿Es el propósito (Objetivo del proyecto) lo suficientemente específico? • ¿Los indicadores y medios de verificación son adecuados?
4	EFICIENCIA (Optimización) Principal: ¿En qué medida los recursos/insumos utilizados durante la intervención de Caritas se ha convertido en productos? Secundarias: • ¿Se justificó la recepción y conformidad de las adquisiciones de bienes y servicios? • ¿Los insumos se entregaron en los momentos adecuados? • ¿La cantidad y calidad de los insumos fueron adecuadas?
5	VIABILIDAD (Continuidad) Principal: ¿En qué medida los beneficiarios del proyecto ponen en práctica lo aprendido durante la intervención de Caritas? Secundarias: • ¿Se da la continuidad a lo trabajado en el proyecto? • ¿El apoyo político está sustentado? • ¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

II.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

1. ENTREVISTAS:

Se ha realizado entrevistas con profundidad utilizando criterios de acuerdo a su competencia a las siguientes autoridades y representantes de las comunidades:

- Cesar Ayvar Buendia - Alcalde de Ocobamba
- Pablo Alberto Aquise Allende - Gobernador.
- Rosalinda Rafael Cerro. - Jueza
- Marina Reynaga Farfán. Presidenta de la federación de mujeres de Ocobamba.
- Benjamín Arroyo - Promotor Carhuayaco bajo
- Juan José Pardo palomino - Regidor de educación y cultura
- Sra. Luisa Genara Alvarado Pérez - Regidora periodo 2007- 2010
- Prospero Vidal Calderón Gutiérrez - Vice presidente del frente de defensa.
- Hernán Lobos Alarcón - sacerdote
- Kelly Sarmiento - enfermera

2. ENCUESTAS:

Las personas encuestadas pertenecen a las siguientes Comunidades:

Nro	COMUNIDADES
1	Huancallo bajo
2	Soccos
3	Piscobamba baja
4	Caarhuayaco bajo
5	Esmeralda
6	Sarahuarcay
7	Umaca
8	Primero de mayo
9	Ocobamba
10	Manzanapata

El número total de personas encuestadas asciende a 102.

3. GRUPOS FOCALES:

Se han celebrado dos Grupos Focales. Uno en Ocobamba y otro en Piscobamba.

Las fichas de los Grupos focales se encuentran en el Anexo 2.

Las herramientas metodológicas están documentadas en el Anexo 2.

II.6. ANÁLISIS DE INFORMACIONES Y DATOS.

El trabajo analítico se ha basado en la Preguntas Evaluativas con sus Criterios de Juicio e Indicadores. La cadena lógica ha sido la siguiente:

En cada Pregunta Evaluativa y Criterio de Juicio los datos e informaciones recolectados han sido utilizados para medir el grado de alcance de los objetivos a través de los indicadores.

- El equipo evaluador ha desarrollado y discutido hipótesis para verificar el trabajo de campo.
- Las informaciones se han agrupado con referencia a los indicadores y elaborando una base de datos (anexo 03).
- Se han identificado las lecciones aprendidas.
- Se han formulado conclusiones basadas en los análisis.
- Se han formulado sugerencias de acuerdo con las conclusiones.

II.7.-FORMULACIÓN DE LOS JUICIOS

Se recolecto información en base a cada Indicador, el equipo evaluador ha preparado respuestas para cada Pregunta y por cada criterio de juicio.

Los juicios han sido formulados con base en los siguientes insumos y consideraciones:

- Datos e informaciones recolectadas por cada Indicador.
- Coherencia entre indicadores por cada Pregunta Evaluativa.
- Formulación clara y realista.

III. CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN

III.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACION EVALUADA

Los beneficiarios directos son 10 comunidades: Huancallo Bajo, Soccos, Piscobamba Baja, Carhuayaco Bajo, Esmeralda, Sarahuarcay, Umaca, Primero de Mayo, Ocobamba, y Manzanapata.

Cuadro 03:

POBLACIÓN BENEFICIARIA

VARONES	MUJERES	TOTAL
2341	2051	4392

Fuente: Términos de referencia Caritas Abancay. Junio 2013.


III.2.- LOCALIZACION GEOGRAFICA

País	: Perú
Región	: Apurímac
Provincia	: Chincheros
Distrito	: Ocobamba
Comunidades	: San Miguel de Piscobamba, Umaca, Sarahuarcay, Choquepuquio, Carhuayaco Bajo, Carhuayaco Alto, Esmeralda, Socos Edén, Mitobamba, Comunidad de Ocobamba.
Barrios	: Cercado, Alianza, Huancallo Alto, Huancallo Bajo, Challhuani, Anansayoc, Tres Cruces, Salvia, Santa Rosa Alta, Túpac Amaru, Rayampampa, 1º de Mayo, Florida, Chuquibamba, Mayabamba

El distrito de Ocobamba está localizado en la parte sureste de la provincia de Chincheros, a 42.7Km. Se encuentra situada a dos o tres horas aproximadamente de la ciudad de Andahuaylas.

Mapa 1

Ubicación de la del distrito de Ocobamba, provincia de Chincheros

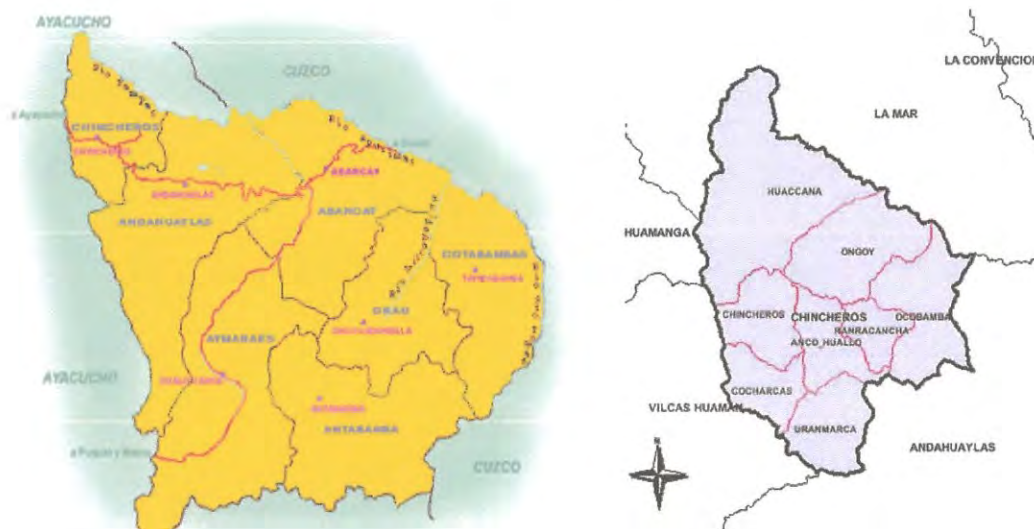

1. Altitud:

El Distrito de Ocobamba se encuentra en una altitud que oscila entre 2,650 m.s.n.m y los 4,400 m.s.n.m. y la altitud promedio está en el orden de los 3,525 m.s.n.m.

2. Límites:

AL ESTE : Con el Distrito de Talavera de la Provincia de Andahuaylas.

AL NORTE : Con la Provincia de Lamar del Departamento de Ayacucho.

AL OESTE : Con los Distritos de Ongoy y Ranracancha de la Provincia de Chincheros.

AL SUR :Con el Distrito de Ranracancha provincia de Chincheros y Santa Maria de Chicmo, Provincia de Andahuaylas.

Geográficamente el Distrito se encuentra ubicado dentro de las siguientes coordenadas:

Latitud Sur 13° 27' 48", y Longitud Oeste 73° 33' 16".

3. Accesos:

El acceso al Distrito de Ocobamba es por carretera siguiendo la ruta desde Andahuaylas al Distrito de Ocobamba pasando por diversas comunidades. El tiempo que se tarda para llegar de Andahuaylas a Ocobamba es de aproximadamente de 2 horas y 15 minutos, en un recorrido de 42.7 kilómetros.

III.3.- POBLACIÓN:

La Población del Distrito de Ocobamba se caracteriza por ser Rural y Urbana .Su patrón de vida está sujeta principalmente a las actividades agrícolas, pecuarias y de comercio, existiendo otras actividades de transformación en menor grado, una pequeña industria de manera incipiente. La comercialización de sus productos se realiza generalmente en el Cercado (mercado) y en menor medida en la ciudad de Andahuaylas. Parte de la población emigra a otras ciudades más grandes y de mayor actividad económica.


El Distrito de Ocobamba cuenta con 3,450 viviendas, una población, aproximada de 10,360 según el X Censo de Población y VI de Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). El siguiente cuadro describe específicamente la distribución de habitantes por comunidad.

CUADRO 04:
HABITANTES POR COMUNIDAD DEL DISTRITO DE OCOBAMBA

DISTRITO	Habitantes aprox.	Nº de Comuneros Empadronados
OCOBAMBA	5360	1204
S.M.PISCOBAMBA	2115	560
UMACA	511	60
SARAHUARCAY	425	60
CHOQUEPUQUIO	510	95
CARHUYACO BAJO	220	50
CARHUYACO ALTO	200	30
ESMERALDA	300	60
SOCOS EDEN	400	70
MITOBAMBA	420	95
TOTAL	10360	2187

Mapa satelital 01:

DISTRITO DE CHINCHEROS- COMUNIDAD OCOBAMBA

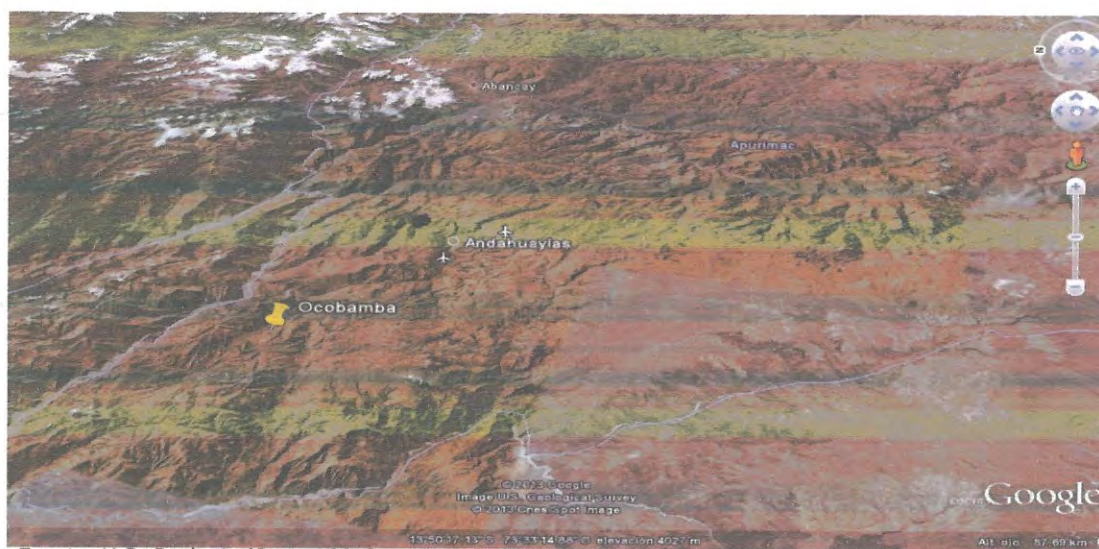

Fuente: U.S. Geological Survey 2013

Mapa satelital 02:

COMUNIDAD OCOBAMBA



Fuente: U.S. Geological Survey 2013

CUADRO 05:**POBLACION POR BARRIO.**

BARRIO	Habitantes aprox.	Nº de Comuneros Empadronados	Tipo de Viviendas
CENTRAL	1050	280	Mayormente de teja y calamina
ALIANZA	225	50	
HUANCALLO ALTO	100	28	
HUANCALLO BAJO	350	76	
CHALLHUANI	390	81	
ANANSAYOC	650	135	
TRES CRUCES	550	116	
SALVIA	175	39	
SANTA ROSA ALTA	250	58	
TUPAC AMARU	425	88	
RAYAMPAMPA	380	80	
1º DE MAYO	175	38	
FLORIDA	200	43	
CHUQUIBAMBA	160	33	
MAYABAMBA	280	59	
TOTAL	5360	1204	

Fuente: Taller Participativo. Elaboración Facilitador Junio 2,010

CUADRO 06:**DISTRIBUCIÓN SOLO DEL DISTRITO DE OCOBAMBA SEGÚN GRUPOS ETAREOS 2010.**

GRUPO ETARIO	TOTAL
< 3 años	1850
04 - 09	2125
06 - 19	2750
20 - 64	3370
> 64	265
Total	10,360.00

Fuente: Encuesta del distrito

Elaboración: Equipo Técnico Planificación 2010

Las familias se componen de 4 a 6 miembros, la responsabilidad en un 80% recae sobre el padre y el 20% sobre la madre.

III.4.-CLIMATOLOGÍA:

1. Clima:

Su clima es variado, seco, húmedo y frío en los meses de Mayo a Diciembre, frío y lluvioso entre los meses de Enero a Abril, en verano pueden alcanzar los 25°C durante el día y 3°C por la noche, en la estación de invierno la temperatura diurna alcanza a 15° C, y en las noches más frías de -2° a 0°C bajo cero, dependiendo de la altitud.

2. Humedad.

La humedad relativa es del 80% originando la garúa. En los meses de Enero a Marzo granizada y hasta nieva en las zonas altas en los meses de Mayo a Julio, en los meses de Junio a Agosto la humedad relativa baja hasta el 50%.

3. Precipitaciones.

La precipitación es la fuente de agua más importante para la agricultura, dentro de la Microcuenca, ya que la mayor parte de áreas agrícolas se encuentran bajo secano. Por consiguiente, estudiar la distribución de la precipitación en el espacio y en el tiempo constituye uno de los aspectos más importantes.

Se presentan fenómenos eléctricos acompañado de lluvias torrenciales que se inician en el mes de Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril (estación de invierno). De acuerdo con la información pluviométrica disponible en la Estación Climatológica de Chincheros, complementada con observaciones ecológicas de campo, se estima que la precipitación pluvial varía del distrito de Ocobamba entre los 700 mm y los 1100 mm para la parte más baja y alta. La precipitación media anual de la Microcuenca es alrededor de 845 mm.

En general la distribución de la precipitación dentro de toda esta zona, a lo largo del año es irregular y su magnitud permite una activa agricultura de secano, especialmente entre los sectores altitudinales intermedios que dan origen a una

vegetación herbácea, asociada en algunos sectores con arbustos y árboles de mediana altura.

4. Nubosidad.

De Enero a Mayo el Distrito presenta una espesa neblina que lo cubre casi por completo, siendo difícil la visibilidad para los conductores , suele disiparse al transcurrir del día.

5. Vientos.

Los vientos huracanados se presentan durante los meses de Agosto y Septiembre para luego pasar a una temporada corta de pequeño verano durante los meses de Octubre, Noviembre y parte de Diciembre.

6. Presión Atmosférica.

Es Baja debido a la altitud. Estas bajas presión además de influir en los factores de riesgo de determinadas enfermedades, generan también problemas en la población, debido a que ocasiona inaccesibilidad geográfica temporal por el exceso de lluvias, dañando y inhabilitando a veces las vías de comunicación y/o incrementando el riesgo de accidentes, limitando las acciones del sector salud y generando problemas de referencia y contra referencias además del abastecimiento regular de productos alimenticios y otros, afectando su economía.

7. Pisos Ecológicos:

El distrito de Ocobamba cuenta con tres pisos ecológicos bien definidos: **Quechua** (2,300 a 3,500), **Suni** (3,500 a 4,100) y **Puna** (4,000 a 4,800 m.s.n.m.).

III.5.- HIDROLOGÍA

No existen espejos de agua pero si varios manantes y de muchos dotan de agua potable al Distrito de Ocobamba, como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 07:

DISTRIBUCIÓN MANANTES Y/O CAPTACIONES

Nº	Nombre del Barrio.	Nombre de Manante y/o Captación.	Caudal aprox. Lt/s.	Barrio/s que Beneficia
1	Rayampampa	Pullwacucho-Yacutoccyacc.	3.229	Rayampampa, Challhuani, Túpac Amaru.
2	Anansayoc	Toro Urmana, Puca Sombrero-Anansayoc	1.57	Ananzayocc.
3	Tres Cruces	Ccollpa	0.138	Tres Cruces.
4	Alianza	Ccollpa-Alianza	0.921	Alianza.
5	1º de Mayo	Pagchipata	0.69	1º de Mayo
6	Central	Yacutoccyacc	1.2	Central.
7	Salvia	Salvia	0.073	Salvia.
8	Florida	Florida	0.676	Florida, Huancayo Alto.
9	Huancallo Bajo	Huancallo bajo	0.903	Huancallo Bajo.
10	S.M. Piscobamba	Pallcay	4.1	Piscobamba
10	Umaca	Chicher monte	5	Umaca
11	Sarahuar cay	Yanayaco	3	Sarahuar cay
12	Choquepuquio	Lorohuachana	8	Choquepuquio
		Rio Chacomayo	100	
13	Carhuayaco Bajo	Río Chacco Huaycco	70	Carhuayaco Bajo
		Rio Ranracancha	100	
14	Carhuayaco Alto	Rio carhuayaco alto	70	Carhuayaco Alto
15	Esmeralda	Estanqué Pampa	50	Esmeralda
16	Socos Eden	Toccyacc	80	Socos Eden
17	Mitobamba	Saywarumi	60	Mitobamba

Fuente: Taller Participativo. Elaboración Facilitador Junio 2010

III.6.- EDUCACIÓN:

En todo el distrito de Ocobamba se cuenta con varias Instituciones Educativas, tanto en el nivel inicial, primario, secundario y Wawawasis también cuenta con un CETPRO que es de nivel superior ubicado en el barrio central. Las otras instituciones educativas se encuentran distribuidas en distintos barrios y comunidades, existe también varios PRONOEIs, también mencionaremos que no se

cuenta con una nutrida población estudiantil es por ello que existe 66 instituciones educativas.

El Distrito cuenta con 66 Instituciones Educativas en total, están conformados de la siguiente manera: 10 instituciones son de nivel Inicial, 18 son de nivel primario, 05 son de nivel secundario, existe también 01 CETPRO, 08 PRONOEIs y por ultimo 25 Wawawasis.

Las I.E. del distrito de Ocobamba se encuentran en regular estado de conservación, la mayoría poseen servicios higiénicos completos e infraestructura adecuada, todos poseen servicio de fluido eléctrico.

En cuanto al nivel educativo denota un nivel regular y con alumnos con predisposición a expresiones artísticas destacándose la danza, el uso de instrumentos musicales y el canto. Incluso se tiene artistas que han destacado a nivel nacional.

El porcentaje de Instituciones Educativas según el nivel es el siguiente: primario representa un porcentaje del 27% del total de Instituciones Primarias de esta localidad; el nivel inicial representa el 15% del total, el nivel secundario representa el 7%, el CETPRO representa el 2%, los PRONOEIs representan el 12% de instituciones a nivel distrital y por último tenemos los Wawawasis con el porcentaje más alto representando el 37%.

La población estudiantil del Distrito es relativamente baja. Esto es debido a que muchos pobladores de la zona deciden mandar a sus hijos a la ciudad u otros lugares donde existen Instituciones Educativas que oferten estudios superiores.

1. Analfabetismo

Según información recabada por el equipo técnico el 25% de la población la población es analfabeta, siendo un porcentaje relativamente bajo comparado con las de otros Distritos de la zona. Se debe a la existencia de I.E. del Distrito que contribuye a la erradicación del analfabetismo. Así también mencionaremos que existe el programa del estado PRONAA, el cual se dedica exclusivamente a erradicar el analfabetismo, contrastándolas con el promedio regional también se

sitúa en buena posición pues este es del 36.9%, y contrastando con el promedio nacional es doblemente mayor que es de 12.8% con respecto al índice de analfabetismo por genero se sigue el mismo patrón de que las mujeres presentan mayor grado de analfabetismo.

III.7.-VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS:

En el Distrito de Ocobamba las viviendas están construidas el 73% con material noble y techo calamina y el 27% son de adobe o con techo de teja. En cuanto a las paredes una gran parte de las viviendas las tienen es de adobe, poco a poco se ha utilizado el ladrillo y bloquetas, esto es debido a que estos materiales son accesibles en el Distrito siendo construidas en su mayoría por sus dueños, sin asistencia técnicas por lo que son viviendas donde no se han utilizado conocimientos técnicos adecuados para su construcción.

La distribución espacial de estas viviendas se encuentran en forma ordenada en la mayoría de los barrios y comunidades del Distrito. Están en muchos de los casos consecutivas juntas o semidispersas lo que de alguna manera puede facilitar un ordenamiento territorial urbano y las posibles intervenciones con proyectos de agua, luz, desagüe etc. El 30% de las viviendas de este distrito no cuenta con el servicio de fluido eléctrico por lo que el alumbrado de las viviendas es por medio de velas, mecheros y/o linternas.

III.8.-SALUD:

Los principales problemas de salud están relacionados con las enfermedades respiratorias y gastrointestinales como neumonías, diarreas, parasitosis etc. sobre todo en la población infantil. Los problemas de salud dental se han incrementado de manera incisiva en los pobladores en especial en niños y adultos del Distrito lo cual requiere un estudio. Uno de los problemas más importantes con los que se encuentra este sector es que carece de centros de salud con especialidades médicas, remitiéndose a los casos específicos a la ciudad de Andahuaylas en ambulancia.

Principales Enfermedades que inciden el distrito de Ocobamba:

Entre las 10 principales enfermedades que se presentan en el distrito se tiene a las siguientes:

- Infecciones Agudas Respiratorias.
- Trastornos Diversos.
- Helmintiasis.
- Enfermedades del Sistema Digestivo.
- Enfermedades del Sistema Urinario.
- Dorsopatias.
- Traumatismos.
- Pediculosis, Acareaseis y Otras Infecciones.
- Enfermedades hipertensivas.
- Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo.

La relación anterior muestra las diferentes enfermedades que se presentan con más frecuencia en el Distrito. La información está basada en datos proporcionados por la DIRESA y el CLASS de Ocobamba, donde se observa que las enfermedades con más incidencia son las Infecciones Agudas Respiratorias, conocidas como IRAS en una gran cantidad de personas, seguida por las enfermedades de trastornos diversos (paroxísticos, glándulas endocrinas, de tejidos blandos, conjuntiva, órganos genitales femeninos, afectivos, de los plexos nerviosos, raíces, del parpado, aparato lagrimal) en tercer lugar esta las enfermedades del sistema digestivo donde está incluido las diversas enfermedades gastrointestinales con un buen numero de personas afectadas. Esto nos indica que las enfermedades respiratorias son la de mayor incidencia en la zona.

III. 9.-ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

El Distrito de Ocobamba tiene como principal actividad económica la agricultura, la pecuaria y la actividad comercial e industrial en menor grado .Se dedica al cultivo

y a la crianza de animales mayores y menores, debido a las buenas condiciones climáticas y calidad del suelo apto para este tipo de actividades, el comercio y el servicio de transporte en menor medida siendo incipiente y prometedor en la zona; la reducida industria se dedica a la transformación de productos lácteos, maderera y otros. La mayor cantidad de producción está destinada para el autoconsumo sin embargo algunos pobladores lo comercializan en la feria local. La papa es el principal cultivo, seguido del maíz, el frijol, las arvejas, cebada, trigo, frutales y hortalizas; la producción pecuaria se basa en la crianza de animales mayores como el porcino, el vacuno criollo y en algunos casos mejorado, también esta la crianza de animales menores como cuyes, aves de corral, su producción en la mayoría de casos se orienta al auto consumo, una minoría es comercializada en la feria local, en Andahuaylas y Ayacucho.

Los productores de la zona vienen trabajando con técnicas de producción mecanizadas, en su mayor parte porque existe el apoyo de la Municipalidad de Ocobamba que posee un tractor y técnicos tanto en agricultura como en la parte pecuaria. En la zona se utiliza poco abono inorgánico siendo de alguna forma una ventaja para el cultivo de papas nativas y productos orgánicos pero a pesar de ello todavía las técnicas de cultivo son inadecuadas durante la pre y post-cosecha, lo que provoca una baja calidad y poca producción haciendo que la oferta de los productos sean bajos y la producción mayormente alcance para el autoconsumo, esta poca producción de los cultivos hace que las familias no aprovechen al máximo los terrenos que les permita incrementar sus ingresos con productos de buena calidad y obtener mayores beneficios por la venta de los productos provenientes de los campos de cultivos.

Entre las otras actividades podemos observar que existen establecimientos pequeños con venta de abarrotes, productos de primera necesidad distribuidos principalmente en el barrio central.

Otra actividad presente es el transporte que moviliza los productos y a los habitantes a diferentes destinos. Los servicios de hospedaje y comida también están presentes en el distrito, en menor porcentaje por las condiciones existentes.

Ingreso Estimado de la Población:

En relación a los ingresos de la población y con fines de simplificación, es posible agruparlos en tres categorías, las que en cierta manera se halla asociado con el lugar de residencia del poblador Ocobambino y cuyos ingresos referenciales son como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 07:

INGRESO PROMEDIO EN LA ZONA DEL PROYECTO.

GRUPO.	INGRESO PROMEDIO MENSUAL.
Administración. Publica.	1600 a 1,800 Nuevos Soles.
Enseñanza y eventuales.	650 a 1,200 Nuevos Soles.
Agricultores y otros.	150 a 300

Fuente: Taller Participativo. Elaboración Facilitador Junio 2010.

1. Actividad agricola

Se identificó cultivos como son el maíz la papa el frijol, haba, trigo, cebada, tarwi, hortalizas, arveja, zapallo, calabaza, algunos frutales.

2. Actividad Pecuaria

La ganadería se alimenta de la agricultura, donde los animales después de las cosechas entran a consumir los restos de la cosecha, en la zona predominan los ganados vacunos, ovinos, porcinos, equinos y algunos de ellos son mejorados. Así mismo se crían animales menores como: Cuy, conejo, gallinas, patos, entre otros.

3. Minería.

Existen muy escaso aprovechamiento de esta actividad ya que en la zona no hay indicio de minerales pero esto se debe a que no se ha hecho estudios al respecto.

En base a prospecciones geológicas mineras, se puede concluir que existen áreas con buen potencial para dicha actividad pues recientemente empresas mineras se han interesado en la comunidad por lo que se presume la presencia de algún mineral de importancia.

4. Recursos Arqueológicos Turísticos y Forestales.

El Distrito de Ocobamba cuenta con escasos restos arqueológicos ubicados en dos barrios de Distrito, pero si cuenta con paisajes impresionantes y lugares aptos para la práctica de deportes de aventura que debiera ser más promovida. Aparte de que poseen un sin número de paisajes muy atractivos siendo estas áreas propicias para la práctica del ecoturismo y el turismo de aventura, el Distrito de Ocobamba posee áreas forestadas y reforestadas tales áreas deben ser manejadas debidamente para su conservación y proliferación.

En cuanto a los recursos forestales se encuentra varias zonas forestadas por PRONAMACHS: De acuerdo con el Gobierno Regional existen muchas áreas aptas para este fin, las cuales deben ser aprovechadas y así contribuir a la mejora del medio ambiente. De igual manera se debe capacitar para sensibilizar a la población de la importancia del cuidado de los bosques y erradicar la costumbre de la quema de pastos aun arraigada en estas zonas.

III.10.-ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLITICA.

El distrito está constituido por familias campesinas con un origen común, una misma cultura, lengua, religión, actividades productivas y de comercio. Elementos sobre los cuales han establecido su propia dinámica de organización y relaciones sociales y económicas, sin romper vínculos legales y políticos, regulares con el estado. El distrito de Ocobamba, está conformado por Comunidades Campesinas, con existencia legal y reconocimiento como persona jurídica. Su estructura organizacional se rige por la Ley de Comunidades Campesinas N° 24656, el Estatuto de Comunidades Campesina y su Reglamento Interno.

1. Asamblea Comunal:

La Asamblea General o Comunal, es la reunión de todos los comuneros que están debidamente empadronados y residen dentro de la comunidad, vienen a ser la máxima autoridad. En la Asamblea General toman acuerdos fundamentales para la gestión comunal.

La Junta Directiva, está conformada por un presidente que es el representante legal, un vicepresidente, tesorero, secretario, fiscal y vocales. Es elegida por un periodo de dos años, mediante voto directo cargo por cargo; asume la representatividad y es responsable del gobierno del Distrito. Los directivos pueden ser reelegidos de acuerdo al desempeño de sus funciones.

2. Teniente Gobernador:

El teniente gobernador es el representante del gobernador a nivel local. Es elegido en asamblea comunal y ratificado por su inmediato superior, el gobernador del Distrito. Entre sus funciones está velar por la tranquilidad de la comunidad y resolver problemas causados por abigeato y traspaso de linderos. Trabajan en coordinación con las demás autoridades locales.

3. Agente Municipal:

Es un órgano de coordinación y representa a la Municipalidad. Apoya al fortalecimiento de una red local y representa al gobierno local en su jurisdicción.

Al igual que las demás autoridades, el agente Municipal es elegido en asamblea y luego ratificado por el Alcalde Distrital. Entre sus funciones está gestionar la ejecución de obras en la comunidad y otros. En el Distrito se tiene como representante y auxiliar a los comuneros.

4. Comités Funcionales:

Las organizaciones de base y/o comités funcionales son formas de organización para atender los problemas comunes de subsistencia y seguridad física. En el Distrito de Ocobamba existe quince barrios y todos ellos poseen sus comités funcionales organizados y que coordinan en conjunción las diferentes actividades y problemas que se presentan.

APAFAs: Las asociaciones de padres de familia son organizaciones independientes que poseen una junta directiva conformada por un presidente, un vicepresidente, vocal y tesorero. Coordinan con las autoridades locales y el

profesorado la gestión de proyectos y donaciones en beneficio de las Instituciones Educativas a las que representan, velan por el buen desempeño de las actividades escolares, supervisan la asistencia de los profesores y coordinan las labores de mantenimiento de la infraestructura de las Instituciones Educativas, obtienen fondos de los padres de familias por medio de las actividades que realizan y en la matrícula.

Comedor Popular: Su función consiste en suministrar a la población usuaria una alimentación variada y balanceada, que le aporte por lo menos el 35% de los requerimientos nutricionales diarios; contribuyendo al buen estado nutricional de los mismos y al cambio de hábitos alimentarios.

Vaso de Leche: Los comités de vaso de leche son organizaciones que dependen y actúan bajo supervisión del Municipio de Ocobamba es por ello que los quince barrios se reúnen para coordinar en conjunto con el Municipio. El Programa Vaso de Leche es un Programa Social creado para proveer apoyo en la alimentación a través de la entrega de una ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra.

Programa JUNTOS: Los comités del programa JUNTOS coordinan con representantes del programa para reunir a los beneficiarios y coordinar acciones que se harán en conjunto así también hacer cumplir los acuerdos a los que se lleguen, los miembros de su junta directiva de cada barrio_ Este programa tiene por misión contribuir al desarrollo humano y al desarrollo de capacidades especialmente de las generaciones futuras, orientando su acción a romper la transferencia intergeneracional de la pobreza, mediante incentivos económicos que promuevan y apoyen el acceso a servicios de calidad en educación, salud, nutrición e identidad bajo un enfoque de restitución de esos derechos básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los actores sociales de la comunidad.

Comité de JASS: o Juntas Administradoras de Saneamiento, asumen la Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de los servicios en cada barrio y velan por el cumplimiento del pago de la cuota familiar de los usuarios y otros ingresos que puedan generar. Durante la intervención participan conjuntamente con la población y en coordinación con el Municipio Distrital en los procesos de capacitación para la gestión de los servicios de saneamiento y en educación sanitaria.

IV. INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACION

IV 1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE PROYECTO:

- 1. Definición del Problema:** El problema ha sido definido con la participación de varias entidades, como el Municipio de Ocobamba, con la oficina Municipal de Promoción Empresarial (OMPE), el PRONAMACHCS, CARITAS Abancay, el Ministerio de Salud, con el personal de la posta de Ocobamba, La parroquia del sector, el Ministerio del Interior, la Subprefectura. La formulación del proyecto lo realizaron los técnicos del Municipio distrital y el personal técnico de CARITAS Abancay conjuntamente con la Fundación RODE, lo que fue validado por los beneficiarios quienes se comprometen a participar activamente en la ejecución del proyecto.
- 2. Definición de componentes:** Los componentes han sido elegidos adecuadamente por el equipo técnico multiinstitucional que trabajo en la formulación del proyecto.
- 3. Indicadores:** El Proyecto cuenta con indicadores a nivel de propósito para las dimensiones de eficacia, eficiencia, no presentando indicador para viabilidad. Es necesario establecer metas anuales, tendentes a fijar la trayectoria deseada para los indicadores. De esta forma, se podrá establecer los criterios bases para el monitoreo y evaluación del Proyecto.
- 4. Medios de Verificación: Existen los apropiados.**
- 5. Reformulaciones:** Se reformulo el proyecto por decisiones técnicas en los siguientes rubros:
 - **Construcción de canales de riego.**-La construcción del canal de riego de Piscobamba baja estaba considerada para la ejecución en el segundo año, luego de las evaluaciones técnicas se programó la construcción de este canal en el primer año; porque este canal conduce el agua en una distancia aproximada de 1800 metros lineales hasta la ubicación del Reservoirio de Aguas Verdes, estos cambios han sido aprobados por la población.
 - **Promoción de un Centro de formación continuada.**- El centro de formación continua ha sido equipada al 100%, en el primer año porque se realizaron acciones de sensibilización. Los aportes efectivos se efectuaron en el segundo año: pago de personal, útiles, mantenimiento y registros.

- **Formulación del plan de acción de lucha contra la violencia familiar y el alcoholismo.**-Actividad reprogramada para el tercer año.
- **Estudio de la problemática social, cultural, económica y política de la mujer campesina.**-Actividad reprogramada para el tercer año.
- **Aumento de la superficie arbolada.**- Se cambió las especies de árboles proyectadas que era el ciprés (*Cupressus sempervirens*) por eucalipto (*Eucalyptus globulus Labill*) y el chacacomo (*Escallonia resinosa*) y kiswar (*Buddleja incana*) por aliso (*Alnus glutinosa*). También se cambio los cítricos identificados al inicio del proyecto como es: limon (*Citrus limon (L.) Burm*) y naranja (*Citrus sinensis*) por arboles de chirimoya (*Annona cherimola Mill*).

IV.2.IMPACTO (Efectos)

FIN (Objetivo de Desarrollo)

Disminución del nivel de pobreza de las comunidades de: Huancayo bajo, Soccos, Piscobamba baja, Carhuayaco bajo, Esmeralda, Sarahuarcay, Umaca, Primero de mayo, Ocobamba, Manzanapata -en Challhuani-; Microcuenca de Ocobamba Baja.

PROPOSITO (Objetivo del Proyecto)

Mejorar la calidad de vida de las comunidades de la Microcuenca de Ocobamba Baja.


Pregunta Principal:

¿En qué medida la intervención de CARITAS Abancay ha generado cambios en la población beneficiaria de la micro cuenca de Ocobamba baja?

En el resultado de las encuestas un 40% de las personas entrevistadas reconocen que la intervención de CARITAS ha generado muchos cambios, un 33% mensuran que esos cambios son en una proporción regular.

Grafico 01:

PORCENTAJE QUE RECONOCE HABER IDENTIFICADO CAMBIOS

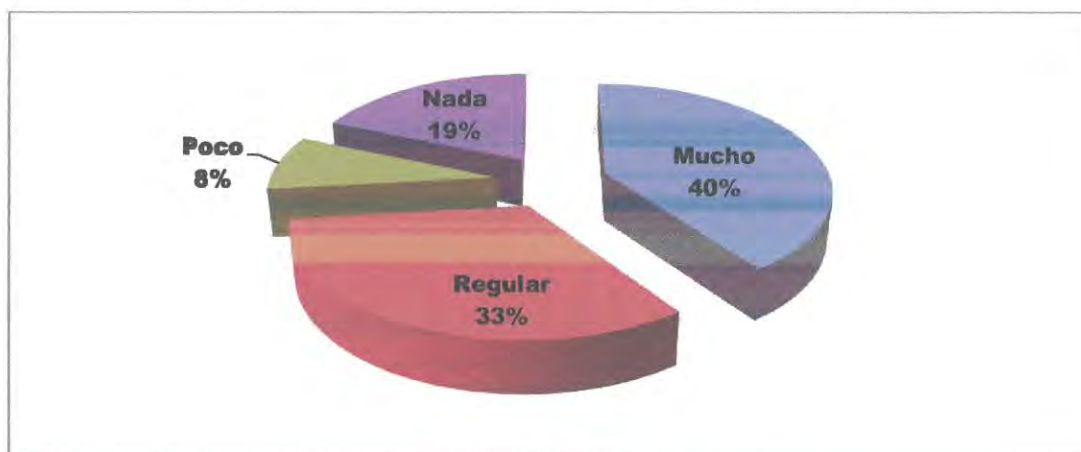

Fuente: Encuestas equipo consultor externo. Junio. 2013

Preguntas secundarias:

1. ¿Se llegó a cumplir el FIN (Objetivo de Desarrollo)?

A la revisión del expediente técnico del proyecto "Mejora de la calidad de vida de las comunidades de la microcuenca de Ocobamba baja", se observa que el FIN lo definen como la Disminución del nivel de pobreza de las comunidades de la zona de intervención.

Desde el inicio de la elaboración del proyecto este FIN se cotejó con los Objetivos del Milenio como expresa el documento. Se conoce que esta declaración se trabajó en el año 2000 en la ciudad de New York, bajo el auspicio de las Naciones Unidas con la participación 191 países quienes se comprometen a incrementar el esfuerzo mundial para reducir la pobreza, sus causas y manifestaciones.

La Declaración del Milenio compromete a los países a abordar ocho objetivos con metas cuantificables, que son los siguientes:

- Erradicar el hambre y la pobreza (objetivo 1)
- Lograr la educación primaria universal (objetivo 2)
- Corregir las desigualdades de género (objetivo 3)
- Reducir la mortalidad infantil (objetivo 4)
- Mejorar la salud materna (objetivo 5)
- Combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades (objetivo 6)
- Garantizar la sostenibilidad del medioambiente (objetivo 7),

- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo aumentando la cooperación internacional (objetivo 8).

Por lo evaluado el proyecto contribuye a este compromiso en los siguientes objetivos:

Objetivo 1.- Erradicar el hambre y la pobreza:

El segundo resultado del proyecto es "Mejora de las condiciones de producción agraria", planteando como una primera actividad la introducción del cultivo de Maíz morado y mejorando la producción del frejol. Una segunda actividad es la mejora de la infraestructura de riego, en base a la construcción de canales de riego y reservorios nocturnos, así como el apoyo a la gestión idónea del proceso productivo agropecuario. Todas estas actividades tiene como tema transversal la expansión de capacidades técnicas en base a la capacitación.

La suma de las acciones contribuye a la erradicación del hambre como meta primordial y a la pobreza por la venta de los excedentes de la producción.

Objetivo 6.- Combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades:

Se observa que, si, aporta la ejecución del proyecto a este objetivo del milenio, porque con el resultado de "Mejora de las condiciones de saneamiento básico de la población", en base a los indicadores de construcción de letrinas para mejorar la salubridad y prevenir enfermedades gastrointestinales.

La población en forma general define la pobreza como la falta de comida, ropa, alojamiento y agua potable, o sea aquellos elementos físicos y de infraestructura que determinan la calidad de vida de un individuo o grupo, también incluyen aspectos como el acceso a la educación, el trabajo, así como el respeto a la comunidad.

En el marco de estas dos definiciones, conceptualizamos la pobreza como la privación de los bienes considerados como imprescindibles para cubrir las necesidades básicas del hombre. Sin embargo resulta un concepto relativo, pues para algunos vestirse puede significar una necesidad básica mientras que otros lo consideran como un lujo.

Por lo que no se puede definir el cumplimiento con una certeza aguda en una medición cuantificable de este FIN, porque el concepto de pobreza está constantemente cambiando a medida que el tiempo transcurre, pues cada vez se viene considerando otros aspectos como necesarios, y aquellos bienes que en una primera instancia fueron necesarios, pasa un tiempo y dejan de serlo. También

ocurre que cada comunidad, cultura o sociedad posee sus propias consideraciones de necesidades básicas, por lo tanto los conceptos de pobreza también varían

2. ¿Se logró alcanzar el Objetivo del Proyecto (PROPOSITO) del proyecto?

Para una mejor evaluación de la calidad de vida citamos la definición de la OMS, "la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno".

Desde esta perspectiva podemos decir que el concepto de calidad de vida en términos subjetivos, surge cuando las necesidades primarias básicas (salud, educación, ambientales, organización, entre otras) quedan satisfechas con un mínimo de recursos, lo que ocurrió con la intervención de CARITAS Abancay, como manifiestan los beneficiarios del proyecto.

Un 76% de entrevistados manifiestan que han mejorado su calidad de vida, porque han mejorado sus condiciones de saneamiento básico, por la instalación de letrinas.

Un 32% manifiestan que han mejorado su calidad de vida porque han expandido sus conocimientos asistiendo a los diferentes módulos de capacitación sanitaria y del sistema de abastecimiento de agua potable.

El 59% dice, que mejoro su calidad de vida porque puede diversificar su alimentación con el consumo de frijol.

Un 13% de la población muestreada reconoce que al mejorar su medio ambiente mejora su calidad de vida.

Un 11% de los encuestados y 25% de los entrevistados manifiestan que mejoro la organización en la comunidad por lo que mejoro su calidad de vida.

CONCLUSIONES:

TEMA PRODUCTIVO

1. La ejecución del proyecto contribuyo a disminuir la pobreza en la zona de intervención y cumplió la proyección de converger con dos objetivos del milenio. El objetivo 1: Erradicar el hambre y la pobreza y el objetivo 6: Combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades.

2. Se ha dinamizado la actividad productiva agrícola, generando ingresos económicos por la venta de productos excedentes en el cultivo del frijol.

3. El impacto alcanzado por CARITAS es bueno y positivo porque se ha logrado contribuir a la disminución de la pobreza e incremento de calidad de vida, como manifiestan los pobladores y sus autoridades.

TEMA AMBIENTAL

1. Se ha generado cambios a nivel de salubridad por las instalaciones sanitarias y el buen uso de los mismos.

2. La población reconoce que mejoro su calidad de vida por la intervención de CARITAS Abancay. Debido a que tienen una mejor condición de saneamiento básico por la instalación de Letrinas y las capacitaciones realizadas en temas como: abastecimiento de agua potable, reconocen como una acción útil la cloración del agua.

TEMA ORGANIZACIONAL

1. Los pobladores que han participado activamente en la ejecución del proyecto manifiestan haber fortalecido la organización dentro de agrupaciones.

SUGERENCIAS:

1. Una forma clásica de definir el FIN en los proyectos es generalmente enfocado a la disminución de la pobreza. Se sugiere definir el marco teórico de pobreza, para trabajar en minimizar esta y para que las evaluaciones sean más mensurables.
2. Igualmente delimitar la teoría cuando se desea trabajar en la mejora de calidad de vida ya que este concepto es muy amplio y multivariado.

LECCIONES APRENDIDAS:

1. El proyecto por los resultados encontrados y por la manifestación de los involucrados a generado cambios sustanciales en la población participante, logrando un involucramiento de las autoridades, este tipo de experiencias se debe replicar.
2. Es buena idea cotejar objetivos del proyecto con otros de mayor envergadura como fue el caso de los objetivos del milenio, ya que este hecho mejora las alianzas estrategias con instituciones que trabajan estos temas.
3. Desarrollar el proyecto con un enfoque productivo, de salubridad y ambientales, fortaleció la participación de la mujer ya que un pensamiento natural femenino es garantizar la calidad de vida de las generaciones venideras.

IV.3.PERTINENCIA (Problemas y Necesidades)

Pregunta Principal:

¿En qué medida el proyecto es pertinente en relación con el contexto del sector, las necesidades que se deben de satisfacer y los problemas que se deben solucionar?

En la evaluación se encontró que para la identificación de necesidades y problemas que sirvió como base para la formulación del proyecto, participaron directivos de las 10 comunidades involucradas en el proyecto; así como diferentes instituciones que trabajan en la zona en los diferentes temas que aborda el proyecto.

Esta acción de generar alianzas estratégicas que promovió CARITAS desde el inicio del proyecto hace que sea pertinente el proyecto porque se adapta a las prioridades de la zona de intervención.

Además el proyecto está en concordancia con los objetivos del milenio como se explicó.

Preguntas Secundarias:

Pregunta Primera

¿Cuán congruente es el proyecto con las prioridades establecidas por las políticas nacionales y sectoriales?

RESULTADO 1:

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO DE LA POBLACIÓN:

Sí existe congruencia, con las prioridades establecidas a nivel nacional, regional y local. Para sustentar lo manifestado se cita los siguientes documentos.

A nivel nacional:

- La Ley N° 26338, se emitió la Ley General de Servicios de Saneamiento de fecha 24 de julio de 1994, la misma regula la prestación de los servicios de saneamiento en los ámbitos rural y urbano.

A nivel Regional:

- Ordenanza Regional que aprueba el Plan De Acción Ambiental Regional de Apurímac al 2015, la Agenda Ambiental Regional de Apurímac 2007-2009 y las Agendas Ambientales Locales de las Provincias de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau. Ordenanza Regional No. 026 - 2007 GR APURIMAC.- Se aprueba EL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

REGIONAL DE APURIMAC AL 2015, a nivel de objetivos estratégicos, líneas de acción y responsables de ejecución, como marco de referencia para las acciones a corto plazo y que, como anexo, forma parte de la presente Ordenanza Regional. Del mismo modo se aprueba LAS AGENDAS AMBIENTALES LOCALES DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAES, CHINCHEROS, COTABAMBAS Y GRAU, en el marco del Plan de Acción Ambiental Regional de Apurímac al 2015, en términos de actividades, indicadores de resultados y responsabilidades de ejecución y coordinación concertada, los cuales son de cumplimiento obligatorio en el marco de las competencias sectoriales y municipales bajo el principio de subsidiariedad, cuyos contenidos, como anexos, forman parte de la presente Ordenanza Regional. La cual se encarga a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la ejecución de actividades y promoción del Plan de Acción Ambiental y Agenda Ambiental Regional de Apurímac, con participación de los sectores público y privado y Gobiernos Locales, en el marco de sus competencias.

- En el Gobierno Regional de Apurímac, existe una Dirección Regional de vivienda, construcción y saneamiento que tienen entre sus funciones principales el de Fortalecer al Gobierno Regional Apurímac, y sus instancias desconcertadas, en su rol de liderazgo a nivel regional, que se concreta en el desarrollo de las funciones de planificación, concertación, normatividad, gestión financiera y supervisión de proyectos de saneamiento ambiental básico rural; cuyo Objetivo General es: Contribuir a mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de la población apurimeña a través de la ampliación de la cobertura, con servicios integrales y sostenibles en servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas, asegurando que los actores institucionalicen y se apropien del modelo de intervención integral a nivel local y regional.

A nivel Local:

- Ordenanza Municipal que aprueba La Política Ambiental Local, Plan de Acción Ambiental Local y Agenda Ambiental Local de la Provincia de Chinchero, ordenanza Municipal N° 021-2008-MPCH-AL.- Mediante la cual se aprueba la política Ambiental Local, Plan de Acción Ambiental Local y Agenda Ambiental Local de la provincia, contenida en el anexo, que forma parte de esta ordenanza, así mismo promueve la implementación participativa del Plan de Acción Ambiental aprobado y la Agenda Local aprobada en esta ordenanza, por parte de la Municipalidad Provincial, las instituciones y organizaciones de la sociedad, sobre la base de una gestión ambiental compartida. Esta se encarga a la Comisión Ambiental el cumplimiento de sus lineamientos.

RESULTADO 2:

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN AGRARIA

La congruencia encontrada fue alta para este resultado, porque se trabajó conjuntamente con la Dirección Agraria del Gobierno Regional de Apurímac, que cuenta con una dirección de Infraestructura de Riegos, que está encargada de promover y ejecutar proyectos de irrigación, manejo y conservación del recurso hídrico y suelo, participando en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas nacionales. También se coordinó con la dirección de Promoción Agraria que facilita a las organizaciones los mecanismos y estrategias de producción y comercialización con la finalidad de mejorar la producción, productividad y así mismo elevar la rentabilidad y competitividad, con bajos costos de producción, productos de calidad, mercados agrarios fortalecidos, desarrollados y organizaciones modernas y eficientes.

Se realizó coordinaciones con el Ministerio de Agricultura a través de SENASA "Servicio de Sanidad Agraria". Quienes valoraron el programa "de suma importancia y prioritario" y que participaron en los talleres de capacitación e implementación de actividades agrícolas contempladas.

RESULTADO 3:

MEJORA MEDIO AMBIENTAL

Este resultado se trabajó con el apoyo del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos PRONAMACHCS quien intervino en las actividades de formación, implantación de viveros, protección de manantes/fuentes de agua, instalación de zanjas de infiltración y procesos de forestación.

RESULTADO 4:

POBLACIÓN ORGANIZADA PARTICIPA DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y CONOCE SUS DERECHOS.

Para alcanzar las metas en los indicadores de Formación para la participación civil en procesos de desarrollo y la capacitación en materia de lucha contra el maltrato familiar y alcoholismo, trabajaron en alianzas estratégicas con diferentes instituciones como:

- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –RENIEC- institución que participo en labores de capacitación comunitaria y actividades definidas en el proyecto.
- También participo en el trabajo de este resultado la Parroquia Santiago Apóstol de Ocobamba cedió un local para hacer posible la puesta en marcha de un “Centro de Formación Continuada”.
- Además intervino la Defensoría Municipal del niño/a y el adolescente DEMUNA quienes brindaron apoyo técnico al trabajo que los promotores de Derechos Humanos (Formados a lo largo del Programa) desarrollaron en dicho centro, así como en las diferentes capacitaciones en materia de lucha contra el maltrato familiar y alcoholismo.
- Las instituciones Educativas como entidades de formación fomentaron la participación de los padres de familia en las diferentes actividades de capacitación.
- La policía Nacional del Perú, Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo apoyaron en la lucha contra el maltrato familiar y el alcoholismo.
- La participación de la Posta de Salud de Ocobamba fue determinante en las diferentes capacitaciones de promotores y la misma población.

Pregunta segunda:

¿Se ha tenido en cuenta, en la concepción del proyecto a otras instituciones locales que están trabajando en forma similar?

Si se tomó en cuenta la participación de otras instituciones. Existen convenios firmados entre CARITAS Abancay y las siguientes instituciones:

- La Dirección Agraria del Gobierno Regional de Apurímac, institución que reconoció la labor de desarrollo social en el área de intervención y avaló la iniciativa presentada.
- La municipalidad Distrital de Ocobamba solicito sean ejecutadas las actividades del programa en su jurisdicción y participo casi en todas las actividades.
- El Ministerio de Agricultura con su organismo a través de SENASA “Servicio de Sanidad Agraria”, valoró el programa “de suma importancia y prioritario” y

participio en las capacitación e implementación de actividades agrícolas contempladas en su programa nacional.

- El Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos PRONAMACHCS intervino en las actividades de formación, implantación de viveros, protección de manantes/fuentes de agua, instalación de zanjales de infiltración y procesos de forestación.
- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
- La Parroquia Santiago Apóstol de Ocobamba.
- La Defensoría Municipal del niño/a y el adolescente DEMUNA.
- La Asociación de Padres de Familia APAFA de las diferentes Instituciones Educativas secundaron las actividades proyectadas en beneficio de sus hijos.
- La Municipalidad Distrital de Ocobamba.
- Policía Nacional del Perú.
- Ministerio Público.
- Defensoría del Pueblo
- Posta de Salud.

Pregunta tercera:

¿Los pobladores de la zona de intervención han participado en la concepción del proyecto?

Los entrevistados manifestaron que los pobladores participaron activamente en la concepción del proyecto, motivados por CARITAS Abancay.

Los señores de CARITAS desde un inicio han organizado reuniones de coordinación con todo el pueblo y las autoridades para hacer este proyecto... Por eso reconocemos que el trabajo realizado es una idea del pueblo...

Pablo Alberto Aquise Allende - Gobernador.

El proyecto se ha iniciado cuando yo era regidora... recuerdo que los técnicos de CARITAS han venido al municipio para exponer la idea, también recuerdo que se los profesionales de CARITAS pedían se invite a la población para hacer el proyecto ... desde ese momento es que la población en su conjunto ha participado en las acciones de desarrollo que CARITAS ha hecho por nuestro pueblo.

Luisa Genara Alvarado Pérez - Regidora periodo 2007- 2010

CONCLUSIONES:

1. El proyecto muestra un elevado grado de pertinencia en cuando a su contenido de intervención. Los conceptos trabajados, ocupan la agenda política a nivel internacional (Objetivos del Milenio), Nacional así como a nivel regional y local.
2. Los problemas identificados han sido realizados en base a las necesidades de los pobladores de la zona, que en todo momento participaron activamente en la ejecución del proyecto.

3. Las entrevistas con los diferentes representantes de las instituciones y con los participantes en las actividades han evidenciado que se han adoptado de buena manera lo planeado en el expediente técnico, con consecuencias de calidad que muestran los resultados de varias actividades.
4. Se realizó la identificación, formulación y ejecución del proyecto en concordancia con trabajos que realizan las diferentes instituciones en la zona, en los temas que abarca el proyecto.
5. El montaje institucional del Proyecto realizado por CARITAS Abancay ha demostrado un suficiente nivel de coordinación y aportes a la ejecución a lo largo de la implementación del proyecto. Por lo que se facilitó la integración entre los sectores pero no suficientemente como para decir que fue una articulación intersectorial. Las iniciativas intersectoriales han sido limitadas aunque, en los sectores donde se han manifestado, han producido resultados interesantes.
6. Se puede decir que los acercamientos institucionales producidos por las actividades intersectoriales liderada por CARITAS Abancay, son uno de los aciertos más importantes del proyecto ya que han mostrado las rutas para producir las "arquitecturas institucionales" hacia la promoción de la multidimensional de la cohesión social, en una visión conjunta de Desarrollo sin duplicidad de actividades que generalmente perjudican en los tiempos de los productores.

SUGERENCIAS:

1. En las futuras intervenciones se aconseja continuar con la metodología de intervención utilizada, porque la participación de instituciones de una consolidada experiencia en la zona de intervención aportan bastante en la ejecución del proyecto que es necesario para avanzar en dirección a una mayor pertinencia no sólo conceptual sino también de las propias acciones impulsadas por los proyectos de CARITAS Abancay.
2. El enfoque participativo y de género utilizado desde el principio es conveniente, y le otorga un suficiente grado de flexibilidad en la ejecución del proyecto, además permitió una mayor confluencia entre las necesidades y los insumos del programa. Por lo que se sugiere seguir trabajando con estos enfoques.
3. Identificar en forma más precisa y con un análisis de necesidades los intereses estratégicos de varones y mujeres, ya que estos no son iguales, porque las mujeres priorizan necesidades diferente a los varones.

LECCIONES APRENDIDAS:

1. El identificar en forma participativa los objetivos del proyecto y plantear resultados en base a una visión holística favorece a la consecución de metas.
2. Los acuerdos cooperativos horizontales conocidos como alianzas estratégicas generadas por CARITAS Abancay, es una fortaleza en la ejecución del proyecto, debido a que ofrecen múltiples ventajas como: Las sinergias al combinar los objetivos entre las instituciones que favorece el alcance de objetivos. Las acciones son más rápidas y se aprovechan mayores oportunidades de desarrollo.

IV.4.EFICACIA (Objetivos)

Pregunta Principal:

¿En qué medida se ha logrado alcanzar los resultados planteados en el proyecto?

RESULTADO 1:

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO DE LA POBLACIÓN:

Analizando la actividad 1.1. *Implemento de las instalaciones sanitarias*, se puede concluir cuantificablemente que se sobrepaso el objetivo ya que el proyecto contemplaba la instalación de 332 letrinas y se pudo ver que existe 432 letrinas en funcionamiento lo que indica que supera los objetivos en un 30,12%.

La actividad 1.2. *Programa de CAPACITACIÓN en educación sanitaria y fortalecimiento de las JASS (Junta de administración de los servicios de saneamiento)*, también tiene un porcentaje superior a lo proyectado este valor es de cuatro veces más de lo proyectado.

Se proyectó impartir 3 módulos por cada evento, donde se asumió la asistencia de 120 miembros por cada módulo, que hace un total de 360 personas con una distribución porcentual del 50% de varones y 50% de mujeres.

Se realizó los tres módulos por cada evento alcanzando los objetivos. Asistieron en total 435 varones y 214 mujeres haciendo un total de 649 personas. Del análisis de estas cantidades podemos manifestar que se excedió la meta en un 80,28% de lo planificado, pero no se cumplió con el porcentaje de asistencia entre varones y mujeres por que el 33% de participantes fue mujeres y el 67% varones.

RESULTADO 2:

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCION AGRARIA

Actividad 2.1. *Mejora de la producción agrícola*: 108 familias de las comunidades de: Huancallo bajo, Soccos, Piscobamba baja, Carhuayaco Bajo, Esmeralda, Sarahuarcay, Umaca, Primero de mayo, y Manzanapata introducen la producción del MAIZ MORADO, obteniendo una producción anual de 54 toneladas (6 por comunidad) en un total de 36 hectáreas sembradas. Estas mismas familias aumentan la producción de FRIJOL en 36 hectáreas, produciendo anualmente 72 toneladas (8 por comunidad) destinadas a su consumo y comercialización.

El resultado de la introducción de maíz morado y frijol se dio en las comunidades proyectadas, pero se amplió a otras más a solicitud de los productores esto ocurrió en la comunidad de Mitobamba, Jerusalem y Alianza. Los técnicos encargados de este trabajo evaluaron las condiciones de introducir a otras comunidades por aspectos netamente técnicos y las necesidades fenológicas de las dos especies en mención.

Como resultado se proyectó introducir maíz morado y frijol en 36 hectáreas de cada especie. En el informe final se halló que los resultados esperados se alcanzaron.

El segundo informe, agregado de monito reorientado a los resultados, precisa que en el segundo año no se trabajó este rubro, debido a problemas climatológicos.

De la evaluación ex post, se encontró que un 36% de los productores beneficiados, no han continuado con el cultivo de maíz, ellos manifiestan que es porque no han identificado mercado para comercializar este producto.

En caso del frijol sucede lo contrario los que dejan de cultivar maíz morado incrementa en el cultivo del frejol, también debido al mercado, porque este producto tiene mayor demanda.

Actividad 2.2. *Mejora de la infraestructura productiva*: Se culminó el proyecto con el logro del objetivo del expediente técnico. Se construyó 9,504 metros lineales de canal de riego que pasan por las comunidades de Umaca, Sarahuarcay, Soccos, Piscobamba y Esmeralda, beneficiando a 2256 personas.

También se constató que existen dos reservorios de agua para riego; uno denominado Aguas verdes en la comunidad de Piscobamba baja que se construye al segundo año de

ejecución del proyecto y el otro Manzanapata de la comunidad Alianza construido al tercer año.

Los pobladores reconocen y recuerdan las capacitaciones realizadas en temas de operación y mantenimiento de las infraestructuras de riego en un 35%.

Actividad 2.3. *Gestión idónea del proceso productivo agropecuario*: En lo referente a la formación de promotores agropecuarios, no se alcanzó con lo programado solo se informa que se han formado 35 promotores que es el 87,5%, esto debido al abandono de las personas que iniciaron el proceso de formación, por razones de trabajo o desinterés de ellos mismos. En lo referente al enfoque de género solo 5 mujeres concluyeron su formación de promotores agropecuarios, que es equivalente al 29,4% de lo programado.

En vista de que no se llegó a formar los 40 promotores, los técnicos de CARITAS Abancay al tercer año toman la decisión de elegir 8 productores innovadores para que reforzar sus conocimientos y formen parte del equipo de promotores agropecuarios. Decisión está que lleva a que se superen los resultados revistos.

Se ha equipado por completo a los promotores agropecuarios. Resultado alcanzado.

RESULTADO 3:

MEJORA DE LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES.

Actividad 3.1. *Aumento de la superficie arbolada*: Se alcanzó las metas previstas en número de plantas. Se tuvo pérdidas por razones del clima en el primer año, pero en los años siguientes fueron subsanadas.

Se amplió la instalación de viveros en otras comunidades como Soccos, Esmeralda, Mitobamba y Umaca. Decisión acertada ya que esta ampliación es por demanda y compromiso de parte de los pobladores.

En esta actividad se ha realizado muchos cambios por razones técnicas y a solicitud de los productores, uno de estos cambios es el reemplazar la producción de ciprés por eucalipto y el chachacomo y kiswar por aliso. Técnicamente el cambio del ciprés por el eucalipto es porque es una especie que tiene mayor utilidad para la construcción de viviendas, leña y rebrota al ser talado. En el caso de las especies nativas el aliso es un árbol que está en extinción en algunos lugares de la región, tiene mayor ventaja productiva frente a las dos especies reemplazadas, es un árbol de crecimiento rápido, pero de bajo rendimiento, la

madera es buena para el tallado por lo que se puede industrializar, una forma es la fabricación de utensilios de cocina, como combustible es muy bueno porque arde bien y no hace mucho humo por esta razón los pobladores buscan mucho este árbol para talarlo razón por la cual se encuentra en extinción.

En el concepto de incrementar la producción frutícola también hubo variaciones, se cambió las especies elegidas en la formulación del proyecto que son los cítricos (Limonas y naranjas) por chirimoyas, este cambio se debió a una buena observación por parte de los productores quienes identificaron que esta especie es más comercial y que tiene un precio aceptable y sin mucha fluctuación en el mercado.

Se construyó 33 hectáreas de zanjas de infiltración, trabajo que se realizó en coordinación con PRONAMACHS. Lo que favoreció el logro de resultados.

Actividad 3.2. *Protección de agua:* Se protegió un manantial por comunidad en las siguientes: Huancallo bajo, Soccos, Piscobamba baja Carhuayaco bajo Esmeralda, Sarahuarca, Umaca, Primero de Mayo, Ocobamba y Manzana pata.

Actividad 3.2. *Programa de capacitación en medio ambiente, y gestión de viveros frutícolas y forestales:* En este evento de capacitación asistieron un total de 22 mujeres y 139 varones, haciendo un total 161, personas que participaron. Supero a lo establecido en un 34,17%.

Para el Módulo de capacitación en viveros frutícolas y forestales, en total asistieron 154 productores de este total fueron 31 mujeres y 123 varones. Se sobre paso lo previsto en un 28,33%.

RESULTADO 4:

POBLACIÓN ORGANIZADA: Participa de los procesos de desarrollo y conoce sus derechos.

Actividad 4.1. *Formación para la participación civil en procesos de desarrollo: Las Campañas de sensibilización en desarrollo comunal y planificación participativa.-* Estas campañas se realizaron como se proyectó, en coordinación con los promotores de los derechos humanos, líderes/as, quienes fueron los actores en las campañas.

La campaña de sensibilización se dio todo el segundo año de ejecución del proyecto. Además se incluyó spot radial en temas de sensibilización para la participación activa en el

planeamiento del presupuesto participativo distrital.

Curso de formación de liderazgo. Que estuvo constituido de cuatro talleres con temas en: Liderazgo, presupuesto participativo, organización y gestión comunal, y técnicas de organización y gestión comunal. Con una asistencia de 30 personas de los cuales son 27 varones y 03 mujeres.

Capacitación en técnicas de organización y desarrollo local: Se han expuesto temas referidos a métodos de organización, desarrollo comunal, modelos de desarrollo y gestión comunal.

Capacitación en técnicas de organización y desarrollo local: Este módulo se realizó en el segundo año con el objetivo de formar líderes orientados a impulsar el desarrollo de sus comunidades. Se trabajó en la capacitación conjuntamente con las siguientes instituciones Municipalidad de Ocobamba, Centro de Salud de Ocobamba y el Juzgado de Paz Letrado. Estas instituciones reforzaron la realización del evento.

Los participantes por comunidad fueron los siguientes:

CUADRO 08:

NUMERO DE PARTICIPANTES EN LAS CAPACITACIONES

Comunidad	Varones	Mujeres	
Ocobamba	49	38	
Piscobamba	27	13	
Carhuayaco Alto	16	0	
Sarahuarcay	12	0	
Mitubamab	25	13	
Umaca	13	12	
Carahuayaco bajo	26	0	
Choccepuquio	20	0	
Soccos	15	13	
TOTAL	203	89	292

Formulación de planes de desarrollo comunal: Se ha llegado cumplir las metas. Se han realizado 10 planes de desarrollo comunal en la zona de intervención. Esta formulación de planes de negocio se hizo en forma participativa con la población, autoridades comunales y los alcaldes de los centros poblados. Los expedientes han sido revisados por cada una

de las autoridades comunales en los espacios democráticos "Asambleas Comunales". El 25% de estos planes han sido validados por la Municipalidad Distrital de Ocobambay, siendo insertados en el Plan del Distrito de Ocobamba.

Participación en el proceso de planeamiento y presupuesto distrital: Autoridades comunales de Piscobamba, Soccos, Umaca, sarahuar cay, Choccepuquio, Carhuayaco bajo, Carhuayaco alto, Esmeralda, Mitobamba y Ocobamba han participado en el presupuesto participativo del 2010. Logrando que se tome como referencia los planes de desarrollo comunal. Como consecuencia de este proceso se aprobó la elaboración y actualización del Plan de Desarrollo Distrital Concertado del Distrito de Ocobamba. En alianza con la municipalidad Distrital de Ocobamba, Caritas Abancay y la consultora Bioma que realizó la convocatoria y la elaboración del plan de Desarrollo Distrital donde participaron durante tres eventos 103 varones y 67 mujeres.

Promoción de un Centro de formación continuada: Se ha implementado al primer año, un Centro de Formación Continua con el equipamiento de 10 computadoras y mobiliario necesario para su funcionamiento.

El segundo año se firmó un convenio con el UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) de Chincheros para llevar a cabo un programa de capacitación de computación e informática en temas de: Windows, Internet, Word y Excel. Tuvo una duración de 4 meses, dándose inicio el 18 de enero y finalizando el 18 de abril del 2010. La asistentes reconocen el programa estaba de acuerdo a sus necesidad.

Inician 78 estudiantes de este total solo 32 fueron certificados por el Centro de Formación Continua - Parroquia Santiago Apóstol de Ocobambayla UGEL – Chincheros.

A la fecha junio 2013, este centro viene funcionando solo los fines de semana para atender especialmente a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas y a demanda de algunas instituciones que soliciten el uso de las computadoras.

Formación de promotores/as en derechos humanos: Se ha formado 87 promotores para este fin, fue en forma participativa y en asamblea en cada una de las comunidades se han identificado promotores/as defensores en Derechos Humanos.

CUADRO 09:**NUMERO DE PARTICIPANTES EN LAS CAPACITACIONES**

Comunidad	Varones	Mujeres	
Derechos humanos	12	3	
Violencia familiar	14	4	
Equidad de genero	14	4	
Valores y autoestima	11	5	
Roles y Funciones a Promotores de Derechos Humanos	14	6	
TOTAL	65	22	87

Capacitación que estuvo orientada a la mejora de las capacidades respecto a Derechos Humanos: Una vez fortalecidos los promotores/as han realizado acciones promocionales con el fin de disminuir los índices de la violencia e incrementar el respeto a los derechos y deberes como ciudadanos. Los contenidos desarrollados en este proceso de formación fueron los siguientes: Derechos Humanos, Violencia familiar, Equidad de género, Valores y auto estima, Roles y Funciones.

En el segundo año se firmó una alianza estratégica con el Juzgado de Paz Letrado de Ocobamba, con la finalidad de mejorar las capacitaciones. Se capacito 60 nuevos promotores/as de los cuales 35 fueron varones y 25 mujeres.

Cabe manifestar en el segundo año de intervención se realizó el equipamiento a los promotores defensores de derechos humanos de las 10 comunidades del Distrito de Ocobamba.

Estudio de la problemática social, cultural, económica y política de la mujer campesina: Esta actividad se postergo para ser realizada al tercer año de ejecución del proyecto, con mejor perspectiva porque el distrito de Ocobamba fue afectada fuertemente por la violencia política (subversión) y actualmente es afectada por el narco trafico hechos que repercuten considerablemente en las familias de las comunidades, especialmente a las mujeres quienes son las más afectadas, por todo ello se retrasó en realizar esta actividad.

El estudio mostro que el problema más agobiante en el maltrato familiar es por parte de los varones a las mujeres.

4.2. Capacitación en materia de lucha contra el maltrato familiar y alcoholismo.

Formulación del plan de acción de lucha contra la violencia familiar y el alcoholismo.

Esta acción se realizó al tercer año, esta decisión fue debido a que aún existe desconfianza en los habitantes de las poblaciones por la presencia del terrorismo en los años 80 al 90 y ahora por las acciones que realizan el narcotráfico.

Existe un Plan de acción de lucha contra la violencia familiar y el alcoholismo, elaborado por equipo consultor. Este Plan ha sido validado por la población, mediante talleres participativos y posteriormente se entregó al Municipio de Ocobamba.

Capacitación de funcionarios/as del estado en relaciones de género y cultura de paz:

Este módulo se ha desarrollado durante los tres años de duración del proyecto, un taller por año. Llegando a fortalecer las capacidades de 152 participantes.

La ejecución de este evento permitió que los funcionarios de diferentes instituciones públicas y privadas difundan las diferentes causas de la violencia familiar.

Módulo de capacitación en relación de género y cultura de paz a colectivos de riesgo:

Durante los tres años se han realizado 4 eventos, uno por cada año y dos el tercer año. Han participado 240 pobladores del área de intervención.

Formulación del plan de acción de lucha contra la violencia familiar y el alcoholismo:

Se pudo apreciar que se realizó esta acción en el tercer año, decisión está, porque primero se trabajó un diagnóstico de la problemática de la mujer, insumo que sirvió para elaborar el Plan de acción de lucha contra la violencia familiar y el alcoholismo.

Capacitación en lucha contra la violencia familiar y alcoholismo a colectivos de riesgo:

Durante el tiempo de ejecución del proyecto se realizó 04 eventos. Asistieron 140 varones y 82 mujeres. Todo esto en acción conjunta con el Centro de Salud de Ocobamba quien se ocupó de la atención Psicológica y de asesorías legales.

El segundo año se realizó acciones conjuntas con el centro salud, la Municipalidad distrital de Ocobamba y el Ministerio de Justicia.

Las autoridades manifiestan que se puede notar una disminución en la violencia familiar y el alcoholismo.

Haciendo un cuadro comparativo de cuando se instaló el juzgado a la actualidad los porcentajes de maltrato familiar ha disminuido considerablemente, lo cual como institución vulnera la funcionalidad del juzgado.

*Rosalinda Rafaele Cerro.
Jueza Letrada*

CARITAS ha trabajado de manera integral, se ha trabajado de manera coordinada, se ha formado comités de vigilancia que aún continúan trabajando de manera coordinada con las diferentes instituciones y si se ve que ha disminuido el alcoholismo y por ende el maltrato familiar.

*Cesar Ayvar Buendia
Alcalde de Ocobamba*

Módulo de capacitación en valores y autoestima a colectivos de riesgo: La evaluación interna manifiesta que en los tres años se han realizado 04 eventos. Con un total de asistencia de 135 varones y 66 mujeres en los cuatro eventos.

RESULTADO 5:

GESTION DEL PROYECTO

a. Identificación del Programa

En el tiempo de ejecución se tuvo contratos legales con las siguientes personas:

Nº	Nombres y Apellidos	CARGO
1	Leonidas David Pagaza Castillo	Ingeniero proyectista
2	Wilbert Lino Ballón Pinto	Ingeniero Proyectista
3	Nieves Peña Patiño	Educadora
4	María Luisa Sanchez Bautista	Responsable de Salud
5	Rodrigo Inga Huamaní	Técnico de campo
6	Sixto Inga Huamaní	Técnico de campo

Actividad 5.2. Gastos de Ejecución.

Concepto. Equipos para la formación:

Se verifico la existencia de un proyector multimedia Epson 58+2000 Lumin

Una cámara digital marca Sony N180-10.1 MP + 4 GB

Para el desplazamiento del personal técnico del proyecto en sus actividades de campo, monitoreo y supervisión, se verifico la adquisición de los siguientes medios de transporte:

Motocicletas:

DESCRIPCION	MARCA	PLACA	AÑO	SERIE
Motocicleta	YAMAHA	NG85030	2008	3GX104260
Motocicleta	YAMAHA	NG96443	2008	3GX105929
Motocicleta	YAMAHA	NG96106	2008	3GX105933

Camioneta doble cabina 4x4

DESCRIPCION	MARCA	PLACA	AÑO	SERIE
Camioneta Hi Lux	TOYOTA	PQX 142	2008	1KD7661664

El gasto del combustible fue de acuerdo a lo manifestado en el proyecto.

En la evaluación interna se precisa que los mantenimientos de la camioneta y las motos fueron trimestralmente.

El personal que trabajo en la ejecución del proyecto fue el siguiente:

Personal del Periodo octubre 2008 – setiembre 2009

Nº	Cargo	Nombres y Apellidos	Período		Remuneración mensual promedio en S/.	Remuneración mensual Misereor en S/.	Tiempo dedicación Proyecto
			De	A			
1	Coordinador	Carlos Antonio Casas Suarez	01/10/2008	30/09/2009	3082.0	3082.0	100%
2	Téc. Const. Civil	Federico Ovalle Ccarhuaslla	01/05/2009	30/09/2009	2680.0	2680.0	100%
3	Conductor	Felix Barazorda Arias	01/10/2008	30/09/2009	1876.0	1876.0	100%
4	Ing. Civil	Guido Montúfar Valdeiglesias	01/05/2009	30/09/2009	3082.0	3082.0	100%
5	Agente capacitador	Luz Marina Borda Oscco	01/10/2008	30/09/2009	1340.0	1340.0	100%
6	Agente capacitador	Mateo Soto Zúñiga	01/10/2008	30/09/2009	1340.0	1340.0	100%
7	Contadora	Luz Marina Portugal Sidla	01/10/2008	30/09/2009	1340.0	2680.0	50%
8	Secretaria	Prisca Huancavilca Llerena	01/10/2008	30/09/2009	804.0	1608.0	50%
9	Ing. Agrónmo	Wilbert Lino Ballón Pinto	01/10/2008	30/09/2009	3082.0	3082.0	100%

Personal del Periodo octubre 2009 – setiembre 2010

Nº	Cargo	Nombres y Apellidos	Período		Remuneración mensual promedio en S/.	Remuneración mensual Misereor en S/.	Tiempo dedicación Proyecto
			De	A			
1	Coordinador	Hernán Alarcón Gutierrez	01/10/2009	30/09/2009	3082.0	3082.0	100%
2	Téc. Const. Civil	Federico Ovalle Ccarhuaslla	01/10/009	30/09/2010	2680.0	2680.0	100%
3	Conductor	Felix Barazorda Arias	01/10/2009	30/09/2010	1876.0	1876.0	100%
4	Ing. Civil	Guido Montúfar Valdeiglesias	01/10/2009	30/09/2010	3082.0	3082.0	100%
5	Contadora	Luz Marina Portugal Siclla	01/10/2009	30/09/2010	1340.0	2680.0	50%
6	Agente capacitador	Miguel Quispe García	01/10/2009	16/08/2010	2680.0	1340.0	100%
7	Agente capacitador	Wiliam Acuña Ortiz	01/07/2010	30/09/2010	2680.0	2680.0	100%
8	Secretaria	Prisca Huancavilca Llerena	01/10/2009	30/09/2010	804.0	1608.0	50%
9	Ing. Agrónomo	Wilbert Lino Ballón Pinto	01/10/2009	30/09/2010	3082.0	3082.0	100%

Personal del Periodo oct 2010 – setiembre 2011

Nº	Cargo	Nombres y Apellidos	Período		Remuneración mensual promedio en S/.	Remuneración mensual Misereor en S/.	Tiempo dedicación Proyecto
			De	A			
1	Coordinador	Hernán Alarcón Gutierrez	01/10/2010	30/09/2011	3082.0	3082.0	100%
2	Téc. Const. Civil	Federico Ovalle Ccarhuaslla	01/10/2010	31/10/2010	2680.0	2680.0	100%
3	Téc. Const. Civil	Yuri Ruben Moreano Espinoza	01/11/2010	31/03/2011	2680.0	2680.0	100%
4	Téc. Const. Civil	Federico Ovalle Ccarhuaslla	01/04/2011	30/09/2011	2680.0	2680.0	100%
5	Conductor	Felix Barazorda Arias	01/10/2010	30/09/2010	1876.0	1876.0	100%
6	Ing. Civil	Rodrigo Inga Huamani	01/10/2010	30/09/2011	3082.0	3082.0	100%
7	Contadora	Luz Marina Portugal Sidlla	01/10/2010	31/09/2011	1340.0	2680.0	50%
8	Agente capacitador	María Luisa Sánchez Bautista	01/10/2010	31/12/2010	2680.0	1340.0	100%
9	Agente capacitador	Yimi Cáceres Gutierrez	01/01/2011	30/09/2011	2680.0	2680.0	100%
10	Secretaria	Prisca Huancavilca Llerena	01/10/2010	30/09/2011	804.0	1608.0	50%
11	Ing. Agrónomo	Florian B. Visaga Alvarez	31/01/2011	30/09/2011	3082.0	3082.0	100%
12	Ing. Agrónomo	Wilbert Lino Ballón Pinto	01/10/2010	31/12/2010	3082.0	3082.0	100%

La solicitud de aval fue realizada por la ONG RODE DE NAVARRA - ESPAÑA

Secundarias:

¿Es el propósito (Objetivo del proyecto) es lo suficientemente específico?

El objetivo del proyecto fue: "Mejorar la calidad de vida de las comunidades de la Microcuenca de Ocobamba Baja.

Fue suficientemente específico, porque las autoridades y la población reconoce que mejoro su calidad de vida.

¿Los indicadores y medios de verificación son adecuados?

La revisión de los indicadores y medios de verificación nos da como resultado que fueron los adecuados, porque se puede evaluar con relativa facilidad el proyecto.

CONCLUSIONES:

1. El proyecto ha sido eficaz por cuanto se han alcanzado todos los resultados previstos de forma adecuada y en los plazos establecidos. No habido factores que hayan dificultado el cumplimiento.
2. El objetivo del proyecto (Propósito), se ha logrado de modo satisfactorio.
3. El resultado 1; se sobre paso lo proyectado en un 30,12%, en lo referente al fortalecimiento de capacidades, siendo bien asimilada por los asistentes, en un 80,28% más de lo previsto.

Resultado 2; también se aprecia que se extendió el apoyo a otras comunidades en la introducción de nuevos cultivos.

En el caso del fomento del cultivo del maíz morado la meta se alcanzó en el primer año, para el segundo año bajo el área de cultivo debido a factores climáticos y mercado. Esta evolución no se pudo medir el logro del indicador de la actividad aumento de la producción de maíz morado, debido a que, el proyecto se ha elaborado entre los años 2006 al 2007, tiempo este que el valor comercial del maíz morado en el mercado era bueno. Estos precios de mercado tuvieron fluctuaciones en los siguientes años y durante la ejecución del proyecto bajo el precio por lo que los productores dejaron de cultivar en algunas zonas de intervención, pero se incrementó el cultivo de frijol.

En la construcción de la infraestructura se alcanzó los objetivos trazados. A la fecha de la evaluación externa se encontró que el reservorio de Aguas Verdes en su estructura está deteriorada considerablemente, por efectos geodinámicas de suelos deslizantes). Debido a estos deslizamientos la población de Esmeralda ha sido reubicada en otros terrenos más seguros. Por lo que no se puede atribuir responsabilidades de este hecho a la ejecución del proyecto.

Para la Gestión idónea del proceso productivo agropecuario, solo se llegó a cumplir con el 87,5% de lo planificado, pero para el segundo año se subsano.

4. Resultado 3, se alcanzó satisfactoriamente, incluso se superó lo programado para la actividad *Programa de capacitación en medio ambiente, y gestión de viveros frutícolas y forestales en un 34,17%*
5. Resultado 4, el resultado encontrado muestra que si se alcanzó lo programado.

La fortaleza que se tuvo es la firma de convenios con diferentes instituciones para la realización de muchos talleres de capacitación.

En todos los talleres de capacitación ejecutados se tuvo mayor asistencia de productores que lo previsto. No se tuvo asistencia de mujeres en proporciones equivalentes con los varones.

6. Resultado 5, se alcanzó en su totalidad.

SUGERENCIAS:

1. Es bueno trabajar por la búsqueda de la libertad financiera en las poblaciones intervenidas. En este caso fue en base al cultivo del maíz morado y el frijol. Se sugiere apoyos a comunidades, realizar con más precisión los análisis de mercado, para que la producción agropecuaria sea sostenible y aceptada en el mercado.
2. La formación de promotores garantiza la eficacia del proyecto ya que son los que trabajan directamente con los pobladores en los objetivos. Por lo que se sugiere seguir trabajando en la formación de promotores locales.
3. Seguir buscando la firma de convenios con diferentes instituciones de la zona de intervención para que el Centro de "Formación Continuada", utilice eficientemente sus instalaciones.
4. Cuando se tenga que elegir especies para incrementar la producción frutícola, se debe de realizar mejor la identificación de esta, reiteramos que es necesario que las especies elegidas sean aceptadas por la población, así como el mercado.
5. Seguir acompañando la ejecución de las actividades mensurables con un programa nutrido de capacitaciones. Debido a que esta acción garantiza satisfacer los objetivos del proyecto y su sostenibilidad.

LECCIONES APRENDIDAS:

1. La definición de calidad de vida en el desarrollo del proyecto ha sido parte de un concepto integrador que comprende todas las áreas. Como una proyección a la mejora de las condiciones de saneamiento básico (Social), así como a la mejorar de la producción agraria con la identificación de productos con más valor en el mercado y de mayor demanda (Económica), sin olvidar la mejora y protección del medio ambiente (ambiental), todo esto fue planteado identificando indicadores sociales que se han referido a condiciones externas relacionadas con la buena organización de la población.

Esta definición oriento el desarrollo del proyecto tuvo como respuesta la identificación de un principio organizador que puede ser aplicable para la mejora de una sociedad, sometida a transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y económicas permanentes.

2. Es importante resaltar que en el desarrollo del proyecto se ha identificado y realizado diferentes capacitaciones casi en todos los resultados proyectados. Estas actividades han constituido las mejores inversiones en el recurso humano y se han convertido en una de las principales fuentes de bienestar del poblador beneficiado.

3. Toda esta experiencia se convierte en un principio: "la capacitación es una poderosa herramienta en el proceso de construcción y profundización de un proyecto de intervención social, que funciona como puente de articulación entre la población y las instituciones con la finalidad de generar desarrollo".
4. Lo que realizó CARITAS Abancay durante el horizonte del proyecto es utilizar la capacitación como principio generador de capacidades humanas, empresariales, sociales y culturales. Este accionar de CARITAS fue proactiva, promotora de derechos e inteligente, en la práctica comunicacional para el desarrollo, que se debe inscribir con un modelo social, político y económico inclusivo y redistributivo, ligado a las mejores tradiciones históricas de la población de Ocobamba.

IV. 5. EFICIENCIA (Optimización)

Pregunta Principal:

¿En qué medida los recursos/insumos utilizados durante la intervención de Caritas se ha convertido en productos?

Evaluando el informe de auditoría externa realizada por la empresa auditora FLORES KONJA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS S.CIVIL DE R.L. de la ciudad de Lima, refrendado por Leoncio Flores Konja CPC 1950. Se halló que el Proyecto N° 359/2008 Mejora de la Calidad de Vida en las Comunidades de la Microcuenca Ocobamba Baja – Perú., financiado por El Gobierno de Navarra a través del Programa ONDG Fundación RODE, ha incurrido en “exceso de gastos operativos”. Este exceso como lo expresa la empresa auditora, demuestra que en la ejecución del proyecto, CARITAS Abancay gestiono otros recursos financieros con la finalidad de superar las metas a petición de los beneficiarios quienes solicitan ser atendidos en mayor número que lo previstos.

CUADRO 10:

CUADRO RESUMEN DE GASTOS, REMESAS Y DIFERENCIA POR AJUSTAR

RUBRO	Período de liquidación		Período de liquidación		Período de liquidación		Total Acumulado	
	Oct-2008	Set 2009	Oct-2009	Set 2010	Oct. 2010	Set 2011		
	€	S/	€	S/.	€	S/.	€	S/.
	4.24778596		3.575838014		3.34871084			
Gasto total efectuado	214,392.05	910,691.54	235,679.32	842,751.08	245,495.23	822,092.54	695,566.60	2,575,535.16
Envío de remesas	214,392.05	910,691.54	214,871.33	768,345.07	208,961.70	699,752.31	638,225.08	2,378,788.92
Diferencia (exceso) que se informa como aporte	0	0	20,807.99	74,406.01	36,533.53	122,340.23	57,341.52	196,746.24

Preguntas Secundarias:

¿Se justificó la recepción y conformidad de las adquisiciones de bienes y servicios?

De acuerdo a la evaluación del proceso de las adquisiciones de los servicios, materiales e insumos para el desarrollo de las actividades del proyecto, hemos evidenciado que algunas compras se realizaron sin considerar los procesos de adquisiciones.

Las adquisiciones realizadas fueron directamente a proveedores de la zona de intervención con la finalidad de dinamizar la economía local, cuidando siempre que estos insumos tengan buena calidad a bajo precio. La administración de CARITAS Abancay, informa que

en ningún caso, los procesos de adquisición supero el monto de 30,000 euros, razón por lo que no se requirió realizar una licitación e compra.

Referencia de una muestra de las adquisiciones:

CUADRO 11:

ADQUISICIONES DEL PRIMER PERIODO 01 DE OCTUBRE DE 2008 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2009

COMPROB	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
Fact.007098	27/08/2009	Marco Antonio Serrano Tapia	Calaminas, tubos	9,221.00
B/V 016993	06/10/2009	Marco Antonio Serrano Tapia	Clavo, alambre, bisagras	12,128.50
B/V 016994	06/10/2009	Marco Antonio Serrano Tapia	Pinturas, calaminas	38,451.00
B/V 016996	06/10/2009	Marco Antonio Serrano Tapia	Thiner, pintura, tubos	17,915.00
B/V 016998	06/10/2009	Marco Antonio Serrano Tapia	Pinturas, calaminas, tubos	8,330.00
Fact. 0003589	24/06/2009	Sercam SRL	Cemento	15,275.00
Fact.0001548	22/07/2009	Tolomeo AndíaPeceros	Piedra chancada	19,950.00
Fact. 0001702	30/07/2009	Tolomeo AndíaPeceros	Arena gruesa	11,970.00
				133,240.50

CUADRO 12:

ADQUISICIONES DEL SEGUNDO PERIODO 01 DE OCTUBRE DE 2009 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2010

COMPROB	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
Fac. 000335	02/07/2010	Crisoles Inversiones "Cliver"EIRL	Wincha, barretya, comba	7,858.00
Fac. 000334	02/07/2010	Crisoles Inversiones "Cliver"EIRL	alambre, clavo, motor	29,966.00
Fac. 0000142	20/07/2010	Construcción y Demolición "J&G"	Perforación y voladura de rocas	5,020.00
Fac. 000001	21/07/2010	Cesario Centeno Pastor	Triplay	2,120.00
Fac. 000354	16/08/2010	Crisoles Inversiones "Cliver"EIRL	Arena gruesa, piedra	74,595.00
				119,559.00

CUADRO 13:

ADQUISICIONES DEL TERCER PERIODO 01 DE OCTUBRE DE 2010 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2011

COMPROB	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
Fac. 003097	06/10/2010	Eugenia Auquirima Barbosa	Cemento	32,508.00
Fac. 00033	12/11/2010	Transportes "J&G" S.A.C.	Perforación y voladura de roca	10,000.00
Fac. 003150	16/11/2010	Eugenia Auquirima Barbosa	Cemento,codos,tubos	65,072.00
Fac. 000035	03/12/2010	Transportes "J&G" S.A.C.	Perforación y voladura de roca	9,800.00
				117,380.00

Preguntas secundarias:

¿Los insumos se entregaron en los momentos adecuados?

En la evaluación externa ex post, se halló el siguiente resultado.


Un 65% de los que participaron en el desarrollo del proyecto manifiestan que si se entregó los insumos por parte de CARITAS en los tiempos previstos, bajo el compromiso que adquirieron, como es el caso de la instalación de letrinas, los beneficiarios tenían que presentar los adobes y otros insumos como palos, alambres que se comprometían y CARITAS Abancay les colaboraba con la financiación e instalación de su letrina familiar.

Un 29% de los encuestados manifiestan que no le han entregado en el momento adecuado los insumos, pero al preguntar la razón ellos en mayoría manifiestan que no tenían los adobes elaborados, debido a que no les alcanzo tiempo para fabricarlos. De este total un 75% reconoce que fue su desinterés en cumplir lo pactado y que después regularizo estos faltantes.

Un 6% de la muestra no tiene una respuesta clara, unos dicen que no fueron beneficiarios, otros que no conocen la intervención y un porcentaje minoritario que no conoce que insumos se entregaron.

GRAFICO 02

PORCENTAJE DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA: ¿Los insumos se entregaron en los momentos adecuados?

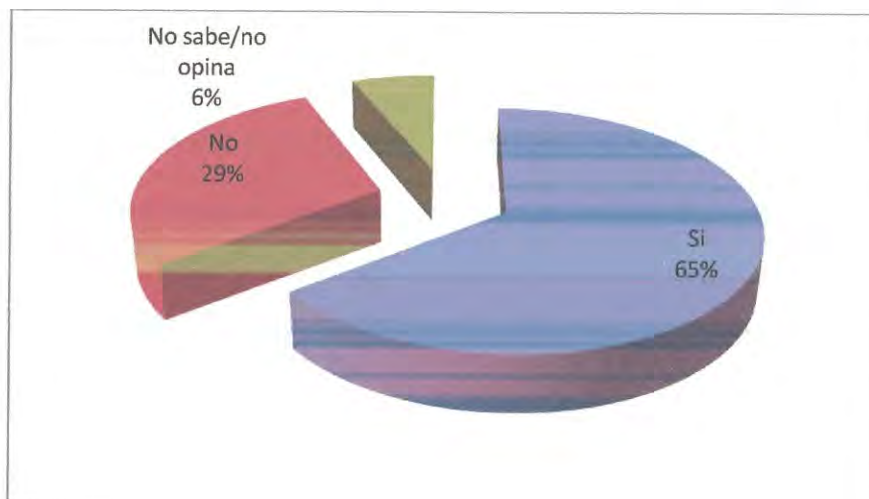

¿La cantidad y calidad de los insumos fueron adecuadas?

Un mayor porcentaje de la muestra afirma que la cantidad y calidad de insumos fueron adecuados este porcentaje fue el 75%, ellos manifiestan que los insumos entregados fueron de buena calidad y en cantidad exacta para alcanzar los resultados revistos.


Un 15% manifiesta que no fueron suficientes los insumos, pero es un porcentaje que no cumplió con el compromiso de elaborar adobes para el caso de la instalación de letrinas.

Y un porcentaje minoritario que no fueron beneficiarios del proyecto, que significa un 9%.

Todo lo manifestado se resume en el siguiente gráfico:

GRAFICO 03

PORCENTAJE DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA: ¿La cantidad y calidad de los insumos fueron adecuadas?

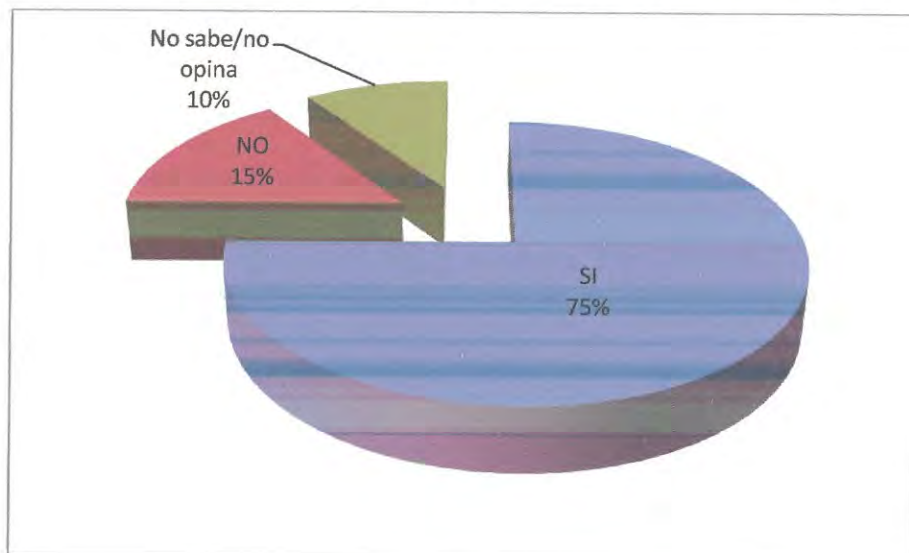

CONCLUSIONES:

3. El proyecto fue eficiente se expresa esto, siguiendo a Reinaldo O. Da Silva, quien define a la eficiencia como "operar de modo que los recursos sean utilizados de forma más adecuada".

En el proceso de evaluación se encontró que hubo más gasto económico del que la entidad financiera otorgo, lo que no implica que sea ineficiente la ejecución del proyecto, ya que este hecho se debió a que en el ejecución los pobladores que en un inicio no intervenían en el proyecto al ver los resultados solicitaba ser considerados como beneficiarios del proyecto.

4. Algunos procesos de compra se han realizado sin tomar en cuenta las normas de adquisición. Evaluando esta omisión se pudo observar que fue por evitar las paralizar las acciones del proyecto.

SUGERENCIAS:

1. Se debe verificar la recepción de lo comprado, según las especificaciones establecidas en los requerimientos, mediante orden de compra, guía de remisión y/o ingresos almacén.
2. Aprobar los precios de compra mediante evaluación de un mínimo de tres cotizaciones, de acuerdo a las políticas de la entidad financiera, con la finalidad de facilitar la información económica, para todas las adquisiciones que tengan un monto superior a montos que la Institución evalúe.
3. Realizar siempre un análisis costo-beneficio en la evaluación ex-ante, con la finalidad de facilitar las evaluaciones posteriores.

LECCIONES APRENDIDAS:

1. Cuando los beneficiarios de un proyecto están satisfechos con los resultados, los productores que en un inicio no deseaban ser incluidos en la ejecución del trabajo solicitan participar en las actividades del proyecto. Por lo que se debe contar con planes de contingencia para mejorar los resultados del proyecto.

IV.6 VIABILIDAD (Continuidad)

Pregunta Principal:

¿En qué medida los beneficiarios del proyecto ponen en práctica lo aprendido durante la intervención de Caritas?

En el 91% de lo desarrollado por la ejecución del proyecto los pobladores manifiestan que ponen en practica.

RESULTADO 1:

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO DE LA POBLACIÓN:

Preguntas secundarias:


¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

Analizando la actividad 1.1. *Implemento de las instalaciones sanitarias*. Si se pudo apreciar que existe más número de letrinas de las que se informó que se han construido, esto se sustenta por las solicitudes de que se tiene pedidos para que se apoye con la construcción de letrinas en otras comunidades que en un principio no estaban consideradas en el proyecto como: Choccepuquio, Carhuayaco alto, Huancayllo alto, Jerusalén y Florida.

En el grafico 04 se puede apreciar el número de letrinas construidas en cada comunidad.

GRAFICO 04:

NUMERO DE LETRINAS CONSTRUIDAS POR COMUNIDAD

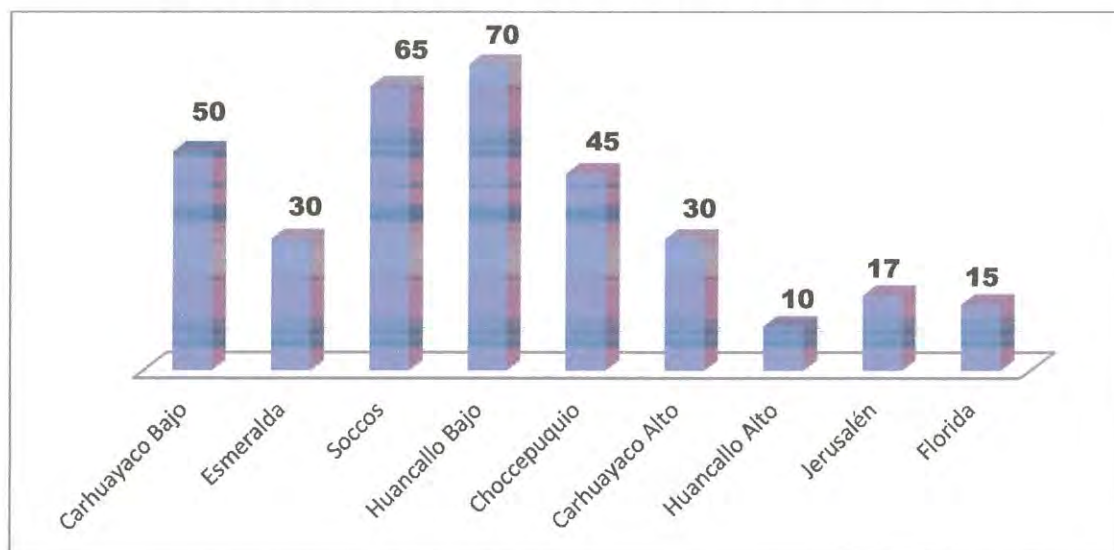

Fuente: Informes de intervenidos del Equipo de CARITAS al Gobierno der Navarra. 2008-2011

trabajo conjuntamente con el Centro de Salud Ocobamba, la Municipalidad Distrital de Ocobamba y la Dirección de Salud Ambiental de Andahuaylas, Instituciones que continúan realizando esporádicamente las actividades ejecutadas durante la intervención del proyecto.

RESULTADO 2:

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCION AGRARIA

Actividad 2.1. *Mejora de la producción agrícola:*

Preguntas:

¿Se da la continuidad a lo trabajado en el proyecto?


Para el caso del maíz morado un 25% de productores no dan continuidad en el cultivo de esta especie debido a condiciones de mercado.

El cultivo de frijol es el más sostenible en cantidad también debido a las condiciones de mercado.

En esta evaluación Ex Post se comprobó que el cultivo de maíz morado se implanto en otras comunidades, en porcentajes de menor cuantía, que no estaban considerados en el marco de ejecución del proyecto.

GRAFICO 05:

NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS POR COMUNIDAD

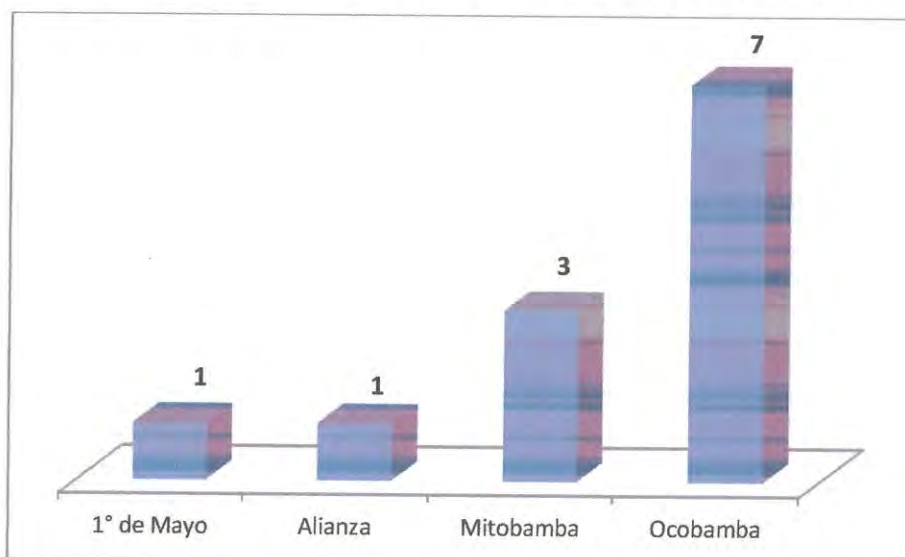

Con respecto a la extensión de terrenos usados con el propósito de producción de maíz morado y frijol, el informe indica que al segundo año se habían logrado instalar 12 Ha de Maíz Morado y 24 Ha de frijol.

El análisis de la evaluación señala que a la fecha (evaluación ex post) existen un total de 39.5 Ha de Maíz Morado y 76 Ha de Frijol. Dato que indica que la sostenibilidad está garantizada.

GRAFICO 06:

EXTENSION DE TERRENOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ MORADO Y FRIJOL POR COMUNIDADES EN Ha


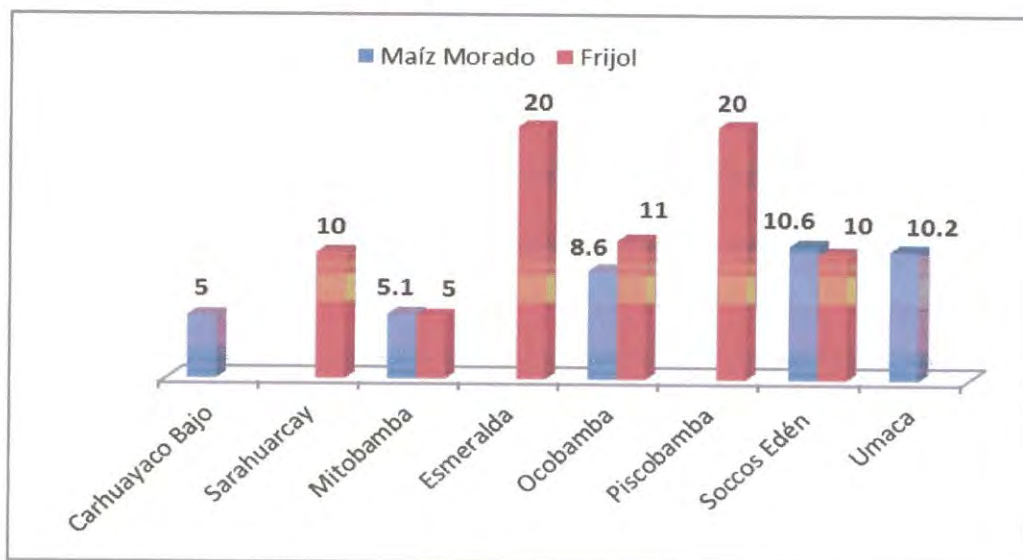


GRÁFICO 07:

PRODUCCIÓN DE MAÍZ MORADO Y FRIJOL POR COMUNIDADES EN TONELADAS

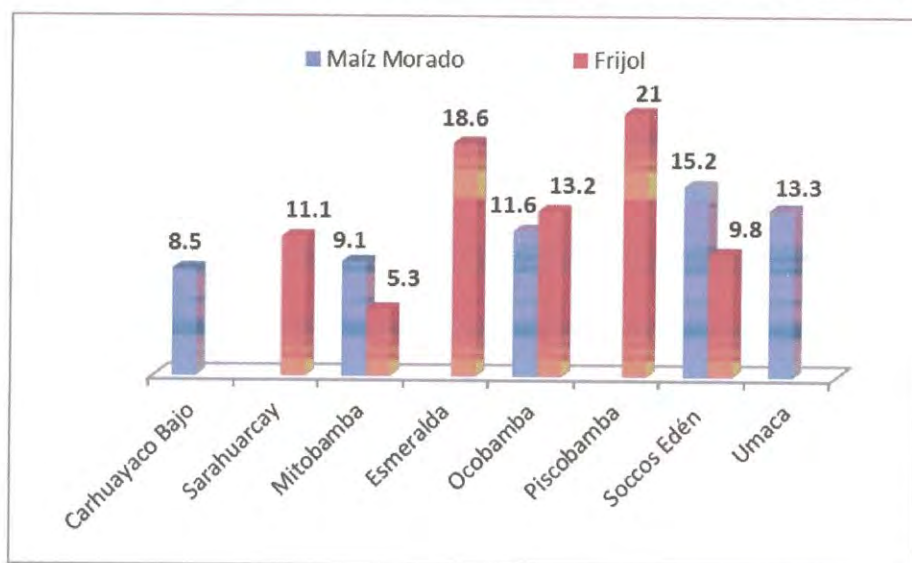

Es necesario indicar que durante la evaluación Ex Post Junio de 2013, los pobladores mencionaron que destinan cada vez menos áreas de cultivo para el cultivo de Maíz morado, en consecuencia la perspectiva de crecimiento productivo del maíz es negativa, por influencia del mercado; en contraste a esta problemática, afirmaron que los índices productivos del frijol van en ascenso, dado que este cultivo es, económicamente, más rentable.

"El maíz morado ya no se produce, antes si había mucho, pero no se vende bien en el mercado, te pagan muy poco, ahora se cultiva más frijol, porque hay venta y el precio es más alto"

Elmer Pérez León

Productor Comunidad de Carhuayaco Bajo

En lo referente al aprendizaje de las capacitaciones impartidas se tiene a la pregunta:

¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

En la evaluación ex post Externa, se pudo ver que la población participante en el programa de capacitación en cultivos ecológicos: Maíz Morado y Frijol, aplican estos conocimientos en 31.4% a la fecha evaluativa, este resultado muestra que un tercio de la población beneficiada continua con el trabajo realizado por Caritas.

Actividad 2.2. Mejora de la infraestructura productiva:

¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

Se sigue manteniendo los canales de riego construido en base a faenas convocadas por los directivos de la comunidad y aprobados en asamblea general.

Este efecto de continuidad se aprecia también porque existe solicitudes de comunidades vecinas como Carhuayaco bajo, que solicitan la construcción de un canal que beneficie su comunidad.

¿El apoyo político está sustentado?

No se cuenta información importante con respecto a esta interrogante.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

Caritas Abancay trabajo en la construcción de los canales de riego, la municipalidad Distrital está interesada en seguir realizando construcciones de canales de riego que beneficien a mas productores de las comunidades del Distrito. Como el Municipio también tuvo un papel protagónico en la ejecución de la construcción de los reservorios, por esta experiencia conjunta entre las dos instituciones la municipalidad está proyectando ejecutar nuevos de proyectos análogos en diferentes comunidades requeridas.

En lo referente a la CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS NOCTURNOS. Como se conoce, en el proceso de construcción del reservorio de Aguas Verdes en la comunidad de Piscobamba, Caritas trabajo conjuntamente con la Municipalidad distrital de Ocobamba.

En la evaluación ex post Externa, realizada en junio de 2013, los promotores señalan la necesidad de la construcción de dos reservorios de agua en las comunidades de Piscobamba y Alianza con capacidades de 1500 m³ y 600 m³ respectivamente.

Preguntas:

¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

Es importante resaltar que el 90% de los encuestados mencionaron que el reservorio de Aguas Verdes en la comunidad Piscobamba estaba agrietado. Y ha dejado de funcionar, por lo que la continuidad del proyecto en Aguas Verdes, Piscobamba, se vió seriamente afectada. Es tan fuerte el deslizamiento de tierras en el sector que ya se tiene por perdido este reservorio. Son contingencia naturales casi incontrolables por el hombre. Para el caso del reservorio de Alianza si se tiene continuidad en el mantenimiento por el interés de realizar riegos en las actividades agrícolas.

¿El apoyo político está sustentado?

No se cuenta información importante con respecto a esta interrogante.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

Con el objetivo de mejorar los sistemas de riego en la las comunidades del Distrito de Ocobamba, Caritas Abancay trabajo conjuntamente con la Municipalidad Distrital, quien tuvo un papel protagónico en la ejecución de la construcción de los reservorios. Institución que continúa con la ejecución de proyectos análogos en otras comunidades requeridas.

"Caritas hizo un gran esfuerzo para construir el reservorio, que estuvo funcionando muy bien, pero ahora se ha rajado y se ha colapsado"

Isabel Pérez

Productora comunidad de Piscobamba

En lo referente a la CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO. Se impartió 3 módulos en temas que son los siguientes: a. Modulo en OPERACIÓN-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO. b. Concepto. Modulo en PLANES DE CULTIVO Y RIEGO. c. Modulo en operación y mantenimiento de áreas irrigada.

¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

Un 43% de la población evaluada, asegura que los talleres le ayudo y que a fecha evaluativa, aun practican lo que se desarrolló en los talleres, dando continuidad al proyecto.

¿El apoyo político está sustentado?

No se cuenta con información importante respecto a esta interrogante. Porque no se pudo identificar alguna institución que realice este tipo de capacitaciones.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

El ministerio de agricultura de alguna forma trabaja en capacitaciones en temas de operación y mantenimiento de infraestructuras de riego.

Para la Gestión idónea del proceso productivo agropecuario: En la evaluación ex post que se realizó en junio del 2013, se cuenta con promotores/as agropecuarios/as, además también se identificó que se ha equipado a los promotores.

Preguntas:

¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

En la evaluación ex post que se realizó en junio del 2013, se observó que a la fecha los promotores aún siguen trabajando y son fácilmente reconocidos. Los pobladores encuestados afirman conocer la existencia de al menos dos promotores agropecuarios, en un 61.8%, un 36.2% afirma conocer solo uno y un 2 % no sabe de la existencia de éstos.

¿El apoyo político está sustentado?

No se cuenta información relevante con respecto a esta pregunta.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

CARITAS Abancay trabajo conjuntamente con las juntas comunales. Estas directivas a la fecha de la evaluación aun velaban por el trabajo de los promotores y de algún modo son un control social de estas actividades.

RESULTADO 3:

Mejora MEDIOAMBIENTAL

Actividad 3.1: *Aumento de la superficie arbolada:* Construcción e instalación de viveros.-Puesta en marcha de 1 vivero forestal en la comunidad de Ocobamba (de fácil acceso a las zonas a reforestar), con capacidad de 100.000 plántones; 20.000 de especies nativas (Chachacomo, Kiswar), y 80.000 de especies exóticas (ciprés, pino).

¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

El análisis de la evaluación indica que los mencionados viveros están en funcionamiento, pero es relevante mencionar que las comunidades beneficiadas mencionan que los programas de reforestación darán un funcionamiento prolongado de los viveros forestales.

¿El apoyo político está sustentado?

El Municipio viene dando un soporte técnico para la continuidad del funcionamiento de los viveros. Por los logros alcanzados en la ejecución del proyecto el alcalde de la municipalidad por decisión política tiene proyectado seguir apoyando la producción en los viveros.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?


El ministerio de agricultura, así como el ministerio de medio ambiente, son responsables directos de los programas de reforestación, esta acción conjunta con las comunidades, asegurara la completa funcionabilidad y productividad de los ya mencionados viveros.

Para el concepto de incentivar la producción frutícola de la zona, se instalará 3 viveros frutícolas -de paltos, limones y naranjos- en las comunidades de Carhuayaco bajo, Sarahuarcay y Ocobamba, (lugares con vocación frutícola) con capacidad de 10.000 plántones cada uno, 30.000 en total.

Los resultados del acopio de datos se concluye que se instalaron 5 viveros en las comunidades de Soccos, Carhuayaco Bajo, Esmeralda, Mitobamba y Umaca.

GRÁFICO 08:

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PLANTONES FRUTICOLAS

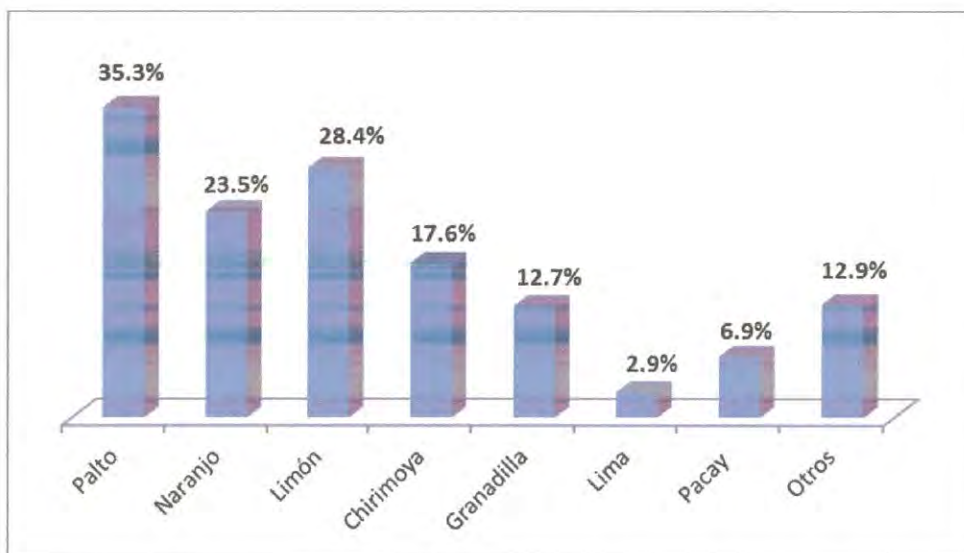

Adicionalmente indicaron la presencia de otras especies, pero en menor cantidad, tales como Ciruela, Durazno, Lúcumá, Mandarina, Manzana y Pera.

Preguntas:

¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

Se aprecia que se instalaron dos viveros más de los previstos, Adicionalmente, en la evaluación es post realizada en Junio de 2013, se observó que en las 5 comunidades en las que se instaló un vivero frutícola, los pobladores afirmaron contar con diferentes especies, entre las que destacan el palto, naranja y limón, además de otras como Chirimoya, Granadilla, Lima y pacay garantizando la continuidad del proyecto.

¿El apoyo político está sustentado?

En vista de este logro la municipalidad está en un proceso de identificar proyecto que tenga similar actividad de aumentar áreas arboladas.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

El ministerio de agricultura, a través del programa de desarrollo productivo agrario rural puede fortalecer a la continuidad de estas actividades.

Para el concepto de Reforestación.- Para la recuperación de las áreas depredadas y la conservación sus suelos, serán reforestadas un total de 100 Horas

Preguntas:

El apoyo político está sustentado?

No se cuenta con información relevante en relación a esta interrogante.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

El ministerio del ambiente en un trabajo conjunto con instituciones que tengan el interés de realizar reforestaciones puede continuar los trabajos siempre que la población lo solicite.

Para el concepto: Construcción de 30 hectáreas de zanjales de infiltración.- La Instalación de zanjales de infiltración es una práctica de conservación de suelos, complementaria a la reforestación con especies forestales. Infiltrando las aguas de escorrentía, en época de lluvias, facilitando el desarrollo de los pastos naturales y el prendimiento de las plantas reforestadas. De esta forma se evita la erosión de los suelos depredados y se favorece su conservación.

El informe indica la construcción de las zanjales en la comunidad Piscobamba, no obstante el análisis muestra que también se realizó la construcción en las comunidades de Choccepuquio y Mitobamba, con un total de 33 ha.

Preguntas:


¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

Al análisis de la evaluación ex post muestra que las comunidades de Piscobamba, Choccepuquio y Mitobamba han sido beneficiadas con la construcción de zanjales de infiltración, pero adicionalmente rebela la presencia de zanjales en las comunidades de Ocobamba y Soccos, en extensiones menores, pero suficientes para dar a conocer que la actividad se está replicando entre los pobladores de las comunidades vecinas.

A la fecha de la evaluación se encontraron un total de 38.3 Ha de Zanjales de infiltración

GRÁFICO 09:

EXTENSION DE ZANJAS DE INFILTRACION EN Ha POR COMUNIDAD

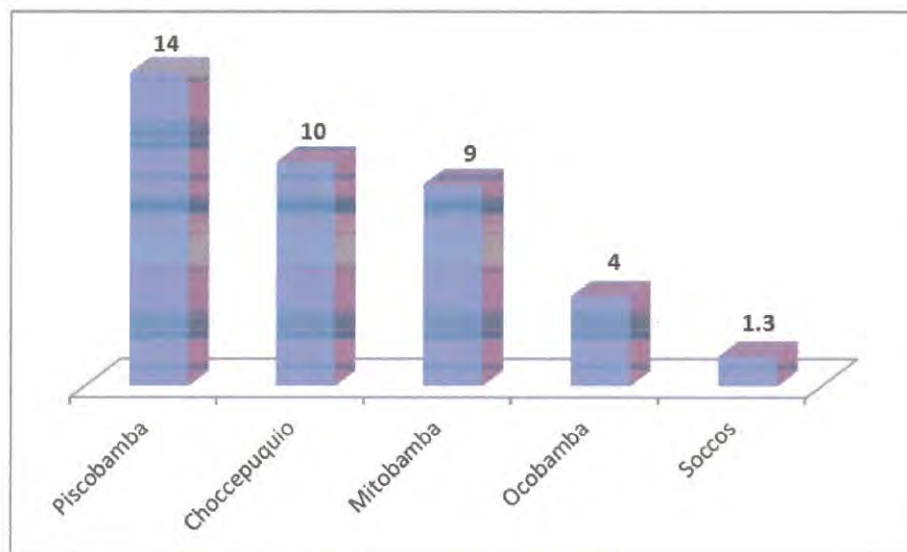

¿El apoyo político está sustentado?

No se cuenta información relevante en relación a esta interrogante.

Para la *ACTIVIDAD 3.2 PROTECCION DE FUENTES DE AGUA*: Instalación de cercos con alambres de púa. La actividad consiste en proteger las áreas circundantes de 10 manantes de agua mediante la instalación de cercos con alambres de púa (ya que los animales domésticos principalmente los porcinos y ganado vacuno malogran y contaminan con sus excrementos los manantes de agua potable).

El resultado de la evaluación indica que la protección de manantes se realizó en las 10 comunidades donde se ejecutó el proyecto. Piscobamba, Umaca, Sarahuarcay, Carhuayaco Bajo, Esmeralda, Socos, Huancallo bajo, Primero de Mayo, Ocobamba y Tupac Amaru.

Preguntas:


¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

Cabe resaltar que al análisis de la evaluación ex post realizada en Junio de 2013, El 13.8% de la población evaluada asegura que instaló un cerco vivo alrededor de sus fuentes de agua con el propósito de seguir protegiéndolas y el 6 % señala que realiza limpieza de los mismos oportunamente, y que a la fecha de evaluación, realizaban

campañas comunales de limpieza asegurando la continuidad del trabajo realizado por Caritas Abancay.

GRÁFICO 10:

POBLACION QUE CONTINUA CON EL CUIDADO DE SUS FUENTES DE AGUA

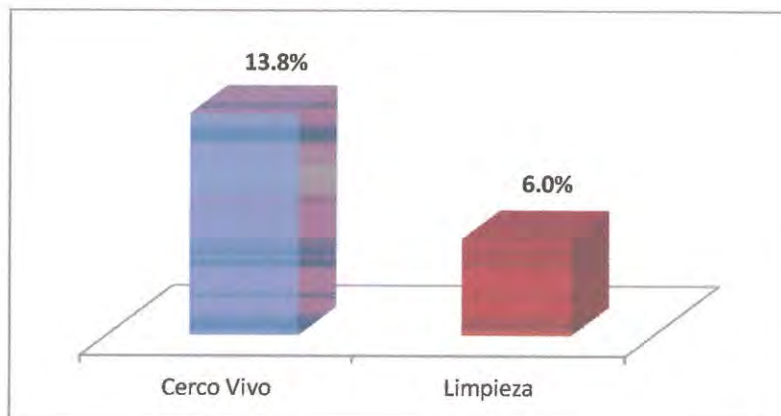

¿El apoyo político está sustentado?

No se cuenta información relevante en relación a este interrogante.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

La organización comunal a través de las juntas directivas son los directos responsables del mantenimiento y protección de las fuentes de agua.

ACTIVIDAD 3.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MEDIO AMBIENTE, Y GESTIÓN DE VIVEROS FRUTÍCOLAS Y FORESTALES: Módulo de capacitación en impacto medioambiental El plan formativo será impartido con una cadencia de un evento por cada uno de los años que dure el programa -3 en total-. El módulo contará con la asistencia total de 120 mujeres y hombres (40 por evento) integrantes de las juntas de usuarios de riego, miembros de las JASS y directivos comunales de las diez comunidades participantes en este programa.

El evento tuvo como Objetivo "sensibilizar a las comunidades sobre el impacto ambiental causado por el deterioro de los recursos naturales existentes en el distrito"


Preguntas:

¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

En la evaluación ex post que se realizó en junio del 2013, los asistentes a los módulos de capacitación en impacto ambiental, manifiestan en un 59% que los talleres les ayudaron en su vida y ponen en práctica lo aprendido. Dato que no muestra si se da continuidad al trabajo de CARITAS Abancay.

GRÁFICO 11:

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE PRACTICAN LO APRENDIDO EN EL MODULO DE CAPACITACION

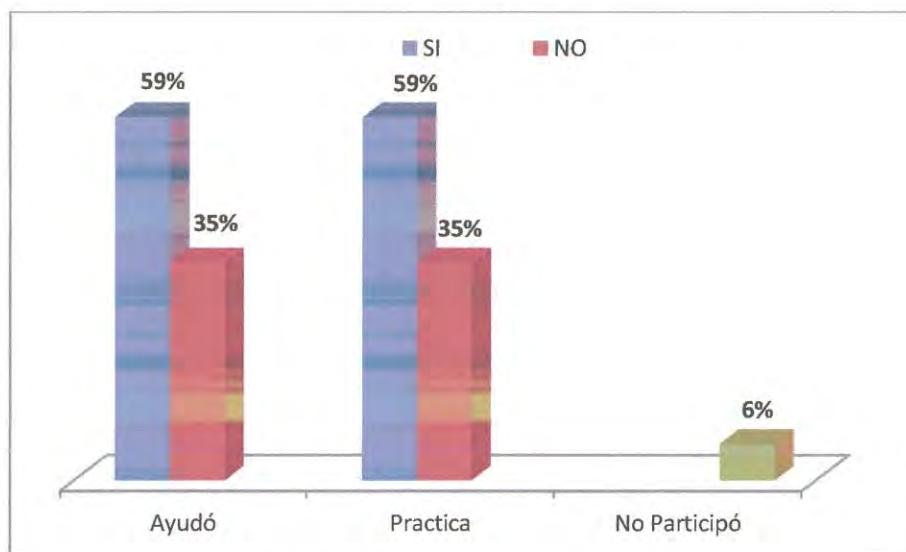

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?


Las JAAS, de por si son las organizaciones que tienen la capacidad de continuar con las actividades.

Módulo de capacitación en viveros frutícolas y forestales. El plan formativo será impartido con una cadencia de un evento por cada uno de los años que dure el programa -3 en total-. El módulo contará con la asistencia total de 120 mujeres y hombres (40 por evento) integrantes de las juntas de usuarios de riego, miembros de las JAAS y directivos comunales de las diez comunidades participantes en este programa.

El modulo se realizó en las comunidades de la microcuenca de Ocobamba al primer año, en las comunidades de Umaca y Esmeralda al segundo año y en la comunidad de Mitobamba al tercer año.

GRÁFICO 12:

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE PRACTICAN LO APRENDIDO EN EL MODULO DE CAPACITACION

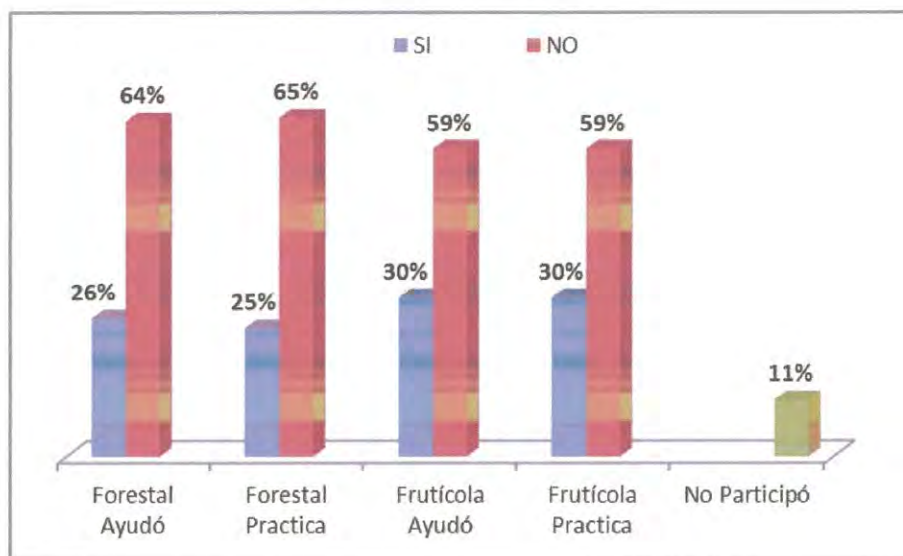

Preguntas:

¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

A junio del 2013 fecha que se realizó la evaluación ex post, los asistentes a los módulos de capacitación en viveros frutícolas y forestales, manifiestan en un 26% y 30% respectivamente que les ayudo en su vida conocer sobre el tema, y en un 25% y 30%, afirman que ponen en práctica lo que aprendieron en los talleres dando continuidad al trabajo proyecto.

¿El apoyo político está sustentado?

No se cuenta información relevante en relación a esta interrogante.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

No se pudo identificar una organización que esté interesado en continuar estas actividades.

En la evaluación ex post, de junio de 2013, se identifica que también pobladores de otras comunidades como Mitobamba, Piscobamba y Sarahuarcay han replicado la construcción de letrinas, por que reconocen la utilidad de esta instalación y la mejora en su saneamiento básico de su comunidad.

Se encontró que el 81% de encuestados cuenta con una letrina y manifiesta que es muy útil esta instalación y que siguen utilizándolo.

¿El apoyo político está sustentado?

Por los testimonios de los pobladores de las comunidades evaluadas, se aprecia que existe apoyo por parte de la Municipalidad Distrital, debido a que se está proyectando seguir con la construcción de letrinas en los sectores y con los pobladores que CARITAS no trabajo que es difícil el acceso. Más en las cercanías a los poblados se tiene proyectado la instalación de desagües.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

No se identificó organizaciones sobre el tema de letrinas, las actividades se siguen realizando en forma individual.

La actividad *1.2. Programa de CAPACITACIÓN en educación sanitaria y fortalecimiento de las JASS (Junta de administración de los servicios de saneamiento).*

¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

En la evaluación ex post que se realizó en junio del 2013, los asistentes al módulo de capacitación en Educación Sanitaria manifiestan en un 68,6% que ponen en práctica lo aprendido, esto indica que un gran porcentaje de los pobladores interiorizaron los temas de capacitación.

Para el caso del módulo de capacitación en sistemas de abastecimiento de agua potable el 63.7% de la población manifiesta poner en práctica lo aprendido durante las capacitaciones.

En la evaluación externa se logró observar que de los asistentes al Módulo de capacitación fortalecimiento de las JASS (Juntas Administrativas de Servicios de Saneamiento), un 54.9% señala que pone en práctica lo aprendido y pueden organizar y gestionar las JAAS.

¿El apoyo político está sustentado?

Como menciona el Plan de Desarrollo Distrital de Ocobamba al año 2010 las JAAS trabajan conjuntamente con la población y en coordinación con el Municipio Distrital en los procesos de capacitación para la gestión de los servicios de saneamiento y en educación sanitaria.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

Con el objetivo de mejorar los sistemas de abastecimiento de agua y de salubridad con una buena organización, administración y consumo adecuado del agua CARITAS Abancay

RESULTADO 4:

POBLACIÓN ORGANIZADA: Participa de los procesos de desarrollo y conoce sus derechos.

Actividad 4.1. *Formación para la participación civil en procesos de desarrollo: Las Campañas de sensibilización en desarrollo comunal y planificación participativa.-*


Preguntas:

¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

En la evaluación ex post que se realizó en junio del 2013, muestra que el 44% de la población que recibió la capacitación en organización y desarrollo local, afirma que le ayudo en su vida diaria y el 42% ratifica poner en práctica lo que aprendió durante la capacitación por lo que se da continuidad al trabajo realizado por CARITAS Abancay.

GRÁFICO 13:

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE ASISTIO Y PRACTICAN LO APRENDIDO EN EL MODULO DE CAPACITACION

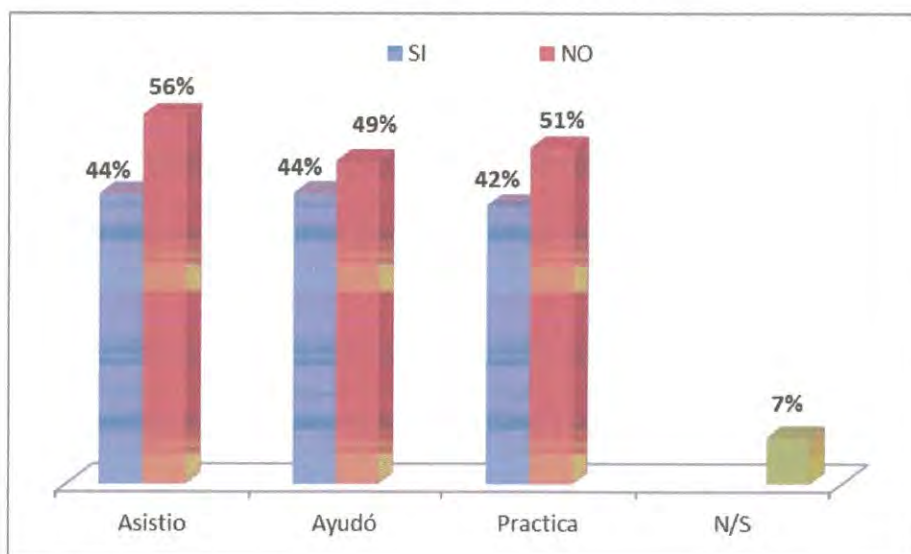

¿El apoyo político está sustentado?

No se cuenta información relevante en relación a esta interrogante.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?


No se identificó institución con interés de continuar el trabajo.

Curso de formación en liderazgo.-

El gráfico muestra que el 91% de la población que recibió la capacitación en liderazgo afirma que le ayudo en su vida diaria y el 90% afirma poner en práctica lo aprendido durante la capacitación.

GRÁFICO 14:

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE PRACTICAN LO APRENDIDO EN EL MODULO DE CAPACITACION

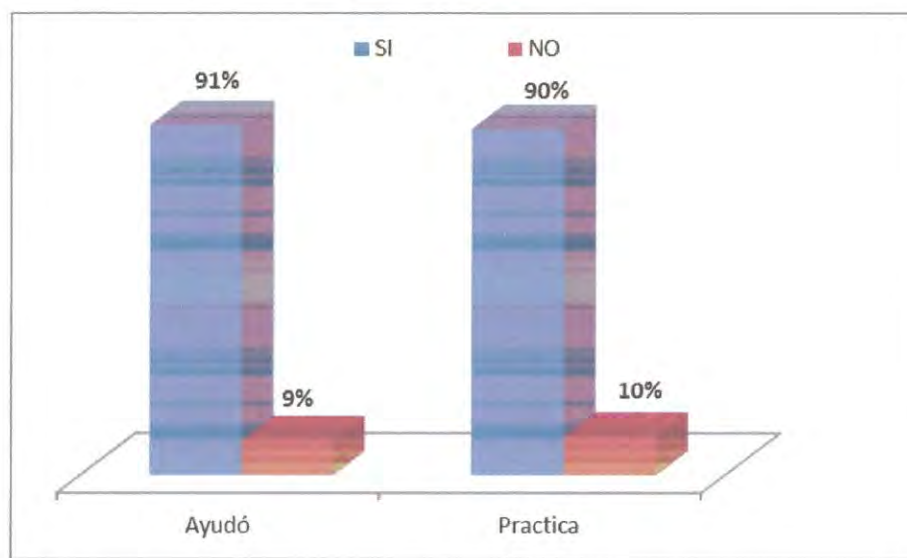

Capacitación en técnicas de organización y desarrollo local.

Para el desarrollo de esta capacitación CARITAS trabajo coordinadamente con autoridades locales, municipales y comunales, en cooperación de instituciones como: la Municipalidad de Ocobamba, Centro de Salud de Ocobamba y Juzgado de Paz Letrado.

El evento se desarrolló en las comunidades de Piscobamba, Umaca Sarahuarcay, Choccepuquio, Carhuayaco Bajo, Carhuayaco Alto, Socos, Esmeralda, Huancallo Bajo, Mitubamba, 1° de Mayo, Túpac Amaru, Salvia y Alianza.


Preguntas:

¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

En la evaluación ex post se pudo encontrar que los asistentes a los módulos de capacitación en técnicas y desarrollo local, un 45% manifiestan que les ayudo en su vida conocer sobre el tema, y el 42% pone en práctica lo aprendido. Indicador este que muestra la continuidad del trabajo.

GRÁFICO 15:

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE ASISTIO Y PRACTICAN LO APRENDIDO EN EL MODULO DE CAPACITACION

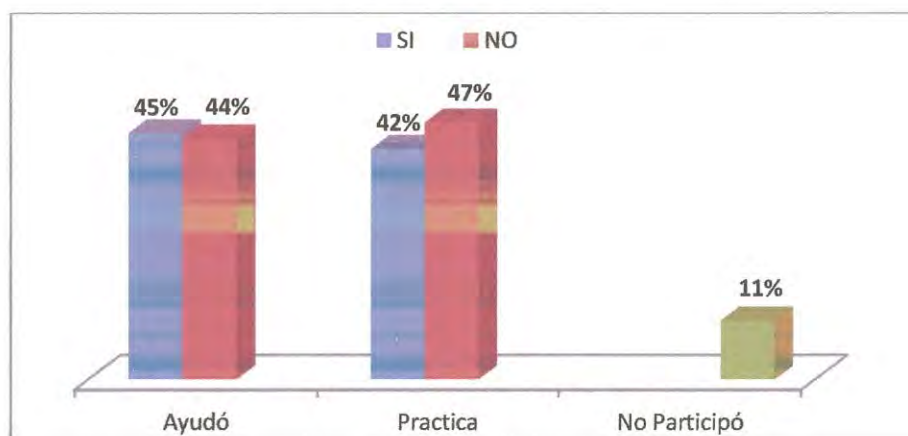

¿El apoyo político está sustentado?

No se cuenta información relevante en relación a esta interrogante.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

No se pudo identificar una organización que esté interesado en continuar estas actividades.

Formulación de Planes de Desarrollo Comunal: Se cuenta con 10 planes de desarrollo comunal en la micro cuenca de Ocobamba, a través de trabajos participativos con la población, autoridades comunales y los alcaldes de los centros poblados. Como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO 14:

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES POR COMUNIDAD

COMUNIDAD	Plan de Desarrollo	Cumple los Objetivos	Cumple las Actividades	Cumple los resultados esperados	Entregado a la Municipalidad
Carhuayaco Bajo	SI	SI	SI	SI	SI
Esmeralda	SI	SI	SI	SI	SI
Huancallo Bajo	SI	SI	SI	NO	NO
Maucallaqta	SI	SI	SI	SI	SI
Mitobamba	SI	SI	SI	SI	SI
Ocobamba	SI	SI	SI	SI	SI
Piscobamba	SI	SI	SI	SI	NO
Sarahuarçay	SI	SI	SI	SI	SI
Soccos El Edén	SI	NO	SI	SI	SI
Umaca	SI	SI	SI	SI	SI

Preguntas:

¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

El resultado del análisis de la evaluación indica que el 100% de las comunidades cuenta con un plan de desarrollo, que en cualquier momento puede ser utilizado para poner en práctica el mencionado plan. Se identifica que se tiene continuidad lo trabajado en el proyecto.

¿El apoyo político está sustentado?

La Municipalidad distrital de Ocobamba, reconoce la labor realizada durante la ejecución del proyecto, por lo que existe apoyo político.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

La municipalidad en trabajo conjuntamente con los miembros directivos de las comunidades para poner en marcha estos planes.

Participación en el proceso de planeamiento y presupuesto Distrital.

¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

Los líderes preparados y las personas que en forma indirecta se beneficiaron por el proyecto evaluado, garantizan la continuidad del trabajo ejecutado, porque vienen participando en procesos de planeamiento y presupuesto en la localidad cada año. Razón está que han sido reconocidos como líderes de sus comunidades

¿El apoyo político está sustentado?

No se cuenta con información relevante en relación a esta interrogante.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

La Municipalidad en trabajo conjunto los miembros de las directivas comunales son los protagonistas para que las actividades realizadas por CARITAS Abancay sigan permaneciendo activas.

Promoción de un Centro de "Formación Continuada"

Preguntas:

¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

El equipamiento y el posterior funcionamiento del centro de "Formación continua" garantiza la continuidad de lo trabajado en el proyecto.

Porque la organización de la iglesia católica es fuerte y en este caso la Parroquia de Ocobamba está liderada por el R.P. Hernán Lobos

¿El apoyo político está sustentado?

Más que apoyo político podemos manifestar que el apoyo viene de la iglesia católica, porque en las instalaciones de la parroquia se ha acondicionado un ambiente que sirve de local para que funcione el centro de "Formación continua". Somos conocedores de la capacidad de accionar de la iglesia y eso está sucediendo en la zona de intervención.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

La instalación del centro trae consigo la posibilidad de apoyar al desarrollo de actividades de capacitación a diferentes instituciones que requieran un local equipado.

Formación de "Promotores/as de Derechos Humanos".

Preguntas:

¿Se da la continuidad de lo trabajado en el proyecto?

Las capacitaciones realizadas para los promotores garantiza la continuidad del proyecto, ya que ellos son la réplica de los objetivos de la intervención que siempre van a vivir en la zona.

Además se encontró que un 59% de la población encuestada afirma conocer la labor de los promotores, indicador que permite decir que si se tiene continuidad en lo trabajado en el proyecto.

¿El apoyo político está sustentado?

No se cuenta con información relevante en relación a esta interrogante.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

Las organizaciones que están jugando un papel importante son las juntas directivas comunales que apoyan y reconocen la labor de los promotores.

ACTIVIDAD 4.2.

Indicador 4.2. Capacitación en materia de lucha contra el maltrato familiar y el alcoholismo.

El informe menciona que se hizo un plan de acción contra la violencia familiar y el alcoholismo con participación de la población, mediante talleres participativos y posteriormente entregados al Municipio de Ocobamba.

Preguntas:


¿Se da la continuidad a lo trabajado en el proyecto?

De la evaluación ex post se resume que el 61.8% de la población encuestada afirma que su comunidad cuenta con un plan de acción contra la violencia familiar y el alcoholismo, la continuidad de las acciones realizadas por Caritas Abancay es evidente y la

sensibilización a la población en estos problemas sociales fue exitosa. Como se evidencia en el siguiente cuadro.

GRÁFICO 16:

EXISTENCIA DE UN PLAN DE ACCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y EL ALCOHOLISMO

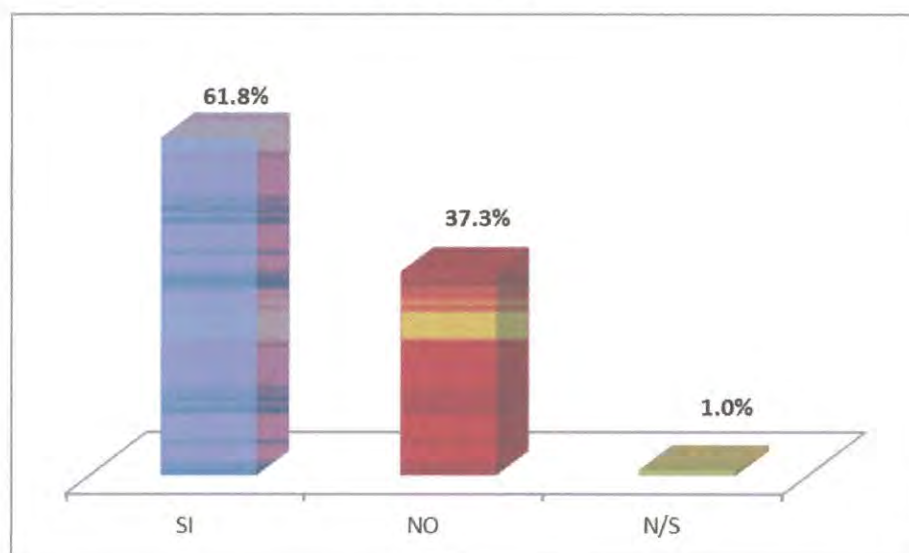

¿El apoyo político está sustentado?

Si está sustentado, porque la gobernación del distrito, la Policía Nacional y el Juzgado de Paz Letrado, han sido partícipes en el desarrollo de estas capacitaciones y están comprometidos en apoyar la ejecución del plan de acción.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

Si existen, como es el caso de la Municipalidad Distrital, el centro de de Salud así como las juntas directivas comunales son los responsables de que el plan de acción contra la violencia familiar y el alcoholismo sea respetado y practicado.

Módulo de capacitación de Funcionarios/as del Estado en Relaciones de Género y cultura de paz.

Preguntas:


¿Se da la continuidad a lo trabajado en el proyecto?

Del análisis de datos acopiados en junio de 2013, se deduce que un 62.7% de la población encuestada que recibió la capacitación, afirma que le ayudo en su vida los temas desarrollados y el mismo porcentaje pone en práctica lo que aprendió en los mencionados talleres. Como muestra el grafico 37

Lo que permite concluir diciendo que la continuidad del proyecto está garantizada.

GRÁFICO 17:

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE PRACTICAN LO APRENDIDO EN EL MODULO DE CAPACITACION

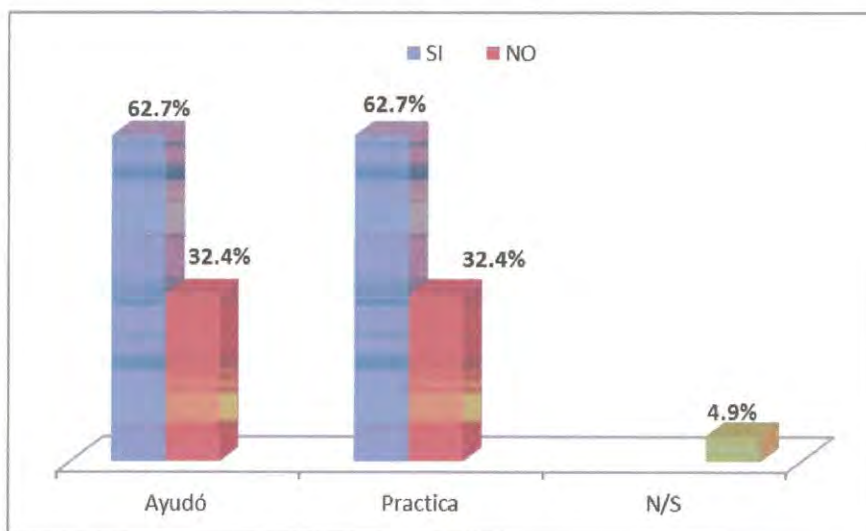

¿El apoyo político está sustentado?

No se cuenta con información relevante en relación a esta interrogante.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

La participación de instituciones, como el Centro de Salud de Ocobamba, Centros educativos, Cooperativa Cuenca pampas y Gobernatura de Ocobamba, son las organizaciones que estan continuando el trabajo realizado por CARITAS Abancay.

Módulo de capacitación en "Valores y Autoestima" a colectivos de riesgo.

Preguntas:

¿Se da la continuidad a lo trabajado en el proyecto?

A la fecha de la evaluación, los pobladores indican que los talleres impartidos en temas de valores y autoestima les ayudó mucho, mencionan que tienen el conocimiento de la autoestima, además que el respeto en la familia creció.

¿El apoyo político está sustentado?

No se cuenta con información relevante en relación a esta interrogante.

¿Existe organizaciones con capacidad de continuar las actividades?

Los Centros educativos, el Centros de salud, así como los promotores son los principales actores que continuan con las actividades.

CONCLUSIONES:

1. La continuidad está garantizada debido a la metodología participativa utilizada por CARITAS Abancay en la ejecución del proyecto.
2. El 89% de las actividades realizadas en el desarrollo del proyecto son sostenibles.

SUGERENCIAS:

1. Se sugiere continuar con la metodología aplicada en la ejecución del proyecto, especialmente con la priorización del enfoque participación y la gestión en la realización de alianzas estratégicas con las instituciones existentes en la zona de intervención, con la finalidad de involucrar a la población en su propio desarrollo, así como la de incentivar a las autoridades a que participen en este desarrollo.
2. Seguir con la realización de talleres de capacitación para cada ítem de resultado trabajado en el proyecto.

LECCIONES APRENDIDAS:

4. El involucramiento de la población desde la identificación de las necesidades y en la misma ejecución del proyecto garantiza un alto grado de identificación de los mismos en el horizonte del proyecto y la posterior continuidad del mismo.
5. La participación de técnicos y personal que trabaja en la ejecución del proyecto que sean oriundo de la zona de intervención incrementa el grado de sostenibilidad, debido a que la comunidad por ser hijo de la misma lo respeta y obedece como es el Caso de Licenciado en enfermería Jymmy Aybar.
6. La expansión de capacidades en temas que versa el proyecto es importante para generar un ambiente de seguridad en el accionar de los actores del proyecto que se traduce en una sostenibilidad garantizada.

MARCO DE ANALISIS

FIN	Actividades	Concepto
Disminución del nivel de pobreza de las comunidades de: Huanacayo bajo, Soccos, Piscobamba baja, Carhuayaco bajo, Umaca, Primero de mayo, Ocobamba, Manzanapata en Chalhuan - ; Microcuenca de Ocobamba Baja.		
PROPOSITO	Mejorando la calidad de vida de las comunidades de la Microcuenca de Ocobamba Baja.	
RESULTADOS		
R1.- MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA POBLACIÓN	1.1. Implemento de las instalaciones sanitarias: Las familias de las comunidades de Huanacayo bajo, Soccos, Carhuayaco Bajo, y Esmeralda cuentan con 332 letrinas de uso familiar.	Instalación de 332 LETRINAS unifamiliares en las comunidades de: Huanacayo bajo, Soccos, Carhuayaco bajo y Esmeralda
	1.2. Programa de CAPACITACIÓN en educación sanitaria y fortalecimiento de las JASS (Junta de administración de los servicios de saneamiento). Se impartirán 3 módulos -de 3 eventos cada uno. A ellos asistirán 120 miembros (6 hombres y 6 mujeres -integrantes de las directivas comunales, JASS, y líderes/esas identificados/as con el proyecto- de cada una de las 10 comunidades), que replicarán lo aprendido entre sus vecinos.	Módulo de capacitación en educación sanitaria. Módulo de capacitación en sistemas de abastecimiento de agua potable. Módulo de capacitación en fortalecimiento de las Juntas de administración del Servicio de saneamiento (JASS).
	2.1. Mejora de la producción agrícola: 108 familias de las comunidades de: Huanacayo bajo, Soccos, Piscobamba baja, Carhuayaco Bajo, Esmeralda, Sarahuarcay, Umaca, Primero de mayo, y Manzanapata introducen la producción del MAÍZ MORADO, obteniendo una producción anual de 54 toneladas (6 por comunidad) en un total de 36 hectáreas sembradas. Estas mismas familias aumentan la producción de FRÍJOL en 36 hectáreas, produciendo anualmente 72 toneladas (8 por comunidad) destinadas a su consumo y comercialización.	Introducción del MAÍZ MORADO.- Se sembrarán 36 Ha de maíz morado en 9 comunidades en las que se espera alcanzar rendimientos de 1.50Tm/Ha, y un volumen de producción de 54.00 Tm. Cada familia dispondrá de 0.33 Ha de terreno para el cultivo. Serán beneficiadas 108 familias. Aumento de la producción de FRÍJOL.- La siembra de 36 Ha de frijol en 9 comunidades incrementa el volumen de producción pasando de 0.91 Tm/ha actuales a 2.00Tm/ha. Lográndose así un volumen de producción de 72 Tm. Cada familia dispondrá de 0.33 Ha de terreno para el cultivo. Serán beneficiadas 108 familias. Módulo de capacitación en cultivos ecológicos: MAÍZ MORADO y FRÍJOL.- Se impartirán 2 módulos -de 3 eventos cada uno-. De cada evento se beneficiarán 20 hombres y 20 mujeres -40 por evento, 120 entre los 3 eventos de cada módulo-. La cadencia será de un evento por módulo y a lo que dure el programa.
		CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO.-Mejora de las condiciones de riego de cara a garantizar la producción de cultivos (maíz morado, frijol) propuestos en el proyecto. Está prevista la construcción, de tres canales (el de Umaca-Sarahuarcay con una longitud de 5,000 ml, el de Esmeralda-Soccos con 2,500 ml y el de Piscobamba Baja con 2,040 ml); un total de 9,540 de metros lineales. El riego será por gravedad. CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS nocturnos. Se prevé la construcción de dos reservorios. El agua que estos almacenen se distribuirá a través de pequeños canales secundarios ya existentes.
R2.- MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN AGRARIA	2.2. Mejora de la infraestructura productiva	CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO. Se impartirán 3 módulos -de 3 eventos cada uno-. Cada módulo contará con la asistencia de 120 mujeres y hombres (40 por evento) integrantes de las Juntas de usuarios de riego de las diez comunidades participantes en este programa. a. Módulo en OPERACIÓN-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO. b. Concepto. Módulo en PLANES DE CULTIVO Y RIEGO. c. Concepto. Módulo en operación y mantenimiento de áreas irrigadas.
	2.3. Gestión idónea del proceso productivo agropecuario	FORMACIÓN de PROMOTORES AGROPECUARIOS.- Se formarán durante 10 talleres a los que asistirán 4 representantes elegidos en Asamblea General de cada una de las 10 comunidades (40 en total). Se respetará la cuota de género, la mitad de los promotores formados serán hombres y la otra mitad mujeres. EQUIPAMIENTO de PROMOTORES/as.- Los nuevos promotores serán dotados con 40 chalecos, 40 gorras, 40 mochilas, 40 casacas; a fin de que puedan protegerse de las inclemencias del tiempo, transportar sus materiales de trabajo, y desarrollar las actividades contempladas.

Resultados	Actividades	Concepto
R3.-Mejora MEDIOAMBIENTAL		Construcción e instalación de viveros.-Puesta en marcha de 1 vivero forestal en la comunidad de Ocobamba (de fácil acceso a las zonas a reforestar), con capacidad de 100.000 plantones; 20.000 de especies nativas (Chachacombo, Kiswar), y 80.000 de especies exóticas (ciprés, pino). Para incentivar la producción frutícola de la zona, se instalará 3 viveros frutícolas –de paltos, limones y naranjos- en las comunidades de Carhuayaco bajo, Sarahuarcay y Ocobamba, (lugares con vocación frutícola) con capacidad de 10.000 plantones cada uno, 30.000 en total. Reforestación.- Para la recuperación de las áreas depredadas y la conservación sus suelos, serán reforestadas un total de 100 Has Construcción de 30 hectáreas de zanjas de infiltración.- La Instalación de zanjas de infiltración es una práctica de conservación de suelos, complementaria a la reforestación con especies forestales. Infiltrando las aguas de escorrentía, en época de lluvias, se facilita el desarrollo de los pastos naturales y el prendimiento de las plantas reforestadas. De esta forma se evita la erosión de los suelos depredados y se favorece su conservación.
	3.1. Aumento de la superficie arbolada	
	3.2. Protección de fuentes de agua .-	Instalación de cercos con alambres de púa. La actividad consiste en proteger las áreas circundantes de 10 manantes de agua mediante la instalación de cercos con alambres de púa (ya que los animales domésticos principalmente los porcinos y ganado vacuno malogran y contaminan con sus excrementos los manantes de agua potable). Modulo de capacitación en impacto medioambiental El plan formativo será impartido con una cadencia de un evento por cada uno de los años que dure el programa -3 en total-. El módulo contará con la asistencia total de 120 mujeres y hombres (40 por evento) integrantes de las juntas de usuarios de riego, miembros de las JASS y directivos comunales de las diez comunidades participantes en este programa.
	3.3.- Programa de capacitación en medio ambiente, y gestión de viveros frutícolas y forestales.-	Modulo de capacitación en viveros frutícolas y forestales. El plan formativo será impartido con una cadencia de un evento por cada uno de los años que dure el programa -3 en total-. El módulo contará con la asistencia total de 120 mujeres y hombres (40 por evento) integrantes de las juntas de usuarios de riego, miembros de las JASS y directivos comunales de las diez comunidades participantes en este programa.

Resultados	Actividades	Concepto
R4. POBLACIÓN ORGANIZADA participa de los procesos de desarrollo y conoce sus derechos.	4.1. Formación para la participación civil en procesos de desarrollo	Campaña de sensibilización en aspectos de desarrollo comunal y planificación participativa. Esta actividad irá precedida de un trabajo de coordinación entre: los "promotores" formados con el proyecto, las "juntas directivas comunales", organizaciones civiles y centros educativos. Posteriormente las 10 comunidades serán convocadas para ejecutar eventos de sensibilización. Más información en Pregunta VI. Viabilidad y Sostenibilidad. Punto 3. Viabilidad Técnica. CURSO de formación en liderazgo.- Se formarán 40 nuevos líderes (20 varones y 20 mujeres) de las 10 comunidades beneficiarias del proyecto. El objetivo es que puedan llegar a asumir un rol representativo y de planificación en sus comunidades. La formación adquirida les permitirá incorporarse a las directivas comunales o representar a las distintas organizaciones sociales de base comunales. Los eventos a desarrollar con tal motivo son: Evento 1: Desarrollo de la identidad del/la Líder Comunitario/a. Evento 2: Mecanismos para el Manejo de Conflictos. Evento 3: Planificación y Gestión de Iniciativas del Desarrollo Comunitario Capacitación en técnicas de organización y desarrollo local. El objetivo es que los asistentes (60 varones y 60 mujeres de las directivas comunales de las 10 comunidades de la microcuencua) -120 en total-, acaben disponiendo de un conocimiento profundo en temas de organización y desarrollo local. Serán capacitados en el transcurso de los 3 eventos previstos a lo largo de los 3 años de ejecución del programa –uno por año-. Formulación de Planes de Desarrollo Comunal (instrumento y medio impulsor del desarrollo y de la gestión de proyectos comunales) de cada una de las diez comunidades participantes en el programa. Más información en Pregunta VI. Viabilidad y Sostenibilidad. Punto 3. Viabilidad Técnica. Estos planes serán entregados posteriormente a la Municipalidad Distrital de Ocobamba, para enriquecer el diseño del plan del distrito y que este sea más real. Participación en el proceso de planeamiento y presupuesto distrital.- Las organizaciones promovidas con este programa: "Defensores de los Derechos Humanos", "Asociación de Productores Agropecuarios"; y las que ya existen pero han sido fortalecidas fundamentalmente las directivas comunales; podrán ser registradas en los registros públicos y así tener representatividad jurídica ante el Estado Peruano. Posteriormente se inscribirán en el Consejo de Coordinación Local (CCL) El objetivo es que estas organizaciones puedan participar en la elaboración del "Plan de Desarrollo Concertado" y del "Presupuesto Participativo" del Distrito de Ocobamba. Posterior a la formulación y validación de ambos planes, se hará un seguimiento para implementar, al menos, tres proyectos que obedezcan a las demandas y prioridades establecidas por las 10 comunidades consideradas en el proyecto. Promoción de un Centro de "Formación Continuada" Dotar con equipamiento un centro vehiculador del desarrollo personal, y de fondos para su inscripción en registros públicos. Formación de "Promotores/as de Derechos Humanos". Para que el Centro de Formación Continuada pueda funcionar necesita voluntarios formados para desempeñar su tarea adecuadamente. Cada una de las 10 comunidades seleccionará a una persona -10 en total- para ser acreditada como promotor o promotora durante la celebración de este curso. EQUIPAMIENTO de PROMOTORES/as en derechos humanos.- Se dotará a los promotores/as con 10 chalecos, 10 gorras, 10 mochilas, 10 casacas para que puedan protegerse de las inclemencias del tiempo, transportar sus materiales de trabajo, y desarrollar las actividades contempladas. Estudio de la problemática social, cultural, económica y política de la mujer campesina. Elaboración participativa (intervendrán las 10 comunidades participantes en el programa) de un documento que sea retrato claro, integral y actualizado de la situación social, cultural, económica y política, de la mujer campesina. Formulación del Plan de Acción de lucha contra la violencia familiar y el alcoholismo. Se trata de elaborar un documento que permita establecer objetivos y acciones que disminuyan la incidencia social de estas lacras. Se contará con la participación de instituciones concededoras de la situación (Municipalidad Distrital de Ocobamba, Centros educativos de nivel primario y secundario, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Centros y puestos de salud) y de la población en general de las 10 comunidades presentes en el programa. El nuevo documento servirá de instrumento interinstitucional de lucha contra la violencia familiar y el alcoholismo. Más información en Pregunta VI. Viabilidad y Sostenibilidad. Punto 3. Viabilidad Técnica.
	4.2.- Capacitación en materia de lucha contra el maltrato familiar y alcoholismo.	Modulo de capacitación de Funcionarios/as del Estado en Relaciones de Género y cultura de paz Se organizarán 3 eventos de capacitación, uno cada año, dirigidos a funcionarios/as del estado peruano, pertenecientes a la Policía Nacional, Ministerio Público, Jueces, Funcionarios/as Municipales, etc. Se ha previsto la capacitación de 40 funcionarios (20 mujeres y 20 hombres) por evento y año -120 en total-. Modulo de capacitación en "Relaciones de Género" y "Cultura de la Paz" a colectivos de riesgo. Este modulo irá destinado a colectivos víctimas de maltrato familiar, alcoholismo, y con baja autoestima; con el objetivo de mejorar las relaciones de género. Se impartirán 3 eventos de capacitación a lo largo de los 3 años de ejecución del programa –uno por año- con una cadencia de 40 personas por evento -120 en total-. Modulo de capacitación en "Valores y Autoestima" a colectivos de riesgo. A través de los "promotores de los derechos humanos" del Centro de Formación Continuada, se capacitarán a 120 personas (60 hombres y 60 mujeres en situación de maltrato familiar, alcoholismo, con baja autoestima), durante 3 eventos -con una asistencia de 40 personas por evento-, a lo largo de los 3 años de ejecución del programa –uno por año-. Modulo de capacitación en "lucha contra violencia familiar y alcoholismo" a colectivos de riesgo. Con los mismos colectivos anteriormente definidos, y a fin de reducir la violencia familiar y alcoholismo; se celebrarán 3 eventos durante los 3 años de ejecución del programa –uno por año- con una cadencia de 40 personas por evento -120 en total-.

Resultados	Actividades	Concepto
R5. Gestión del proyecto	5.1 Identificación del Programa	Durante seis meses 2 ingenieros proyectistas se han encargado de diseñar las actividades del programa (especificidades técnicas, planos, presupuestos), y han consolidado la información para la formulación del proyecto.
		Durante seis meses 1 educadora ha recopilado información de base respecto a los derechos humanos y capacidad organizacional de la Sociedad Civil, y ha diseñado el programa de capacitación en los temas de su competencia.
	5.2.- Gastos de Ejecución.-	Durante seis meses 1 enfermera ha recabado la información referente al estado del saneamiento básico y ha contribuido a diseñar el programa de capacitación en los temas de su competencia.
		Durante seis meses 2 técnicos de campo han procedido al levantamiento topográfico de campo previo al diseño de las obras civiles del programa. También han realizado encuestas para determinar la población meta del proyecto.
		Equipos para la formación: Un proyector multimedia para las dinámicas de capacitación y empoderamiento de la población. Una cámara digital. Para el envío de información gráfica durante el proceso de justificación de las actividades del programa. Una banderola multiusos.
		Desplazamiento. Para el desplazamiento del personal técnico del proyecto en sus actividades de campo, monitoreo y supervisión. Adquisición de 02 motos. Camioneta doble cabina 4x4. Combustible.
		Mantenimiento de la camioneta y las dos motos. Una camioneta y dos motos: mantenimiento trimestral (sistema motor, suspensión, frenos). Maquinaria usada en la construcción de obras civiles: mezcladora, vibrador, compactador, motosierra; mantenimiento trimestral (revisión del sistema motor y el sistema mecánico de los equipos).
		Personal: Coordinador del proyecto, Ingeniero civil, Técnico en construcción civil, Ingeniero agrónomo, Agente capacitador, Conductor, Contadora, Secretaria. Funciones definidas en el punto V Recursos Humanos. 2 Personal Local
		Gestión Administrativa. Dedicación concretada en el punto V Recursos Humanos. 2 Personal en Sede



ANEXO 02



EVALUACION FINAL DEL PROYECTO:
Mejora de la calidad de vida de la Microcuenca de Ocobamba Baja.
FORMULARIO DE ENCUESTA

ENCUESTA N°

Nombre de encuestado:.....

Nombre del encuestador:.....

Fecha:

Comunidad:

Sector:

Anexo:

Aspectos sociales:

Nombre y Apellido de los miembros de la familia	Parentesco	sexo	Edad	Estado civil	Ocupación		Nivel de instrucción
					Principal	Secundaria	

1. Jefe de familia.
2. Espos@
3. Hijo
4. Suegro
5. Yerno/nuera
6. Nieto.
7. Otro (especifique)

1. Varón
2. Mujer

1. Casado
2. Conviviente
3. Viudo
4. Separado
5. Divorciado
6. Soltero

1. Ganadero
2. Agricultor
3. Comerciante
4. Empleado
5. Estudiante
6. Venta de mano de obra
7. Kamayoc, Yachachiq o Promotor
8. Artesanos
9. Curanderos
10. Otro (especifique)

1. Analfabeto
2. Primaria
3. Secundaria
4. Técnica
5. Universitaria
6. Otro (especifique)

RESULTADO 1

Actividad 1.1 Implemento de las instalaciones sanitarias

Instalación de 332 LETRINAS unifamiliares

1.- ¿Cuenta con una letrina en su vivienda? SI () NO ()

¿Quién la instalo?

Actividad 1.2 Programa de capacitación en educación sanitaria y fortalecimiento de las juntas de administración de los servicios de saneamiento

2.- ¿Has participado en las capacitaciones organizadas por caritas? SI () NO ()

TEMA	Te ayudaron		Pones en práctica	
	SI	NO	SI	NO
Educación Sanitaria:				
Introducción e días básicas				
Participación de la mujer en el servicio de saneamiento básico				
"Porque se enferman nuestros hijos"				
Sistemas de abastecimiento de agua potable				
Agua para consumo humano				
Ventajas y como se usa el agua potable				
Fortalecimiento de las juntas de administración de servicios de saneamiento				
La junta administradora del servicio de saneamiento				
El consejo directivo y funciones de los miembros				
Constitución de los JASS.				

3.- ¿Con el proyecto, cuanto ha mejorado tus hábitos sanitarios?

Mucho ()

Regular ()

Poco ()

Nada ()

¿Por qué?

RESULTADO 2

Actividad: 2.1 Mejora de la producción agrícola

Introducción del MAÍZ MORADO

4. - ¿Mejoraste tus cultivos por intervención de CARITAS?

Maíz morado si () no ()

Frijol si () no ()

Aumento de la producción de FRIJOL

5. - ¿Cuál es la extensión del cultivo?

Nº	Especie	Extensión antes del proyecto(Ha)	m ²	Extensión después del proyecto(Ha)	m ²	Rdoantes del proyecto (Kg)	carga	Rdo. después del proyecto (Kg)	Carga
1	Maíz morado								
2	Frijol								

Capacitación en cultivos ecológicos

6. - ¿Has participado en capacitaciones organizadas por CARITAS? SI () NO ()

TEMA	Te ayudaron		Pones en práctica	
	SI	NO	SI	NO
Cultivo de Maíz morado				
Botánica, fisiología y variedades				
La semilla				
Abonamiento y fertilización				
Mantenimiento del cultivo				
Cosecha y comercialización				
Cultivo de frijol Panamito				
Botánica, fisiología y variedades				
La semilla				
Abonamiento y fertilización				
Mantenimiento del cultivo				
Cosecha y comercialización				

7. ¿Con el proyecto, han mejorado tus rendimientos? SI () NO ()

Cuanto en Maíz Morado:.....

Cuanto en Frijol:.....

Actividad 2.2 Mejora de la infraestructura productiva.-

Construcción de canales de riego

8. ¿Con la intervención de CARITAS que canales de riego se construyeron?

Nº	Sector	EXTENSION (m l)
1		
2		
3		
4		

Construcción de reservorios nocturnos

9. ¿con la intervención de CARITAS que reservorios de agua para riego se construyeron?

Cuales:

Nº	Sector
1	
2	
3	
4	

10. ¿Has participado en capacitaciones organizadas por CARITAS en operación y mantenimiento de las infraestructuras de riego? SI () NO ()

TEMA	Te ayudaron		Pones en práctica	
	SI	NO	SI	NO
La infraestructura de riego				
Nuestro sistema de riego				
El canal principal y su correcto uso				
Planes de cultivo y riego				
Como organizar nuestra parcela				
Planificación anual de nuestros cultivos				
Operación y mantenimiento de áreas irrigadas				
Mantenimiento y control de sistemas de riego				
Reglamentos del riego parcelario				

11. - ¿Con el proyecto, ha mejorado tus infraestructura de riego?

SI () NO () Cuanto?

RESULTADO 3

Actividad 3.1.- Aumento de la superficie arbolada

Construcción e instalación de viveros

12. ¿Existe un vivero forestal en tu comunidad instalada por CARITAS?

SI () NO ()

Qué capacidad tiene?.....

Existió alguno?

13. -Cuenta con especies:

Especies	Si	no
Nativas		
Kiswar		
Chachacomo		
Otros		
Exóticas		
Ciprés		
Pino		
Otros		

14. - ¿Existe un vivero frutícola en tu comunidad instalada por CARITAS?

SI () NO ()

¿Qué capacidad tiene?

¿Existió alguno?

15. -Cuenta con especies:

Especies	Si	No
Paltos		
Naranjos		
Limonos		
Otros		

Reforestación

16. -Áreas reforestadas

Especies	Sí	No	¿Qué extensión? Metros ²	Número de plantones Nro.	¿En qué sectores tiene?
Nativas					
Q'olle					
Chachacomo					
K'euña					
Molle					
Otras:					
Exóticas					
Eucalipto					
Ciprés					
Pino					
Retamilla					
Otras:					

Construcción de 30 Ha de zanjas de infiltración

17. ¿Realiza actividades de conservación de suelos?

Conservación de suelos	Tiene	¿Qué extensión?	¿En qué sectores realiza?	¿Por qué no tiene?
Zanjas de infiltración				
Construcción de terrazas o patapatas				
Rehabilitación de terrazas o patapatas				

Actividad 3.2.- Protección de fuentes de agua.-

Instalación de cercos con alambre de puas

18. ¿Tu comunidad protege sus fuentes de agua? SI () NO ()

¿Como?.....

Actividad 3.3.- Programa de capacitación en medio ambiente y gestión de viveros frutícolas y forestales.-

Capacitación e impacto ambiental

19. .- Has participado en capacitaciones de impacto ambiental organizado por Caritas?
SI () NO ()

TEMA	Te ayudaron		Pones en práctica	
	SI	NO	SI	NO
Impacto Ambiental				
Evaluación de impacto ambiental				
Indicadores ambientales que describen el medio afectado				

Capacitación en viveros frutícolas y viveros forestales

20. .- Has participado en capacitaciones en viveros frutícolas y viveros forestales organizado por CARITAS? SI () NO ()

TEMA	Te ayudaron		Pones en práctica	
	SI	NO	SI	NO
Viveros				
• El Vivero forestal				
• El vivero frutícola				

21. .- Con el proyecto, ¿han mejorado tus viveros frutícolas y viveros forestales?

SI () NO () Cuanto.....

RESULTADO 4

Actividad 4.1. Formación para la participación civil en procesos de desarrollo

Campaña de sensibilización en aspectos de desarrollo comunal y planificación participativa

22. ¿Los promotores trabajan en coordinación con:

Entidad	SI	NO
Junta Directiva Comunal		
Organizaciones Civiles		
Centros Educativos		
Otro		

Curso de formación en Liderazgo

23. ¿Has participado en capacitaciones de formación de líderes organizado por

TEMA	Te ayudaron		Pones en práctica	
	SI	NO	SI	NO
Formación de nuevos líderes				
Como ser un buen líder				
Mecanismos para el manejo de conflictos				
Planificación y gestión				
Fortalecimiento organizacional				
Organización y gestión comunal a directivos comunales y líderes/as				
Desarrollo comunal				

CARITAS? SI () NO ()

Capacitación en técnicas de organización y desarrollo local

24. ¿Existe un plan de desarrollo en tu comunidad? SI () NO ()

25. ¿Has participado en capacitaciones de desarrollo local organizado por CARITAS?

TEMA	Te ayudaron		Pones en práctica	
	SI	NO	SI	NO
Técnicas de organización y Desarrollo Local				

Formulación de Planes de Desarrollo Comunal

26. ¿Tu comunidad cuenta con un plan de desarrollo comunal? SI () NO ()

27. El plan de desarrollo local:

ACCIONES	SI	NO	N/S
Cumple sus objetivos			
Se cumplen las actividades			
Se cumplen los resultados esperados			
Fueron entregados a la municipalidad Distrital			

Participación en el proceso de planeamiento y presupuesto distrital

TEMA	Participa		Está inscrita en Registros Públicos		Está inscrita en Consejo de Coordinación Local	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Defensores de los Derechos Humanos						
Asociación de Productores Agropecuarios						
Otro						

Promoción de un Centro de "Formación Continuada"

28. ¿Tu comunidad cuenta con un centro de formación continuada? SI () NO ()

¿Está debidamente equipada? SI () NO ()

¿Está Inscrita en registros públicos? SI () NO ()

Formación de "Promotores/as de Derechos Humanos

29. ¿Tu comunidad cuenta con un promotor en derechos humanos? SI () NO ()

Equipamiento de promotores/as en derechos humanos

30. ¿Este promotor está debidamente equipado?

Equipamiento	SI	NO
Chaleco		
Gorras		
Mochila		
Casaca		

Actividad 4.2.- Capacitación en materia de lucha contra el maltrato familiar y alcoholismo.

Formulación del Plan de Acción de lucha contra la violencia familiar y el alcoholismo

31. .- ¿Existe un plan de acción de lucha contra la violencia familiar y el alcoholismo en tu comunidad? SI () NO ()

¿Lo practicas? SI () NO ()

¿Porque?.....

32. .-¿Has participado en capacitaciones en materia de lucha contra el maltrato familiar y alcoholismo? SI () NO ()

TEMA	Te ayudaron		Pones en práctica	
	SI	NO	SI	NO
Relaciones de género y cultura de paz				
Relaciones de genero				
Diferencias entre sexo y genero				
La equidad imprescindible para la paz y el desarrollo				
Valores y autoestima				
Identidad autoestima y valores				
Mejorando las relaciones familiares				
Crecimiento y desarrollo de los hijos				
Violencia familiar y alcoholismo				
Prejuicios frente a la violencia familiar				
Tipos de familia				
El alcoholismo				

33. .- Como te parecieron las capacitaciones:

Muy buenos () Malos ()

Buenos () Muy malos ()

Regulares ()

¿Por qué?

34. .- Pones en práctica lo que has aprendido en las capacitaciones en materia de lucha contra el maltrato familiar y alcoholismo? SI () NO ()

¿Cómo?:

OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR

.....

.....

.....

SUGERENCIAS DEL ENCUESTADO

.....

.....

.....



FIRMA DEL ENCUESTADO.....

DNI DEL ENCUESTADO.....

ANEXO 3
INFORME DE AUDITORIA CARITAS ABANCAY FINAL.

Nro.	Detalle	Notas	Período de liquidación		Período de liquidación		Período de liquidación	
			oct-08	Set 2009	oct-09	Set 2010	Oct. 2010	Set 2011
			€	S/	€	S/.	€	S/.
I.	Ingresos							
1.1	Saldo Inicial				274.72	1,166.97	-20,807.99	-74,406.00
	Gobierno de Navarra	1	214,392.05	910,691.54	214,871.33	768,345.07	208,961.70	699,752.31
	Socio Local: Cáritas Abancay	2	25,261.16	107,304.00	0	0	0	0
	Otros: Comunidades beneficiarias	3	149,692.10	635,860.00	77,989.16	278,876.60	64,397.92	215,650.00
	Ingresos totales		389,345.31	1,653,855.54	293,135.21	1,048,388.64	252,551.63	840,996.31
IV.	Egresos							
	A. Costes Directos							
	A.II. Construcciones		209,126.83	888,326.01	196,582.03	702,945.50	213,868.85	716,184.94
	A.III. Equipos, materiales y suministros		63,967.43	271,719.95	37,713.77	134,858.33	12,977.53	43,458.00
	A.III.I. Equipos		208.69	886.46	575.53			
	A.III.II. Materiales y suministros		63,758.74	270,833.48	37,138.24	132,800.33	12,977.53	43,458.00
	A.IV. Personal		66,971.83	284,482.00	62,506.19	223,512.00	66,745.69	223,512.02
	A.IV.I. Personal Local		66,971.83	284,482.00	62,506.19	223,512.01	66,745.69	223,512.02
	A.VIII. Funcionamiento		29,535.41	125,460.12	7,991.33	28,575.70	5,930.04	19,857.99
	A.IX.Otros		19,743.80	82,700.45	9,149.89	32,903.13	10,371.04	33,896.66
	A.IX.I. Gastos Bancarios		322.95	1,371.84	96.36	344.57		
	A.IX.II. Gastos Capacitación		19,420.84	82,495.58	8,778.81			
	A.IX.III. Otros. (Aval)				8,875.17			
	Egresos totales		389,345.31	1,652,688.57	313,943.20	1,122,794.64	309,893.15	1,036,909.57
V.	Saldos		274.72	1166.97	-20,807.99	-74,406.00	-57,341.53	-195,913.27
	Conciliación de saldos							
	Caja				313,668.48			
	Banco de Crédito Cta. Ahorros. No							
	Banco de Crédito Cta. Cte. N° 200-1739699-0-17			263,547.54		864.47		832.97
	Mas/Menos:							
	Cheques y efectivo en tránsito			-262,380.57				
	Entregas por rendir							
	Otras cuentas por pagar – prestamos por devolver				-20807.99	-75,270.47	-57,341.53	-196,746.24
			274.72	1,166.97	292,860.49	-74,406.00	-57,341.53	-195,913.27

ANEXO 4 Lista de personas encuestadas

N°	NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	EDAD	OCUPACION PRINCIPAL	NIVEL DE INSTRUCCIÓN	ESTADO CIVIL
1	Delia Gutiérrez Ccancas	Ocobamba	35	Agricultor	Secundaria	Conviviente
2	Dina Espinoza Vilchez	Ocobamba	32	Agricultor	Secundaria	Conviviente
3	Flor Villacrés Oré	Ocobamba	37	Ganadero	Secundaria	Casado
4	Rosario Pérez Barzola	Ocobamba	24	Agricultor	Secundaria	Conviviente
5	Orlinda Coronado Vilchez	Ocobamba	59	Agricultor	Primaria	Casado
6	Maximina Vilchez S	Ocobamba	48	Ganadero	Secundaria	Casado
7	Lorenzo Condor Vasquez	Ocobamba	65	Agricultor	Analfabeto	Casado
8	Zenobia Palomino Capulian	Piscobamba	39	Agricultor	Secundaria	Casado
9	Jacinto Quispe Lasi	Piscobamba	54	Agricultor	Primaria	Casado
10	Edwin Palomino León	Piscobamba	35	Agricultor	Secundaria	Casado
11	Daniel Martínez Palomino	Ocobamba	37	Agricultor	Secundaria	Casado
12	Elena Banda Palomino	Atajara	25	Agricultor	Secundaria	Casado
13	Antenor Mondalgo Cordova	Sarahuarcay	56	Agricultor	Analfabeto	Casado
14	Ermelinda Huamani Cordova	Maucallaqta	34	Agricultor	Primaria	Casado
15	Martin Cordova Costa	Piscobamba	36	Carpintero	Primaria	Casado
16	Juan Pampas Basques	Sarahuarcay	62	Agricultor	Analfabeto	Casado
17	Edwin Palomino Huaman	Piscobamba	32	Carpintero	Secundaria	Casado
18	Cirilo BuitronHuaman	Piscobamba	32	Agricultor	Primaria	Conviviente
19	CleofeCordovaSotel	Ocobamba	52	Su casa	Secundaria	Casado
20	Angelica Medrano Pacheco	Ocobamba	45	Su casa	Primaria	Conviviente
21	Luis Palomino Huayana	Ocobamba	60	Agricultor	Primaria	Casado
22	Alfredo Valdivia Tello	Ocobamba	42	Inseminador	Secundaria	Soltero
23	Prospero Vidal CalderonGutierrez	Ocobamba	71	Docente	Superior	Separado
24	Eulogio Enciso Aldunate	Ocobamba	54	Agricultor	Analfabeto	Casado
25	Erasmina Leyva Huaman	Ocobamba	28	Agricultor	Primaria	Viudo
26	Heidi BillbaoMalpartida	Ocobamba	26	Agricultor	Primaria	Conviviente
27	Victor Altamirano Zeballos	Ocobamba	80	Agricultor	Analfabeto	Casado
28	Wilfredo LeonCondor	Carhuayaco Bajo	53	Agricultor	Analfabeto	Casado
29	Victorino Vilchez Zapata	Carhuayaco Bajo	35	Agricultor	Primaria	Conviviente
30	Rosa Gutierrez	Carhuayaco Bajo	45	Agricultor	Primaria	Casado
31	EupefresCrrascoSot	Carhuayaco Bajo	58	Agricultor	Secundaria	Viudo
32	ElmertPerezLeon	Carhuayaco Bajo	25	Agricultor	Secundaria	Casado
33	Juana Ore Villano	Carhuayaco Bajo	45	Agricultor	Analfabeto	Casado
34	Edmundo Andia Mandilla	Carhuayaco Bajo	40	Agricultor	Primaria	Casado
35	Valentina Orue	Carhuayaco Bajo	46	Agricultor	Primaria	Casado
36	Juana Chunqui Palomino	Piscobamba	65	10 (Casa)	Secundaria	Viudo
37	Aurelia Orosco Palomino	Piscobamba	24	Agricultor	Secundaria	Casado

N°	NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	EDAD	OCUPACION PRINCIPAL	NIVEL DE INSTRUCCIÓN	ESTADO CIVIL
38	Carolina Cáceres	Piscobamba	34	Agricultor	Secundaria	Conviviente
39	Jesusa Capulian Huaman	Piscobamba	36	Agricultor	Primaria	Casado
40	Celedonio Cordoba Quispe	Piscobamba	40	Agricultor	Primaria	Casado
41	Rosmeri Logo Ramos	Piscobamba	34	Agricultor	Secundaria	Casado
42	Isabel Perez	Piscobamba	44	Agricultor	Primaria	Casado
43	Rosario Pariona Ramos	Piscobamba	43	Agricultor	Primaria	Casado
44	Raida Quispe Rodas	Piscobamba	36	Agricultor	Primaria	Casado
45	Constantino Chungui Palomino	Piscobamba	48	Agricultor	Primaria	Casado
46	Eugenio Pariona Lago	Piscobamba	45	Agricultor	Primaria	Casado
47	Eustaquio Jengua Palomino	Piscobamba	65	Agricultor	Analfabeto	Casado
48	AgustinCaceresLadara	Piscobamba	51	Agricultor	Analfabeto	Casado
49	Teodoro Perez	Piscobamba	65	Agricultor	Analfabeto	Casado
50	Alejandro CaceresLandava	Piscobamba	58	Agricultor	Analfabeto	Conviviente
51	Luisa GenaraAlvado Prez	Soccos El Eden	49	Agricultor	Superior	Casado
52	Emilda Ortega Ortiz	Soccos El Eden	44	Agricultor	Primaria	Casado
53	Nicanor Pacheco Villacresis	Soccos El Eden	65	Agricultor	Analfabeto	Casado
54	Teodor Medrano Pacheco	Soccos El Eden	48	Agricultor	Primaria	Casado
55	RosmeriRimaymanta Avellano	Soccos El Eden	35	Agricultor	Primaria	Conviviente
56	Ricardina Jola Ore	Soccos El Eden	46	Agricultor	Primaria	Casado
57	EpifaniNolberto Tello	Ocobamba	58	Agricultor	Secundaria	Viudo
58	Reina Castro Perez	Ocobamba	50	Agricultor	Analfabeto	Conviviente
59	Gracia Indivica Castro	Ocobamba	47	Ganadero	Analfabeto	Conviviente
60	Mario Valenzuela Gomez	Ocobamba	49	Empleado	Secundaria	Conviviente
61	Marcelina Medrano Pacheco	Ocobamba	63	Agricultor	Primaria	Casado
62	Julio Cesar Coronel	Ocobamba	37	Agricultor	Primaria	Casado
63	Teodosia Cayllahua Villena	Ocobamba	40	Agricultor	Secundaria	Casado
64	Pablo Socca Espinoza	Ocobamba	39	Agricultor	Primaria	Casado
65	Yenny Gutiérrez Román	Piscobamba	67	Agricultor	Analfabeto	Casado
66	Julia Gutiérrez	Piscobamba	46	Agricultor	Analfabeto	Casado
67	Cecilia Cáceres Pampas	Piscobamba	48	Agricultor	Analfabeto	Casado
68	Alejandrina Pariona Ramos	Piscobamba	44	Agricultor	Analfabeto	Casado
69	Nilda Pariona Ramos	Piscobamba	62	Agricultor	Analfabeto	Casado
70	Maura Palomino Quispe	Piscobamba	37	Agricultor	Primaria	Casado
71	Olinda Palomino Banda	Piscobamba	28	Agricultor	Secundaria	Conviviente
72	Francisco Quispe Aldonati.	Ocobamba	45	Ganadero	Primaria	Casado
73	Cristina Ccyunchira Dominguez	Ocobamba	41	Ganadero	Primaria	Casado

N°	NOMBRE Y APELLIDO	COMUNIDAD	EDAD	OCUPACION PRINCIPAL	NIVEL DE INSTRUCCIÓN	ESTADO CIVIL
74	Graciela Vilchez Urrutia.	Ocobamba	37	Agricultor	Secundaria	Casado
75	Víctor Córdova Sotelo	Ocobamba	47	Agricultor	Primaria	Casado
76	Gumerindo Roa Seancas	Ocobamba	42	Agricultor	Primaria	Casado
77	Andrea Cerna Joycca	Ocobamba	29	Agricultor	Secundaria	Conviviente
78	Toribio Sandoval Coronado	Ocobamba	47	Agricultor	Primaria	Casado
79	Cirilo Huallai Huaman	Ocobamba	34	Agricultor	Secundaria	Conviviente
80	Lorenza Cameño López	Ocobamba	62	Agricultor	Analfabeto	Casado
81	Eliodora Tello Bulege	Ocobamba	45	Albañil	Secundaria	Casado
82	Carlos Medrano	Ocobamba	48	Agricultor	Primaria	Casado
83	Orlando Ramos Lago	Maucallaqta	38	Agricultor	Primaria	Conviviente
84	Florencio Chungui Pariona	Maucallaqta	40	Agricultor	Analfabeto	Casado
85	Jacinto Lucy Pariona	Piscobamba	44	Agricultor	Secundaria	Casado
86	Fortunata Pozo de Cali	Maucallaqta	60	Agricultor	Analfabeto	Casado
87	William Acosta Pariona	Maucallaqta	43	Agricultor	Primaria	Casado
88	Yuri Palomino	Maucallaqta	30	Agricultor	Secundaria	Conviviente
89	Julia Ramos Quencua	Piscobamba	40	Agricultor	Primaria	Casado
90	Ronald Ruben Cárdenas Ramírez	Esmeralda	31	Ganadero	Secundaria	Conviviente
91	Antonia Ramírez	Carhuayaco Bajo	32	Ganadero	Analfabeto	Conviviente
92	Alfredo Cáceres Ramírez	Carhuayaco Bajo	23	Agricultor	Secundaria	Casado
93	Margarita León Cáceres	Ocobamba	57	Su casa	Primaria	Viudo
94	Dalmiro León Ramírez	Huancallo Bajo	36	Ganadero	Secundaria	Casado
95	Paulino Prado Pallca	Huancallo Bajo	39	Ganadero	Primaria	Casado
96	Vicente Urrutia Medrano	Esmeralda	36	Ganadero	Primaria	Casado
97	Ramón Rojas Socca	Sarahuaracay	46	Agricultor	Primaria	Casado
98	Filomeno Ricra Galvez	Ocobamba	48	Ganadero	Secundaria	Soltero
99	Juan Salazar Leiva	Mitobamba	41	Agricultor	Primaria	Casado
100	Juan Pérez Condor	Carhuayaco Bajo	41	Agricultor	Secundaria	Casado
101	Cesar Rivera Palomino	Piscobamba	44	Agricultor	Primaria	Conviviente
102	Edgar Huaman Palomino	Piscobamba	32	Agricultor	Secundaria	Casado
